



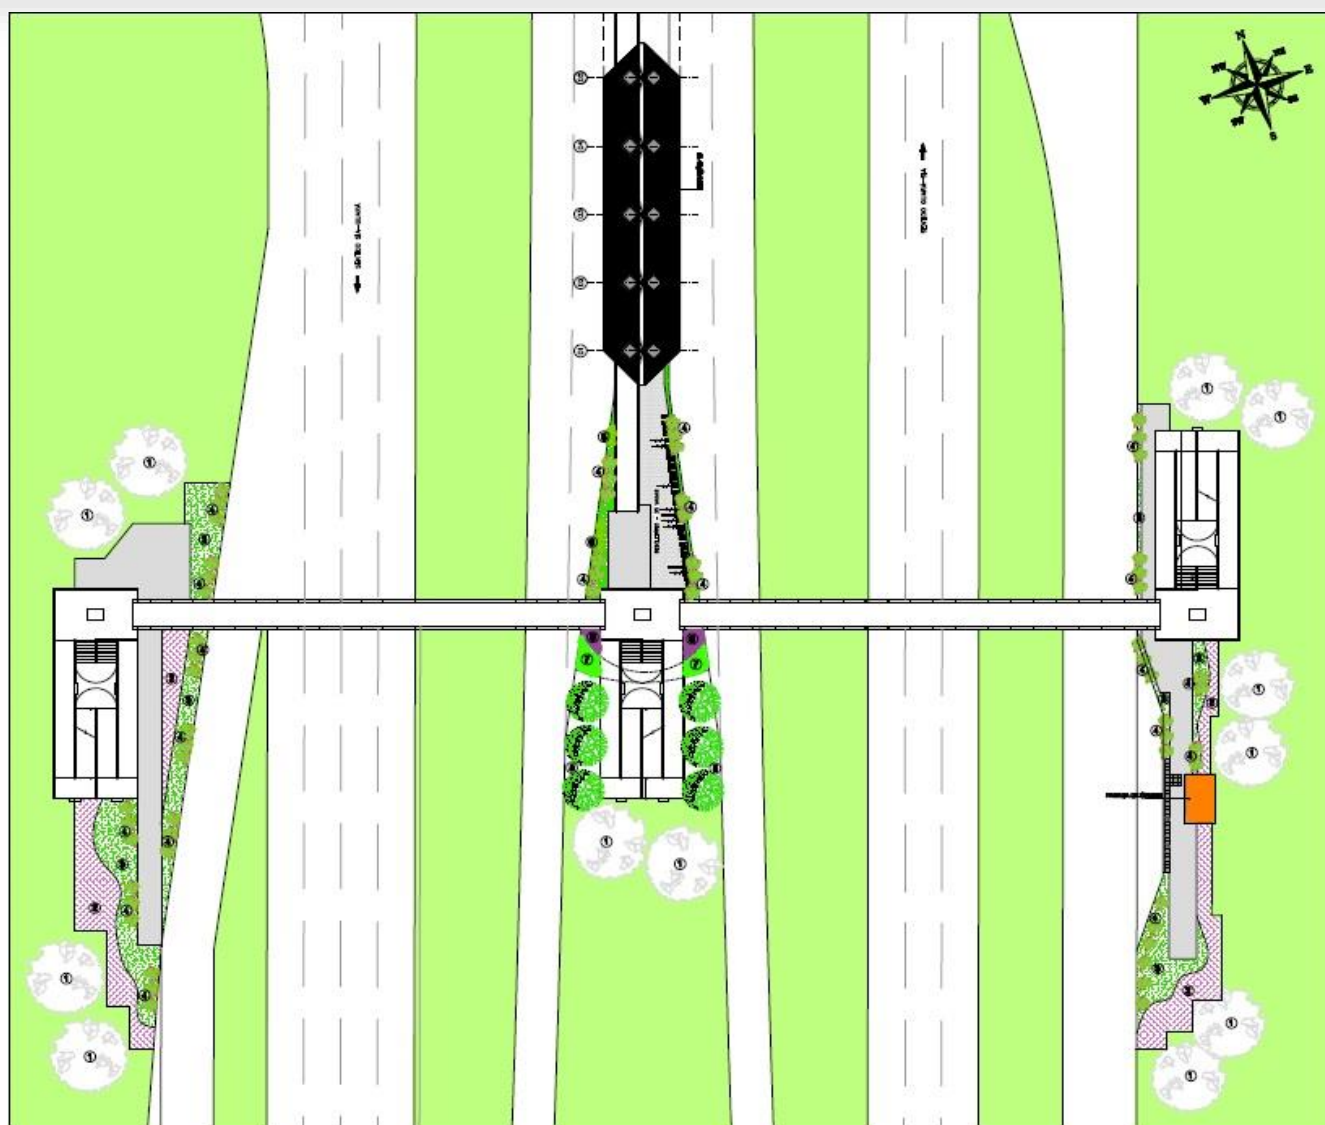

RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL— 1º Bimestre/2013

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.3711.6162(2012)
 RA 99 – TODO O DF
 Nº DO PROCESSO: 113.005.428/2006
 Nº DO CONTRATO: 002/2010
 FIRMA: GEO-LÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL
 INÍCIO DOS SERVIÇOS: 19/02/2010
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/09/2013 (QUINTO ADITIVO)
 VALOR: R\$ 1.303.632,37
 RECURSOS: FONTE 237
 EXECUTOR: ENGº PAULO ROBERTO DA SILVA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central (DF e Goiás).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:
 Acumulado 50% dos serviços. Produto quatro aprovado pelo Instituto Chico Mendes e produto cinco em elaboração. Executado 10% do serviço no bimestre.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:
 Executado 0% do serviço no bimestre – Atrasado. Permanece o mesmo patamar de 60% dos serviços já realizados até o 6º bimestre de 2012.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

60%	%	%	%	%	%
-----	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída


COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- Os serviços estão divididos em 07 fases de trabalho, correspondendo a elaboração de 07 produtos: Plano de Trabalho; Levantamento das Informações; Oficina de Trabalho; Estudo Plano de Manejo; Plano de Manejo Final ; nova versão Corrigida. Produto 4 pendente aprovação pelo Instituto Chico Mendes .
- Nova versão corrigida do Produto 4 foi apresentada pela empresa e aprovada pela Equipe de Supervisão. (Comentário do 3º e 4º bimestres)
- Produto 5 em elaboração (Comentário 5º bimestre de 2012)

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Aprovar o Produto 5.

SOLUÇÃO INTEGRADA PARA DEPARTAMENTOS DE ESTRADAS DE RODAGEM



PROGRAMAS DE TRABALHO:

26.122.6010.8517.0006(2011) e

26.122.6010.8517.0014 (2012)

RA 99 – TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 113.000.376/2007

Nº DO CONTRATO: 051/2008

EMPRESA: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA

DATA DE INÍCIO: 01/01/2009

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013

VALOR: R\$ 2.727.733,93 + R\$ 80.660,68

(OITAVO ADITIVO) = R\$ 2.808.394,61

RECURSOS: FONTES 100, 237, 300, 220, 420, 437

EXECUTOR: JESSÉ GOUVEIA DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços especializados de engenharia, visando a sistematização de um modelo integrado de gestão, permitindo ao DER-DF alcançar, com base em um banco de dados unificado, melhorias sustentáveis para a gestão de contratos de obras rodoviárias, segurança de trânsito de pessoas e de cargas do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:

Acompanhamento, suporte e consultoria da nova sistematização e manutenção dos aplicativos de apoio. Concluída Etapa 2012.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado


A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- Contrato renovado até 31/12/2012.
- Solução recebida oficialmente em 10/12/2010 e desde então mantida, o que justifica, além da possibilidade legal, a vigência contratual e suas renovações . Valor mensal R\$ 25.771,10.
- Principais atividades: A consultoria contratada deverá disponibilizar equipe técnica em sua sede, para atender ao DER/DF por telefone, faz internet, conexão remota através de modem ou correspondência convencional, prestando serviços para: a) Assistência com análise, diagnóstico e solução de problemas; b) Atendimento às dúvidas sobre as características e utilização das ferramentas e aplicativos de apoio; c) Alterações e implementação de novas funções; consultas e/ou novos relatórios, desde que não caracterize o desenvolvimento de novos módulos ou impliquem em alterações estruturais no funcionamento do aplicativo.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF ANEL VIÁRIO – ESTUDO EVTEA/EIA/RIMA

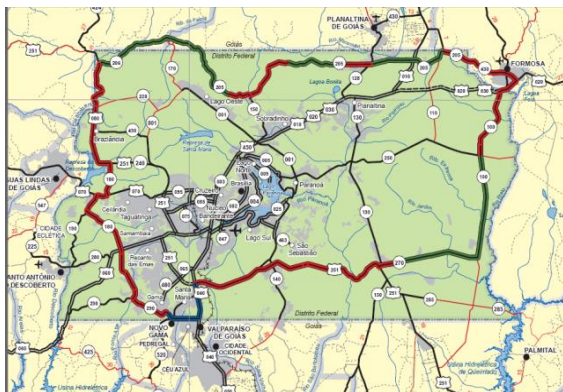


PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.2800.3550.0001 (2011) e
26.782.6216.1968.0013(2012)
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.002.321/2008
Nº DO CONTRATO: 040/2008
EMPRESA: STRATA ENGENHARIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 05/11/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/10/2012
VALOR: R\$ 7.290.752,11
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº JOSÉ RICARDO ALMEIDA
DE BRITO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços de elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Estudos de Impacto Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA e dos Projetos Executivos de Engenharia das Rodovias integrantes do Anel Viário do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:
Acumulado 60%. Obra paralisada.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:
Obra paralisada.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF ANEL VIÁRIO – ESTUDO EVTEA/EIA/RIMA

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤Comentário do 2º bimestre de 2012:

➤Os serviços objeto do Contrato 040/2008 estão paralisados pelo fato dos recursos orçamentários previstos na Lei Orçamentária Anual de 2012 contempla, na rubrica Estudos e Projetos , o valor de R\$3.000.000,00, para custear todos os serviços de estudos e projetos do Departamento, valor insuficiente para concluir sequer os trabalhos do Contrato 040/2008. Por isso foi elaborado o Memorando 027/2012 – 3º DR, de 16/01/2012, solicitando definição da Direção sobre os recursos a serem alocados no Contrato .A Direção esta viabilizando junto aos Órgãos competentes a suplementação orçamentária para fazer face às despesas com o referido contrato.

➤Comentário 4º bimestre: Foi solicitado no final de agosto a suspensão do contrato 040/2008, haja vista que não houve suplementação orçamentária até o momento. O contrato continua paralisado.

➤Comentário 5º bimestre: Contrato Suspenso: Décimo Termo Aditivo, publicado no DODF nº 186 de 15/09/2012, página 55 – suspende o prazo do contrato por 90 dias a partir de 24/08/2012.

PLANO DE AÇÃO PARA 6º BIMESTRE DE 2012:

Contrato continua suspenso.

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



PROGRAMAS DE TRABALHO:
 26.782.2800.2904.0001(2011) e
 26.782.6215.2904.0001
 RA 99 – TODO DF
 Nº DO PROCESSO: 113.005.681/2010
 Nº DO CONTRATO: 011/2011
 EMPRESA: HOT COZINHA INDUSTRIAL
 DATA DE INÍCIO: MARÇO/ 2011
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:
 MARÇO/2012
 VALOR: R\$ 282.528,00
 RECURSOS: FONTE 237
 EXECUTORA: ELIANE CAVALCANTE SANTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Lanche para as crianças das Escolas Públicas, que são levadas nos períodos matutino e vespertino, no Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o Trânsito, para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:

De janeiro a dezembro de 2012 foram atendidas 48.363 crianças pela Escola Vivencial de Trânsito do DER/DF- Transitolândia e fornecidos 21.448 lanches. Concluída Etapa 2012.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

Aulas não iniciadas.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO



PROGRAMAS DE TRABALHO:
 26.782.2800.2541.0004 (2011) e
 26.782.6215.2541.0004(2012)
 RA 99 - TODO O DF
 Nº DO PROCESSO: 113.0006376/2008;
 113.007.804/2011
 Nº DO CONVÊNIO: 002/2008
 EMPRESA: BPRv (BATALHÃO DE POLÍCIA
 RODOVIÁRIA) e DER/DF
 DATA DE INÍCIO: 19/12/2008
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 18/12/2013
 VALOR: SEM VALOR
 RECURSOS: FONTES 237, 417, 437
 EXECUTOR: ENGº MURILO DE MELO SANTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Delegação de competência para fiscalização de trânsito nas rodovias distritais do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, e mediante delegação de competência, nas rodovias federais, nos limites do distrito federal, propiciando a todos o direito a um trânsito em condições seguras, adotando-se todas as medidas destinadas à fluidez, conforto, defesa ambiental e à educação para o trânsito e em tudo fiscalizando o fiel cumprimento das disposições do código de trânsito brasileiro e seus regulamentos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:

Policiamento e fiscalização de trânsito sendo que atualmente os produtos, materiais necessários estão sendo adquiridos pela própria PMDF poupando o Der/DF desta atividade. Concluída Etapa de 2012.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- Em 2012 constata-se uma redução do número de acidentes fatais e número de mortes (redução de 20%).
- Concluído em 10/05/2012 (3º Bimestre).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.4195.0001

RA 99 – TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 113.000.727/2012

Nº DO CONTRATO: 023/2012

EMPRESA: G. B. DA SILVA EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO- EPP

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/07/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2013

VALOR: R\$ 222.949,00

RECURSOS: FONTE 100

EXECUTOR: ENGº LUIZ GERALDO RANGEL VILELA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de Asfalto diluído CM-30

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:

Fornecimento de asfalto diluído CM-30 = 68 %. Concluída a etapa de 2012.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

Fornecimento de asfalto diluído CM-30 = 68%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0 %					

Avanço Físico Bimestral

68%					
-----	--	--	--	--	--

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Obs: encerrado contrato 03, 04/2011 e 007/2009 respectivamente em 15/03/2012;23/03/2012 e 23/03/2012.

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.4195.0001

RA 99 – TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 113.000.727/2012

Nº DO CONTRATO: 025/2012

EMPRESA: DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/07/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2013

VALOR: R\$ 192.000,00

RECURSOS: FONTE 100

EXECUTOR: ENGº LUIZ GERALDO RANGEL VILELA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:

Fornecimento de asfalto diluído RM- 1C – 20 %. Acumulado 42,8%. Concluída a etapa de 2012.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

Fornecimento de asfalto diluído RM-1C = 52%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
52%						

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
94,8%						

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Obs: encerrado contrato 03, 04/2011 e 007/2009 respectivamente em 15/03/2012;23/03/2012 e 23/03/2012.

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.4195.0001

RA 99 – TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 113.000.727/2012

Nº DO CONTRATO: 024/2012

EMPRESA: CENTRO OESTE ASFALTO LTDA

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/07/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2013

VALOR: R\$ 77.899,80

RECURSOS: FONTE 100

EXECUTOR: ENGº LUIZ GERALDO RANGEL VILELA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:

Fornecimento de asfalto diluído RR- 2C – 18%. Acumulado 41%. Concluída a etapa de 2012.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

Fornecimento de asfalto diluído RR- 2C = 27%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
27%						

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
68%						

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Obs: encerrado contrato 03, 04/2011 e 007/2009 respectivamente em 15/03/2012;23/03/2012 e 23/03/2012.

LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO TIPO TALÃO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.2800.2541.0001

RA 99 – TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 113.006353/2010

Nº DO CONTRATO: 031/2010

EMPRESA: ENGEBRÁS S/A INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 07/12/2010

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 25/01/2013

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 642.951,60

VALOR EMPENHADO (até ao final do contrato): R\$
53.579,30 (ano 2010) + R\$ 600.088,16 (ano 2011)

RECURSOS: FONTE 237

EXECUTORA: ENG^a GISANDRA FARIA DE PAULA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Locação de 50 (cinquenta) equipamentos eletrônicos do tipo Talão para captura e registro eletrônico de infrações de trânsito.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:

➤ O presente processo foi reaberto em 03/10/12, quando o DETRAN/DF disponibilizou a base de dados necessária para o funcionamento pleno dos talonários eletrônicos.

➤ Até hoje, já foi pago R\$ 134.857,77 (dez/10, jan/11 e fev/11 + R\$ 48.221,46 (out/12) + R\$ 53.579,30 (nov/12) + R\$ 53.579,30 (dez/12). Concluída a etapa de 2012.

➤ AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%					

Avanço Físico Bimestral

%					
---	--	--	--	--	--

% Acumulativo Executado dos Serviços

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤A paralisação do presente contrato deve-se à necessidade de obtenção de dados on-line que alimentarão a base de consulta para o registro eletrônico de infrações de Trânsito. Estes dados são obtidos junto ao DETRAN/DF, órgão detentor dos registros relacionados aos veículos e condutores, no âmbito do DF.

➤Até o momento, estes dados ainda não foram repassados pelo DETRAN/DF. O DER/DF tem realizado consultas sistemáticas junto ao DETRAN/DF para a obtenção desses dados (ofícios, e-mails, telefonemas, reuniões).

Comentário 4º bimestre:

Fica reativado o contrato a partir de 03 de outubro de 2012, ficando inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato 31/2012.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Obtenção contínua da base de dados necessárias junto ao DETRAN/DF para que os talonários comecem a ser utilizados.

**CONSTRUÇÃO DE ACESSO (AGULHA) à DF-003 (EPIA), TRECHO DF-095/DF-010,
COM IMPLANTAÇÃO DE BAIA DE PARADA DE ÔNIBUS E REMANEJAMENTO DO
ABRIGO EXISTENTE.**



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.1199 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.010.786/2010
Nº DO CONTRATO: 028/2012
EMPRESA: CRC – CONSTRUTORA
RODRIGUES CAMPOS LTDA
DATA DE INÍCIO: 09/08/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2013
(TERCEIRO ADITIVO)
VALOR: R\$ 199.873,17
RECURSOS: FONTE 348
EXECUTOR: ENGº SAMUEL DIAS JÚNIOR

DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de acesso (Agulha) à DF-003 (EPIA), trecho DF-095/DF-010, com implantação de baia de parada de ônibus e remanejamento do abrigo existente.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:

Foi realizada 20% de limpeza e terraplanagem.

Obs.: Interferências removidas

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

Acumulado 99%. Contrato em fase de conclusão.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
99%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
99%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

**CONSTRUÇÃO DE ACESSO (AGULHA) à DF-003 (EPIA), TRECHO DF-095/DF-010,
COM IMPLANTAÇÃO DE BAIA DE PARADA DE ONIBUS E REMANEJAMENTO DO
ABRIGO EXISTENTE.**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Removidas as interferências os serviços serão retomados.

➤ 6º BIMESTRE DE 2012:

Obras iniciadas. Terraplanagem sendo prejudicada pelas chuvas.

EIA/ RIMA PARA O TREVO DE TRIAGEM NORTE



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1226.0001 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.005.275/2012
Nº DO CONTRATO: 033/2012
EMPRESA: HIDROLÓGICA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 17/09/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/04/2013 (SEGUNDO ADITIVO)
VALOR: R\$ 143.840,94
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº PAULO ROBERTO DA SILVA

DESCRIÇÃO DA OBRA: EIA/ RIMA para o Trevo de Triagem Norte.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:
 Início dos trabalhos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:
 Executado 0% do serviço.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

50%	%	%	%	%	%
-----	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída


COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- Os serviços estão divididos em 04 produtos: 1. EIA Versão preliminar; 2. EIA Versão Final; 3. RIMA Versão Preliminar e 4. RIMA Versão Final.
- Os Produtos 1 e 3 (Versões Preliminares do EIA e do RIMA) já foram elaborados e encaminhados ao IBRAM. Os produtos 2 e 4 (Versões Finais) serão elaborados após a análise das Versões Preliminares pelo IBRAM.
- Aguardando a manifestação do IBRAM.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Receber a análise do IBRAM para as Versões Preliminares e elaborar as Versões Finais do EIA/RIMA.

PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA DF - 131

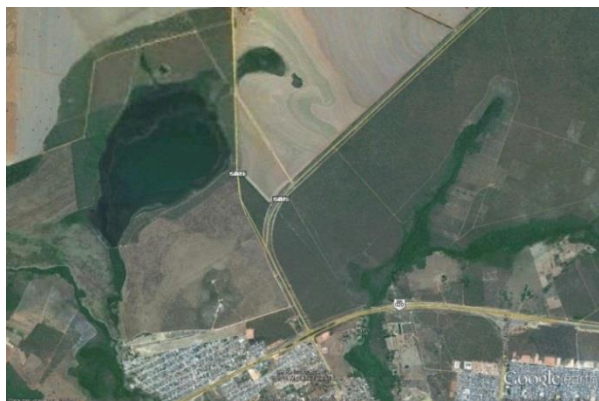

PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1968.0013 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.011.685/2011
Nº DO CONTRATO: 034/2012
EMPRESA: EXTREMA CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 25/09/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2013
(SEGUNDO ADITIVO)
VALOR: R\$ 489.159,33
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTORA: ENG^a ERY DO NASCIMENTO
 BRANDI DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Projeto de Engenharia para Pavimentação da DF- 131.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:

Acumulado 25%

- 1) Entrega do relatório de andamento 01 (10%)
 - Tipografia
 - Estudo de traçado
- 2) Entrega do relatório de andamento 02 (10%)
 - Geometria
 - Pavimentação
 - OAE
 - Componente Ambiental.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

Total Acumulado 70%.

➤ Entrega da Minuta do Projeto Básico (45%).

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
45 %						

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
70 %						

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída


COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

Foi solicitado um aditivo de prazo de 30 dias para a correta finalização e aprovação do Componente Ambiental.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Encerramento do contrato para o dia 23/03/2013.

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 1

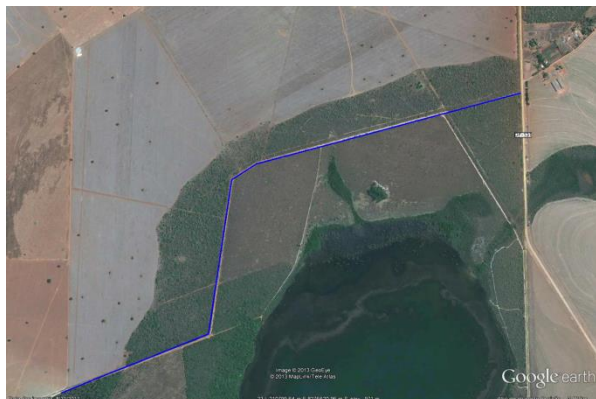

PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.005.389/2011
Nº DO CONTRATO: 053/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E
 CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 16/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2013
 (prazo para execução)
VALOR: R\$ 2.687.681,33
RECURSOS: FONTE 148
EXECUTOR: ENGº BRUNO SOUZA ALMEIDA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF – 355 Lote 1

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:
 Assinado o contrato. Indicado o executor. Preparação do canteiro de obras. Início dos trabalhos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:
 Acumulado 2%. O empenho só saiu dia 19/02/2013 por isso a obra estava parada. Nestas 2 semanas de serviço foram executados serviços de mobilização de máquinas, montagem do canteiro de obras, serviços de limpeza e início do rebaixo de sub-leito.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
2 %					

Avanço Físico Bimestral

2 %					
-----	--	--	--	--	--

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 1

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

O empenho só saiu no final do 1º bimestre.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- Rebaixo e regularização do sub leito
- Serviços de terraplanagem
- Encabeçamento da ponte
- Execução dos serviços de drenagem
- Instalação do caminho de serviço

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 2



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.005.389/2011
Nº DO CONTRATO: 053/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 16/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2013
 (prazo para execução)
VALOR: R\$ 2.604.238,43
RECURSOS: FONTE 148
EXECUTOR: ENGº BRUNO SOUZA ALMEIDA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF – 355 Lote 2

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:

Assinado o contrato. Indicado o executor. Preparação do canteiro de obras. Início dos trabalhos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

Acumulado 1%. O empenho só saiu por volta do dia 19/02/2013. Enquanto isso a obra estava parada. Nesta última semana foram executados:

- Mobilização de máquinas
- serviço de limpeza.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
1%	%	%	%	%	%	

1%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 2

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

O empenho só saiu no final de 1º bimestre.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- Término do serviço de limpeza
- Execução dos caminhos de serviço
- Execução da drenagem
- Serviço de terraplanagem
- Rebaixo do sub leito

PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.005.389/2011
Nº DO CONTRATO: 053/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E
CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 16/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2013
(prazo para execução)
VALOR: R\$ 2.560.770,55
RECURSOS: FONTE 148
EXECUTOR: ENGº GUILHERME JOSÉ DA
FONSECA BERNIZ

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:
Assinado o contrato. Indicado o executor. Preparação do canteiro de obras. Início dos trabalhos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:
Início dos trabalhos : desmatamento; execução de bueiros; drenagem. Prevista 1ª medição para o início do 2º bimestre.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
0 %	%	%	%	%	%	

0 %	%	%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 3

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 4



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.005.389/2011
Nº DO CONTRATO: 053/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 16/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2013 (prazo para execução)
VALOR: R\$ 2.658.283,00
RECURSOS: FONTE 148
EXECUTOR: ENG.º GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ.

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF – 355 Lote 4.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:

Assinado o contrato. Indicado o executor. Preparação do canteiro de obras. Início dos trabalhos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

Início dos trabalhos : desmatamento; execução de bueiros; drenagem. Prevista 1ª medição para o início do 2º bimestre.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
0 %	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
0 %	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 4

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL DO TIPO PONTE EM TRECHO DA DF – 355.



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.004.242/2011
Nº DO CONTRATO: 056/2012
EMPRESA: LAJE ENGENHARIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 22/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2013
VALOR: R\$ 1.272.771,83
RECURSOS: FONTES 348 E 148
EXECUTOR: ENG.º GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração de Projeto Executivo e a Construção de uma Obra de Arte especial, do tipo Ponte, sobre o Córrego Jardim na DF- 355.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:
 Acumulado 28% da Obra.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:
 Executado 6%. Acumulado 34%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
6%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
34 %	%	%	%	%	%


Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

RESTAURAÇÃO DA DF – 180, TRECHO BR – 060 A BR – 070, LOTE 01

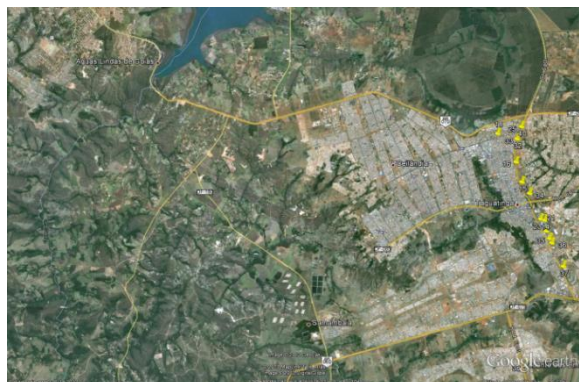

PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1689.0005 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.792/2011
Nº DO CONTRATO: 058/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E
 CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 13/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 12/05/2013
 (prazo para execução)
VALOR: R\$ 2.335.435,89
RECURSOS: FONTE 348
EXECUTOR: ENGº GERALDO JACINTO DA
 SILVA FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da rodovia DF-180 no trecho compreendido do seu entroncamento com a BR -070/DF-190, identificado como Lote 01. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:
 Serviço paralisado em função do período chuvoso.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:
 Início da obra em ritmo lento devido ao período chuvoso. Preparação do canteiro de obras.
 Aguardando empenho para o próximo bimestre.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF – 180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO DF-190/VC 311, LOTE 02



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1689.0005 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.792/2011
Nº DO CONTRATO: 059/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 13/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 12/05/2013 (prazo para execução)
VALOR: R\$ 3.860.417,26
RECURSOS: FONTE: 348
EXECUTOR: ENGº GERALDO JACINTO DA SILVA FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da Rodovia DF-180, compreendido do sub-trecho DF-190 até a VC 311, identificado como Lote 02. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:
 Serviço paralisado em função do período chuvoso.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:
 Início da obra em ritmo lento devido ao período chuvoso. Preparação do canteiro de obras. Aguardando empenho para o próximo bimestre.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

**RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF – 180, COMPREENDIDO DO
SUB-TRECHO VC 311/BR- 060, LOTE 02**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF – 180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO VC 311/BR- 060, LOTE 03



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1689.0005 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.792/2011
Nº DO CONTRATO: 060/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E
 CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 13/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 12/05/2013
 (prazo para execução)
VALOR: R\$ 3.106.491,96
RECURSOS: FONTE 348
EXECUTOR: ENGº GERALDO JACINTO DA
 SILVA FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da rodovia DF-180 compreendido entre o sub-trecho da VC-311 até seu entroncamento com a BR- 060, identificado como Lote 03. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:
 Serviço paralisado em função do período chuvoso.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:
 Acumulado 2%.

Serviço iniciado em fevereiro.

- Montagem do canteiro
- Serviço de sub leito (regularização)
- Serviço de limpeza.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
2%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
2%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

**RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF – 180, COMPREENDIDO DO
SUB-TRECHO VC 311/BR- 060, LOTE 03**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PAVIMENTAÇÃO VIA DE ACESSO A VILA BASEVI E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA.



PROGRAMAS DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.4734 (2012)
 26.782.6216.1475.1199 (2013)
Nº DO PROCESSO: 113.009.410/2009
Nº DO CONTRATO: 061/2012
EMPRESA: DIVAL ENGENHARIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 20/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/08/2013
(SEGUNDO ADITIVO)
VALOR: R\$ 1.732.147,49
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº BRUNO SOUSA ALMEIDA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Pavimentação via de acesso a Vila Basevi e implantação de ciclovia.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:
 Executado 2% da Obra

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

- Serviço iniciado no dia 02/01/2013 e paralisado no dia 15/01/2013 devido ao período de chuvas.
- Do dia 15/01/2013 até 03/03/2013 a empresa contratada não retornou os serviços e a fiscalização cobrou uma celeridade por parte da empresa passível de multa por inexecução parcial do contrato.
- O avanço físico foi 0% neste 1º bimestre de 2013.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
2%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

PAVIMENTAÇÃO VIA DE ACESSO A VILA BASEVI E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA.


COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤1º Bimestre de 2013: A Superintendência de Obras está a par da inexecução parcial da obra da Vila Basevi, mesmo enviando diversas cartas cobrando celeridade da empresa, a contratada não retornou os serviços, estando a obra abandonada.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- A empresa deverá apresentar ao DER qual será o novo plano de ação, uma vez que até a presente data só executou a limpeza parcial e parte do rebaixo do sub leito.
- O contrato da empresa expira em 20/03/2013 e nós da fiscalização não temos condições da Dival Engenharia terminar o contrato e a obra, estando passível de sanções conforme o contrato assinado.

**PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE EIA/RIMA, DESTINADOS À
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
ENTRE AS CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E PLANO PILOTO –
CORREDOR EIXO NORTE.**

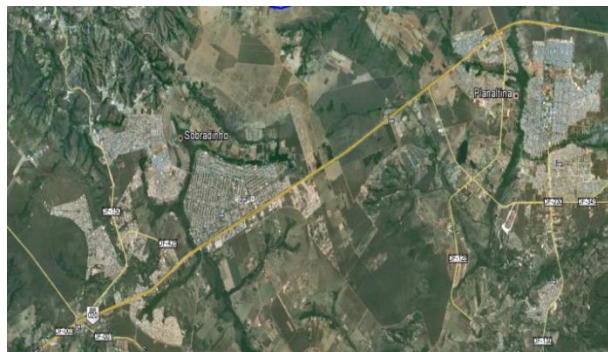

PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1968.0013 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.340/2011
Nº DO CONTRATO: 063/2012
EMPRESA: CONSÓRCIO DF INTERLIGADO
DATA DE INÍCIO: 26/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2014
VALOR: R\$ 12.251.695,70
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTORA: ENG^a ERY DO NASCIMENTO
BRANDI DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Projeto Executivo de Engenharia e de EIA/RIMA, destinados à implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto – Corredor Eixo Norte.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:
Acumulado 9,19%.

- Entrega do relatório Inicial (6,69%)
- Entrega do relatório Ambiental Preliminar (2,5%)

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:
Acumulado total de 18,94%

- Entrega do relatório de levantamento topográfico (6,36%)
- Entrega do levantamento de dados (2,79%)
- Entrega do estudo hidrológico (0,60%)

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
9,75%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
18,94%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

**PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE EIA/RIMA, DESTINADOS À
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
ENTRE AS CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E PLANO PILOTO –
CORREDOR EIXO NORTE.**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

EXECUÇÃO DA OBRA DE AUMENTO DE CAPACIDADE E MELHORAMENTOS NA RODOVIA DF- 047



PROGRAMAS DE TRABALHO:
 26.782.6216.3207.0001 (2012)
 28.782.6216.3207.0004 (2013)
Nº DO PROCESSO: 113.005.351/2011
Nº DO CONTRATO: 062/2012
EMPRESA: CONSÓRCIO EPAR
 (TIER/GEOSONDA/IQS)
DATA DE INÍCIO: 26/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2014
VALOR: R\$ 43.400.987,10
RECURSOS: FONTES 100, 148 E 348
EXECUTORES: ENGº FÁBIO CARDOSO DA
 SILVA, ENGº GERALDO JACINTO DA SILVA
 FILHO, ENGº ÁLVARO HOLANDA BOAVISTA
 (INSTRUÇÃO Nº 198 de 11/12/12).

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução da obra de aumento de capacidade e melhoramento na Rodovia DF-047. As obras englobam os serviços de terraplanagem, pavimentação rígida e flexível, drenagem, sinalização, contenção de taludes, obras de arte especiais, obras complementares e de recuperação do meio ambiente.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:
 Não teve andamento.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:
 Início dos serviços no mês de janeiro.

- Montagem do canteiro
- Contratação do serviço do projeto da trincheira (executivo)
- Início dos serviços de drenagem, limpeza

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
1%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
1%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

**EXECUÇÃO DA OBRA DE AUMENTO DE CAPACIDADE E MELHORAMENTOS
NA RODOVIA DF- 047**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.2800.2541.0001

Nº DO PROCESSO: 113.001.225/2008

Nº DO CONTRATO: 028/2011

EMPRESA: ENGEBRÁS S/A INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA

DATA DE INÍCIO: 23/12/2011

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2014

VALOR: R\$ 21.979.430,01 + R\$ 1.187.120,00

(TERCEIRO ADITIVO) = R\$ 23.166.550,01

RECURSOS: FONTE 237

EXECUTOR: ENG.º MURILO DE MELO
SANTOS

DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO: Monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:

Continuação da instalação/implantação dos equipamentos de controle de velocidade – 90% instalados e aferidos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP

AutoStore



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.2541.0001

Nº DO PROCESSO: 113.010751/2011

Nº DO CONTRATO: 018/2012

EMPRESA: LIG MÓBILE

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

DATA DE INÍCIO: 07/12/2010

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 05/06/2013

VALOR EMPENHADO (até o final do contrato):

R\$ 147.696,00

RECURSOS: FONTE 237

EXECUTOR: ENG^a GISANDRA FARIA DE PAULA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Locação de 60 equipamentos de Rádio Comunicação e 02 (dois) Fixos (estação Rádio Base).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:

Concluída a etapa de 2012.

- Os equipamentos começaram a ser utilizados em 28/06/2012.
- Até hoje, já foi pago R\$ 3.360,00 (jun/12 – habilitação dos rádios) + R\$ 1.202,80 (locação jun/12) + R\$ 12.028,00 (jun/12) + R\$ 12.028,00 (ago/2012) + R\$ 12.028,00 (set/2012) + R\$ 12.028,00 (out/12) + R\$ 12,028,00 (nov/12) + R\$ 12.028,00 (dez/12), totalizando R\$ 76.730,80 (ano 2012).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%					

Avanço Físico Bimestral

%					

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.2541.0001

Nº DO PROCESSO: 054.001403/2011

Nº DO CONVÊNIO: 001/2012

CONVENIADO: POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DATA DE INÍCIO: 11/05/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 11/05/2013

VALOR: R\$ 800.000,00

RECURSOS: FONTES 237 E 437

EXECUTOR: ENGº MURILO DE MELO SANTOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:
Concluída a etapa de 2012.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

**FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF,
SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

RECUPERAÇÃO DA PISTA DO BALÃO DO COLORADO E IMPLANTAÇÃO DA FAIXA DE ACELERAÇÃO NA RODOVIA BR-450/DF-003 (EPIA)



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.8121 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.008.571/2011
Nº DO CONTRATO: 003/2012
EMPRESA: CONSORCIO RV-CONVAP- ARP
DATA DE INÍCIO: 11/04/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/08/2013
 (SÉTIMO ADITIVO)
VALOR: R\$ 5.651.046,38
RECURSOS: FONTE 231
EXECUTOR: ENGº CRISTIANO ALVES CAVALCANTE



DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução das obras de recuperação da pista do Balão do Colorado, implantação da faixa de aceleração na rodovia BR-450/DF-003 (EPIA) e a realização dos serviços complementares na DF-150, inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:

Executado 0% no bimestre. Acumulado: 60% da obra executada. Ritmo lento devido a necessidade de alteração do projeto de escavação 3ª cat. No túnel N.A.T.M, localizado no Balão do Grande Colorado.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

Executado 0% no 1º bimestre. Acumulado 60%. Obra paralisada aguardando alteração do projeto quanto à escavação de mat. 3º cat. No túnel N.A.T.M, localizado no Balão do Grande Colorado. Obra paralisada.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

RECUPERAÇÃO DA PISTA DO BALÃO DO COLORADO E IMPLANTAÇÃO DA FAIXA DE ACELERAÇÃO NA RODOVIA BR-450/DF-003 (EPIA)

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

Obra paralisada.

➤ 30/01/2013:

Obra paralisada a partir de 27/12/2012.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

2013: Execução do túnel N.A.T.M. localizado no balão do Grande Colorado e conclusão da obra.

CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6215.2460.0001(2012)
 RA 99 – TODO DF
 Nº DO PROCESSO: 113.008698/2011
 CONTRATO: 027/2011
 EMPRESA: GRÁFICA E EDITORA
 MOVIMENTO
 DATA DE INÍCIO: 19/12/2011
 DATA PREVISTA CONCLUSÃO: 18/12/2013
 VALOR: R\$ 4.482.722,70
 RECURSOS: FONTE 237
 EXECUTORA: ELIANE CAVALCANTE SANTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços gráficos e diagramação de campanhas educativas de trânsito e meio ambiente, por meio de confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços gráficos

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM.

2012:

De janeiro a dezembro de 2012 foram produzidos folders para realização de 67.000 ações educativas (campanhas), sendo abordados 50.577 motoristas, 13.082 pedestres, 1.474 motociclistas e 1.867 ciclistas. Concluída a etapa de 2012.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM.

2013:

Neste 1º bimestre foram gastos R\$ 47.679,78 com serviços gráficos para campanhas educativas de trânsito e fiscalização.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-095 (EPCL)



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1347.9481 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.006.748/2011
Nº DO CONTRATO: 007/2012
EMPRESA: AJL ENGENHARIA E
 CONSTRUÇÕES LTDA
DATA DE INÍCIO: 03/05/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/03/2013
 (QUARTO ADITIVO).
VALOR: R\$ 1.643.903,83 + 384.000= R\$
 2.027.903,83
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº ANTÔNIO GOMES DA
 SILVA FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de Passarela em estrutura mista na Rodovia DF-095 (EPCL), Trecho DF-003 e DF-097, próximo ao Ceasa.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:
 Acumulado Executado 90% da Obra.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:
 Concluído. Já foi feita a medição final.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
10%						

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
100%						

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-095
(EPCL)**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-001, TRECHO ENTRONC. BR-060 E DF-075, PRÓXIMO A 1ª AVENIDA



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1347.9481 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.005.702/2011
Nº DO CONTRATO: 008/2012
EMPRESA: RIO PLATENSE CONSTRUÇÕES,
 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 03/05/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/01/2013
VALOR: R\$ 1.218.484,17 + R\$ 225.000,00 = R\$
 1.443.484,17
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº ANTÔNIO GOMES DA
 SILVA FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de Passarela em estrutura mista na Rodovia DF-001, Trecho entroncamento BR-060 e DF-075, próximo à 1ª Avenida.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:
 Acumulado Executado 90% da Obra.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:
 Em fase de conclusão, faltando alguns detalhes como pintura, soldagem de chapas e reaterro no pé das estruturas. Já foi paga.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
8%						

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
98%						

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-001,
TRECHO ENTRONC. BR-060 E DF-075, PRÓXIMO A 1ª AVENIDA**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VÁRIOS TRECHOS DE RODOVIAS DO SRDF



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6215.4197.0001(2012)
Nº DO PROCESSO: 113.007.600/2011
Nº DO CONTRATO: 013/2012
EMPRESA: SITRAN – COMÉRCIO E
 INDÚDTRIA DE ELETRÔNICA LTDA
DATA DE INÍCIO: 15/05/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 10/05/2013
VALOR: R\$ 9.201.943,03 + R\$ 2.235.918,41
 (SEGUNDO ADITIVO) = R\$ 11.437.861,44
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTOR: ENGº GUILHERME JOSÉ DA
 FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA: Sinalização Horizontal em vários trechos de rodovias do SRDF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2012:
 Executado 23%. Acumulado 83%. Concluída etapa 2012.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:
 Executado 9%. Acumulado 92%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
9 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Avanço Físico Bimestral

92 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
------	-----	-----	-----	-----	-----

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VÁRIOS TRECHOS DE RODOVIAS DO SRDF

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Os serviços de sinalização horizontal em diversas rodovias do SRDF serão executados em ritmo mais lento no próximo bimestre devido ao período chuvoso.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.4195.0001

Nº DO PROCESSO: 113.007.966/2012

Nº DO CONTRATO: 005/2013

EMPRESA: PETROENGE ENGENHARIA S/A

DATA DE INÍCIO: 19/03/2013

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 18/03/2014

VALOR: R\$ 951.500,00

RECURSOS: FONTE 100

EXECUTOR:

DESCRIÇÃO DA OBRA: Fornecimento parcelado de 5.298 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	

						Avanço Físico Acumulado
%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	

 A Ser Iniciada  Não Iniciada  Cancelada  Andamento Normal  Atrasada  Paralisada  Concluída

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO DF-410/ DF-345 PLANALTINA- LOTE 1

PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.1475.0027 (2013)

Nº DO PROCESSO: 113.010.929/2013

Nº DO CONTRATO: 006/2013

EMPRESA: TRIER ENGENHARIA LTDA

DATA DE INÍCIO: 20/03/2013

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/10/2013

VALOR: R\$ 3.130.103,78

RECURSOS: FONTE 100

EXECUTOR:

DESCRIÇÃO DA OBRA: Pavimentação da DF-230 no trecho compreendido entre seu entroncamento com a DF-345 até o entroncamento com a DF-410, identificado como LOTE 1. Km 10,20 ao Km 13,50 (da estaca 85 a estaca 250). As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização. Extensão de Pavimentação: 3.300,00 m (Dados de acordo com o Edital de Concorrência 006/2012).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	

						Avanço Físico Acumulado
%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	

 A Ser Iniciada  Não Iniciada  Cancelada  Andamento Normal  Atrasada  Paralisada  Concluída

PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO DF-410/ DF-345 PLANALTINA- LOTE 1

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO DF-410/ DF-345 PLANALTINA- LOTE 2

PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.1475.0027(2013)

Nº DO PROCESSO: 113.000.768/2013

Nº DO CONTRATO: 007/2013

EMPRESA: TRIER ENGENHARIA LTDA

DATA DE INÍCIO: 20/03/2013

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/10/2013

VALOR: R\$ 6.132.454,62

RECURSOS: FONTE 100

EXECUTOR:

DESCRIÇÃO DA OBRA: Pavimentação da DF-230 no trecho compreendido entre seu entroncamento com a DF-345 até o entroncamento com a DF-410, identificado como LOTE 2. Km 13,50 ao Km 19,10, até o asfalto existente (da estaca 250 a estaca 530). As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização. Extensão de Pavimentação: 5.600,00 m. (Dados de acordo com o Edital de Concorrência Nº 006/2012).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	

						Avanço Físico Acumulado
%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	

 A Ser Iniciada  Não Iniciada  Cancelada  Andamento Normal  Atrasada  Paralisada  Concluída

PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO DF-410/ DF-345 PLANALTINA- LOTE 2

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO TRECHO DA DF-355

PROGRAMAS DE TRABALHO:

26.205.26.782.6216.1226

26.205.26.782.6216.0001

Nº DO PROCESSO: 113.008.887/2012

Nº DO CONTRATO: 009/2013

EMPRESA: ECOTECH TECNOLOGIA
AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA

DATA DE INÍCIO: 25/03/2013

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2013

VALOR: R\$ 124.937,18

RECURSOS: FONTE 100

EXECUTOR:

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração dos planos de controle ambiental relativos à obra de pavimentação da rodovia DF-355, no trecho compreendido entre a DF-120 e a DF-320 e a obra de pavimentação da via de ligação entre a DF-001 e a Vila Basevi, conforme especificações nos anexos do Edital.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2013:

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	

						Avanço Físico Acumulado
%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	

 A Ser Iniciada  Não Iniciada  Cancelada  Andamento Normal  Atrasada  Paralisada  Concluída

ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO TRECHO DA DF-355

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:
