


# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL— 3º Bimestre/2013

## SOLUÇÃO INTEGRADA PARA DEPARTAMENTOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

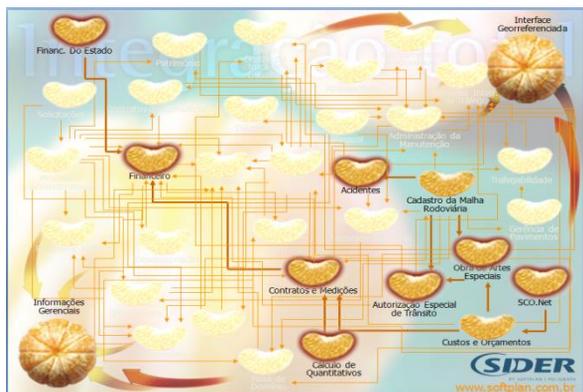

### PROGRAMAS DE TRABALHO:

26.122.6010.8517.0006 (2011),  
 26.122.6010.8517.0014 (2012),  
 26.122.6010.2557.2569 (2013)  
 RA 99 – TODO O DF  
 Nº DO PROCESSO: 113.000.376/2007  
 Nº DO CONTRATO: 051/2008  
 EMPRESA: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA  
 DATA DE INÍCIO: 01/01/2009  
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013  
 VALOR: R\$ 2.727.734,84 + R\$ 80.660,68 =  
 R\$ 2.808.395,52 (8º ADITIVO)  
 RECURSOS: FONTES 100, 237, 300, 220, 420, 437  
 EXECUTOR: JESSÉ GOUVEIA DE OLIVEIRA

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Prestação de serviços especializados de engenharia, visando a sistematização de um modelo integrado de gestão, permitindo ao DER-DF alcançar, com base em um banco de dados unificado, melhorias sustentáveis para a gestão de contratos de obras rodoviárias, segurança de trânsito de pessoas e de cargas do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:

Foram feitos serviços especializados de engenharia visando a sistematização do modelo integrado de gestão da informação, serviços de impressão, aquisição de fita magnética lto 4, cartucho para limpeza de impressoras.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

%	%	%	%	%	%
---	---	---	---	---	---

**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

➤ 2º Bimestre de 2012:

- Contrato renovado até 31/12/2013.
- Principais atividades:

A Consultoria contratada deverá disponibilizar equipe técnica em sua sede para atender ao DER/DF por telefone, fax, internet, conexão remota através de modem ou correspondência convencional, prestando serviços para: a) Assistência com análise, diagnóstico e solução de problemas; b) Atendimento às dúvidas sobre as características e utilização das ferramentas e aplicativos de apoio; c) Alterações e implementação de novas funções, consultas e/ou novos relatórios, desde que não caracterize o desenvolvimento de novos módulos ou implique em alterações estruturais no funcionamento do aplicativo.

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO



**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6215.2460.0001(2012), etapa 25 SAG  
 RA 99 – TODO DF  
**Nº DO PROCESSO:** 113.008.698/2011  
**CONTRATO:** 027/2011  
**EMPRESA:** GRÁFICA E EDITORA  
 MOVIMENTO  
**DATA DE INÍCIO:** 19/12/2011  
**DATA PREVISTA CONCLUSÃO:** 18/12/2013  
 (PRIMEIRO ADITIVO)  
**VALOR:** R\$ 4.482.722,70  
**RECURSOS:** FONTES: 237  
**EXECUTORA:** ELIANE CAVALCANTE SANTOS

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Prestação de serviços gráficos e diagramação de campanhas educativas de trânsito e meio ambiente, por meio de confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços gráficos.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:

Foram gastos R\$ 229.793,68 com serviços gráficos. De janeiro a julho foram gastos R\$ 344.746,30 com serviços gráficos voltados para campanhas educativas, ações realizadas pela Transitolândia e pela fiscalização de trânsito. Foram alcançados 24.105 condutores e pedestres com campanhas acerca de álcool/direção, velocidade, cadeirinha de bebê, celular, Boa Viagem, Funil, passagem subterrânea, passarela, etc.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

%	%	%	%	%	%
---	---	---	---	---	---

**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada
  Não Iniciada
  Cancelada
  Andamento Normal
  Atrasada
  Paralisada
  Concluída

## CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO TIPO TALÃO



### PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.2541.0001 (2013)

RA 99 – TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 113.006353/2010

Nº DO CONTRATO: 031/2010

EMPRESA: ENGEBRÁS S/A INDÚSTRIA,  
COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 07/12/2010

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 25/06/2014  
(NONO ADITIVO)

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 642.951,60

VALOR EMPENHADO (até ao final do contrato): R\$  
53.579,30 (ano 2010) + R\$ 600.088,16 (ano 2011)


RECURSOS: FONTE 237

EXECUTORA: ENG<sup>a</sup> GISANDRA FARIA DE PAULA

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Locação de 50 (cinquenta) equipamentos eletrônicos do tipo Talão para captura e registro eletrônico de infrações de trânsito.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:

- Em 2013 já foi pago: R\$ 53.579,30 (jan/13) + R\$ 53.579,30 (fev/13) + R\$ 53.579,30 (março/13) + R\$ 53.579,30 (abr/13) + R\$ 53.579,30 (mai/13). Total de R\$ 267.896,50 no ano de 2013.
- O contrato foi prorrogado por mais 12 meses a partir de 29/05/2013.



Avanço Físico Bimestral



% Acumulativo Executado dos Serviços

■ A Ser Iniciada ■ Não Iniciada ■ Cancelada ■ Andamento Normal ■ Atrasada ■ Paralisada ■ Concluída

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

- A paralisação do presente contrato deve-se à necessidade de obtenção de dados on-line que alimentarão a base de consulta para o registro eletrônico de infrações de Trânsito. Estes dados são obtidos junto ao DETRAN/DF, órgão detentor dos registros relacionados aos veículos e condutores, no âmbito do DF.
- Até o momento, estes dados ainda não foram repassados pelo DETRAN/DF. O DER/DF tem realizado consultas sistemáticas junto ao DETRAN/DF para a obtenção desses dados (ofícios, e-mails, telefonemas, reuniões).
- Comentário 4º bimestre: Fica reativado o contrato a partir de 03 de outubro de 2012, ficando inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato nº 31/2012.
- Nono Aditivo (DO/DF nº 118 de 11/06/2013): O valor estimado para o próximo período é de R\$ 642.951,60.

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

- Obtenção contínua da base de dados necessárias junto ao DETRAN/DF para que os talonários comecem a ser utilizados.



PROGRAMA DE TRABALHO:  
 26.782.6215.2541.0001  
 Nº DO PROCESSO: 113.001.225/2008  
 Nº DO CONTRATO: 028/2011  
 EMPRESA: ENGEBRÁS S/A INDÚSTRIA,  
 COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA  
 DATA DE INÍCIO: 23/12/2011  
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2014  
 VALOR: R\$ 21.979.430,01 + R\$ 1.187.120,00  
 (TERCEIRO ADITIVO) = R\$ 23.166.550,01  
 RECURSOS: FONTE 237  
 EXECUTOR: ENG.º MURILO DE MELO  
 SANTOS

**DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO:** Monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N).

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**  
 Executado 16,6 % no bimestre. Acumulado 49,8% da previsão anual. Contrato em ritmo normal.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	16,6%	16,6 %	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

16,6%	33,2%	49,8%	%	%	%
-------	-------	-------	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
  Não Iniciada
  Cancelada
  Andamento Normal
  Atrasada
  Paralisada
  Concluída

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

Trata-se de serviço de natureza contínua.

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP

AutoStake



### PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.2541.0001

Nº DO PROCESSO: 113.010.751/2011

Nº DO CONTRATO: 018/2012

EMPRESA: LIG MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

DATA DE INÍCIO: 06/06/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 05/06/2014  
(PRIMEIRO ADITIVO)

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 147.696,00 + R\$ 26.263,00 (PRIMEIRO ADITIVO) = R\$ 173.959,00


RECURSOS: FONTE 237

EXECUTORA: ENG<sup>a</sup> GISANDRA FARIA DE PAULA

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Locação de 60 equipamentos de Rádio Comunicação e 02 (dois) Fixos (estação Rádio Base).

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:

- Os equipamentos começaram a serem utilizados em 28/06/2012;
- O contrato foi prorrogado por mais 12 meses, a partir de 04/06/2013, e foi acrescido mais 10 equipamentos de rádio comunicação e 1 fixo (estação rádio base), totalizando, a partir de agora, desembolso mensal de R\$ 19.861,00.
- Até hoje, já foi pago R\$ 3.360,00 (jun/12 – habilitação dos rádios) + R\$ 1.202,80 (locação jun/12) + R\$ 12.028,00 (jul/12) + R\$ 12.028,00 (ago/12) + R\$ 12.028,00 (set/12) + R\$ 12.028,00 (out/12) + R\$ 12.028,00 (nov/12) + R\$ 12.028,00 (dez/12), + R\$ 12.028,00 (jan/13) + R\$ 12.028,00 (fev/13) + R\$ 12.028,00 (março/13) + R\$ 12.028,00 (abril/13) + R\$ 12.028,00 (mai/13), totalizando R\$ 76.730,80 (ano 2012) + **R\$ 60.140,00 (ano 2013)** – TOTAL GERAL = R\$ 136.870,80.
- Ainda não foi paga a fatura referente ao mês de junho/2013.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.2541.0001

Nº DO PROCESSO: 054.001403/2011

Nº DO CONVÊNIO: 001/2012

CONVENIADO: POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DATA DE INÍCIO: 11/05/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 11/05/2013

VALOR: R\$ 800.000,00

RECURSOS: FONTES 237 E 437

EXECUTOR: ENGº MURILO DE MELO SANTOS

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 49,8%. Convênio em andamento normal.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	16,6%	16,6%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

16,6%	33,2%	49,8%	%	%	%
-------	-------	-------	---	---	---

**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada
  Não Iniciada
  Cancelada
  Andamento Normal
  Atrasada
  Paralisada
  Concluída

**FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF,  
SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

Elaboração de um novo plano de trabalho para a vigência 2013/2014.

## MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



**PROGRAMAS DE TRABALHO:**  
 26.782.2800.2904.0001 (2011) e  
 26.782.6215.2904.0001 (2012), ETAPA 29 SAG  
 RA 99 – TODO DF  
**Nº DO PROCESSO:** 113.005.681/2010  
**Nº DO CONTRATO:** 011/2011  
**EMPRESA:** HOT COZINHA INDUSTRIAL  
**DATA DE INÍCIO:** MARÇO/ 2011  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 31/05/2014  
 (TERCEIRO ADITIVO)  
**VALOR:** R\$ 282.528,00 + R\$11.232,00  
 (SEGUNDO ADITIVO)  
**RECURSOS:** FONTE 237  
**EXECUTORA:** ELIANE CAVALCANTE SANTOS

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Lanche para as crianças das Escolas Públicas, que são levadas nos períodos matutino e vespertino, no Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o Trânsito, para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:

Foram gastos R\$ 7.674,69 com fornecimento de lanche para a Transitolândia. De janeiro a julho foram atendidas 2.632 crianças na Transitolândia e 23.930 em escolas e atividades externas. Foram fornecidos 3.820 lanches e gastos R\$ 12.829,44 de janeiro até o 3º bimestre.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

%	%	%	%	%	%

**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

## MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ Terceiro aditivo (DODF nº 118 de 11/06/2013): O valor estimado para o próximo período é de R\$ 152.496,00.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

## INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO



### PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.3209.0001

Nº DO PROCESSO: 113.000.076/2013

Nº DO CONTRATO: 018/2013

EMPRESA: SITRAN-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA

DATA DE INÍCIO: 29/05/2013

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/09/2013

VALOR: R\$ 838.882,14

RECURSOS: FONTE 237

EXECUTOR: ENGº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Execução de sinalização para orientação de destino específica para eventos do Comitê organizador da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:

Executado 70%. Iniciado os serviços de fundações para semipórtico simples (padrão DER/DF); fornecimento e implantação de placas de sinalização totalmente refletiva com película tipo X-ABNT 14644/2007 grau; semipórtico para placas indicativas com altura – 7m com uma bandeira treliçada (padrão DER/DF); fornecimento e implantação de placa de sinalização com suporte película tipo X-ABNT 4S0620002 e defensas metálicas semi-maleáveis 4S0600001.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
		70%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
		70%	%	%	%

**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

## INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

Providenciando medição dos serviços executados.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

## SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VÁRIOS TRECHOS DE RODOVIAS DO SRDF



**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6215.4197.0001(2012)  
**Nº DO PROCESSO:** 113.007.600/2011  
**Nº DO CONTRATO:** 013/2012  
**EMPRESA:** SITRAN – COMÉRCIO E  
 INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA.  
**DATA DE INÍCIO:** 15/05/2012  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 31/07/2013  
 (TERCEIRO ADITIVO)  
**VALOR:** R\$ 9.201.943,03 + R\$ 2.235.918,41  
 (SEGUNDO ADITIVO) = R\$ 11.437.861,44  
**RECURSOS:** FONTE 237  
**EXECUTOR:** ENGº GUILHERME JOSÉ DA  
 FONSECA BERNIZ

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Sinalização Horizontal em vários trechos de rodovias do SRDF.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**  
 Executado 2%. Acumulado 100%. Em fase de pagamento da medição final.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
9 %	6 %	2%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
92 %	98%	100%	%	%	%	

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VÁRIOS TRECHOS DE RODOVIAS DO SRDF

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 1º Bimestre de 2013: Solicitado a prorrogação de prazo de execução dos serviços por mais 30 dias tendo em vista o período chuvoso e suas consequências que impediram a aplicação de material termoplástico extrudado e hot-spray, dificultando a execução dos serviços.
- 3º Bimestre: Em 22/05/2013 foi encaminhado pelo Executor do contrato ao Superintendente de Obras /DER/DF a Decisão nº 6225/2012 do TCDF e solicitado manifestação da PROJUR, da SUAFIN, da SUTEC para aplicação dos preços do sistema SICRO 2 do DNIT , pois o Executor não pode alterar qualquer cláusula para readequação do contrato sem a anuência do ordenador de despesa.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Conclusão da obra.

## MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO



### PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6515.4198.0001

Nº DO PROCESSO: 113.004.476/2006

Nº DO CONTRATO: 020/2008

EMPRESA: SITRAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA.

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 01/08/2008

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 01/08/2013  
(TERCEIRO ADITIVO)

VALOR: R\$ 2.105.493,13 (INICIAL)

RECURSOS: FONTE 237

EXECUTOR: ENGº CARLOS ALBERTO

MUNDIM PENA

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Manutenção preventiva dos equipamentos do sistema semafórico operado pelo DER/DF. Concorrência nº 01/2007.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:

Executado 16,6 % no bimestre. Acumulado 49,8%. Contrato em andamento normal.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	16,6%	16,6%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	33,2%	49,8%	%	%	%

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

Trata-se de serviço de natureza contínua.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:


## CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-095 (EPCL)



**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.1347.9481 (2012)  
**Nº DO PROCESSO:** 113.006.748/2011  
**Nº DO CONTRATO:** 007/2012  
**EMPRESA:** AJL ENGENHARIA E  
 CONSTRUÇÕES LTDA.  
**DATA DE INÍCIO:** 03/05/2012  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 31/03/2013  
 (QUARTO ADITIVO).  
**VALOR:** R\$ 1.643.903,83  
**RECURSOS:** FONTE 100  
**EXECUTOR:** ENGº ANTÔNIO GOMES DA  
 SILVA FILHO

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Construção de Passarela em estrutura mista na Rodovia DF-095 (EPCL), Trecho: DF-003(EPIA) a DF-097 (EPAC), próximo ao Ceasa.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2013:**  
 Medição Final já foi paga. Concluída a obra e o contrato.



A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-095  
(EPCL)**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-001 (EPCT), TRECHO ENTRONC. BR-060 E A DF-075, PRÓXIMO A 1ª AVENIDA



**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.1347.9481 (2012)  
**Nº DO PROCESSO:** 113.005.702/2011  
**Nº DO CONTRATO:** 008/2012  
**EMPRESA:** RIO PLATENSE CONSTRUÇÕES,  
 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA  
**DATA DE INÍCIO:** 03/05/2012  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 31/01/2013  
**VALOR:** R\$ 1.218.484,17  
**RECURSOS:** FONTE 100  
**EXECUTOR:** ENGº ANTÔNIO GOMES DA  
 SILVA FILHO

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Construção de Passarela em estrutura mista na Rodovia DF-001 (EPCT), Trecho: Entroncamento da BR-060 e a DF-075 (EPNB), próximo à 1ª Avenida.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2013:**  
 Acumulado 100%. Concluída a obra e o contrato.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
8%	92%					<b>Avanço Físico Bimestral</b>

8%	100%					<b>Avanço Físico Acumulado</b>
----	------	--	--	--	--	--------------------------------

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-001  
(EPCT), TRECHO: ENTRONC. BR-060 E A DF-075, PRÓXIMO A 1ª AVENIDA**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## VIADUTO ENGENHO DAS LAGES, TRECHO ENTRONC. BR-060 COM A DF-290



**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.1475.0011(2012)  
**Nº DO PROCESSO:** 113.010.021/2009  
**Nº DO CONTRATO:** 017/2012  
**EMPRESA:** ETEC  
**DATA DE INÍCIO:** 01/06/2012  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 28/07/2013  
 (QUARTO ADITIVO)  
**VALOR:** R\$ 7.266.888,31  
**RECURSOS:** FONTES 231 e 348  
**EXECUTOR:** ENGº SAMUEL DIAS JÚNIOR

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Viaduto do Engenho das Lages, obras de finalização de implantação do entroncamento da BR-060 com a DF-290.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**  
 Acumulado 100% . Medição final já emitida e encaminhada para pagamento.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
0%	5%	%	%	%	%	

95%	100%	%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado
-----	------	---	---	---	---	-------------------------

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

**VIADUTO ENGENHO DAS LAGES, TRECHO ENTRONC. BR-060 COM A DF-290**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO DF-410/ DF-345 PLANALTINA- LOTE 1



PROGRAMA DE TRABALHO:  
 26.782.6216.1475.0027 (2013),  
 Nº DO PROCESSO: 113.010.929/2011  
 Nº DO CONTRATO: 006/2013  
 EMPRESA: TRIER ENGENHARIA LTDA.  
 DATA DE INÍCIO: 20/03/2013  
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/10/2013  
 VALOR: R\$ 3.130.103,78  
 RECURSOS: FONTE 100  
 EXECUTOR: ENG º PAULO ROBERT SANTOS  
 MACHADO

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Pavimentação da DF-230 no trecho compreendido entre seu entroncamento com a DF-345 até o entroncamento com a DF-410, identificado como LOTE 1, do km 10,20 ao km 13,50 (da estaca 85 a estaca 250). As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização. Extensão de Pavimentação: 3.300,00 m (conforme dados do Edital de Concorrência 006/2012).

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:

Executado 10% no bimestre. Início dos serviços de limpeza e regularização do subleito e execução de bueiros.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	10%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
%	%	10%	%	%	%	

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

- 2º bimestre de 2013: Início dos serviços de drenagem a partir do 3º bimestre.
- 3º bimestre de 2013: Início dos serviços de limpeza e terraplenagem.

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

- Execução da pavimentação, término dos serviços de drenagem (bueiros).

## PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO DF-410/ DF-345 PLANALTINA- LOTE 2



**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.1475.0027(2013) ,  
**Nº DO PROCESSO:** 113.000.768/2013  
**Nº DO CONTRATO:** 007/2013  
**EMPRESA:** TRIER ENGENHARIA LTDA .  
**DATA DE INÍCIO:** 20/03/2013  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 31/10/2013  
**VALOR:** R\$ 6.132.454,62  
**RECURSOS:** FONTE 100  
**EXECUTOR:** ENGº PAULO ROBERT SANTOS MACHADO

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Pavimentação da DF-230 no trecho compreendido entre seu entroncamento com a DF-345 até o entroncamento com a DF-410, identificado como LOTE 2 (km. 13,50 ao km. 19,10), até o asfalto existente (da estaca 250 a estaca 530). As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização. Extensão de Pavimentação: 5.600,00 m. (Conforme dados do Edital de Concorrência nº 006/2012).

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**  
 Executado 17% no bimestre. Início da terraplenagem; serviços de regularização do subleito; base da estaca 53a a estaca 490.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	17%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	17%	%	%	%

**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

## PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO DF-410/ DF-345 PLANALTINA- LOTE 2

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 2º bimestre de 2013: Início dos serviços de drenagem.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- Execução da pavimentação
- Término dos serviços de drenagem (bueiros)
- Relocação de cercas.

**CONSTRUÇÃO DE ACESSO (AGULHA) à DF-003 (EPIA), TRECHO DF-095/DF-010,  
COM IMPLANTAÇÃO DE BAIJA DE PARADA DE ÔNIBUS E REMANEJAMENTO DO  
ABRIGO EXISTENTE.**



PROGRAMA DE TRABALHO:  
26.782.6216.1475.1199 (2012)  
Nº DO PROCESSO: 113.010.786/2010  
Nº DO CONTRATO: 028/2012  
EMPRESA: CRC – CONSTRUTORA  
RODRIGUES CAMPOS LTDA.  
DATA DE INÍCIO: 09/08/2012  
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/09/2013  
(QUARTO ADITIVO)  
VALOR: R\$ 199.873,17  
RECURSOS: FONTE 348  
EXECUTOR: ENGº SAMUEL DIAS JÚNIOR

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Construção de acesso (Agulha) à DF-003 (EPIA), trecho DF-095 / DF-010, com implantação de baia de parada de ônibus e remanejamento do abrigo existente.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2013:**  
Acumulado 100%. Em fase de pagamento da última medição.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**  
Em fase de pagamento da última medição.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
99%	1 %	%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

99%	100 %	%	%	%	%
-----	-------	---	---	---	---

**Avanço Físico Acumulado**


A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

**CONSTRUÇÃO DE ACESSO (AGULHA) à DF-003 (EPIA), TRECHO DF-095/DF-010,  
COM IMPLANTAÇÃO DE BAIA DE PARADA DE ONIBUS E REMANEJAMENTO DO  
ABRIGO EXISTENTE.**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## DUPLICAÇÃO DA DF-451

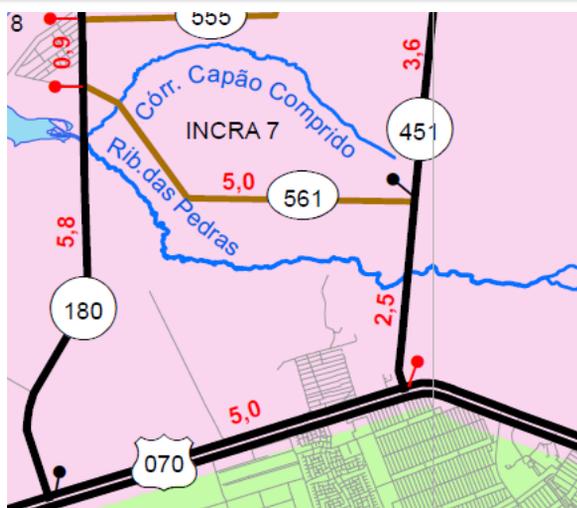

**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.1475.1199  
**Nº DO PROCESSO:** 113.000.292/2013  
**Nº DO CONTRATO:** 017/2013  
**EMPRESA:** GW CONSTRUÇÕES E  
 INCORPORAÇÕES LTDA  
**DATA DE INÍCIO:** 07/05/2013  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 30/09/2013  
**VALOR:** R\$ 1.588.056,20  
**RECURSOS:** FONTE 100  
**EXECUTOR:** ENGº ELI CÂMARA

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Duplicação de 1,39 km da Rodovia DF-451, no trecho compreendido do entroncamento da Rodovia BR-070 ao entroncamento da Rodovia Vicinal - VC-561. Concorrência nº 001/2013.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**  
 A obra está paralisada aguardando licença ambiental.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

%	%	%	%	%	%
---	---	---	---	---	---

**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

## DUPLICAÇÃO DF-451

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## PAVIMENTAÇÃO VIA DE ACESSO A VILA BASEVI E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA.





**PROGRAMAS DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.1475.4734 (2012)  
 26.782.6216.1475.1199 (2013)  
**Nº DO PROCESSO:** 113.009.410/2009  
**Nº DO CONTRATO:** 061/2012  
**EMPRESA:** DIVAL ENGENHARIA LTDA.  
**DATA DE INÍCIO:** 20/11/2012  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 31/08/2013  
 (SEGUNDO ADITIVO)  
**VALOR:** R\$ 1.732.147,49  
**RECURSOS:** FONTE 100  
**EXECUTOR:** ENGº BRUNO SOUSA ALMEIDA

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Pavimentação via de acesso a Vila Basevi e implantação de ciclovia.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**

➤ Rescindido o contrato com a Dival Engenharia. A 2ª empresa assumiu o serviço. Foi publicado um novo contrato.



A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

## PAVIMENTAÇÃO VIA DE ACESSO A VILA BASEVI E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA.

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 1º Bimestre de 2013: A Superintendência de Obras está a par da inexecução parcial da obra da Vila Basevi, mesmo tendo enviado diversas cartas cobrando celeridade da empresa, a contratada não retornou os serviços, estando a obra paralisada.
- 2º Bimestre de 2013: A contratada retomou os serviços de terraplenagem após cobrança da Superintendência de Obras e da fiscalização.
- 3º Bimestre de 2013: Contrato Rescindido com a DIVAL em 21/06/2013 (DODF Nº 133 de 28/06/2013).

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- A empresa deverá apresentar ao DER qual será o novo plano de ação, uma vez que até a presente data só executou a limpeza parcial e parte do rebaixo do sub leito.
- O contrato da empresa expira em 20/03/2013 e a fiscalização informa que a empresa Dival Engenharia não deverá terminar o contrato e a obra, estando passível de sanções conforme o contrato assinado.

## PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 1



**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.1475.3517 (2012)  
**Nº DO PROCESSO:** 113.005.389/2011  
**Nº DO CONTRATO:** 053/2012  
**EMPRESA:** JM TERRAPLANAGEM E  
 CONSTRUÇÃO LTDA  
**DATA DE INÍCIO:** 16/10/2012  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 31/10/2013  
 (SEGUNDO ADITIVO)  
**VALOR:** R\$ 2.687.681,33  
**RECURSOS:** FONTE 148  
**EXECUTOR:** ENGº BRUNO SOUZA ALMEIDA

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Asfaltamento DF – 355 Lote 1

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:

- Conclusão do serviço de terraplenagem;
- 70% do serviço de solo cal concluído;
- 40% do serviço de BGS concluído;
- Conclusão dos serviços de drenagem.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
2%	10%	38%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

2%	12%	50%	%	%	%
----	-----	-----	---	---	---

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 1

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

O empenho só saiu no final do 1º bimestre e a empresa contratada imediatamente iniciou os serviços de terraplanagem.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

#### ➤1º Bimestre:

- Rebaixo e regularização do sub-leito
- Serviços de terraplanagem
- Encabeçamento da ponte
- Execução dos serviços de drenagem
- Instalação do caminho de serviço

Todos os serviços do bimestre anterior foram praticamente concluídos.

#### ➤2º Bimestre:

- Inicialização do reforço do sub-leito em solo cal.
- Inicialização e término da sub-base em solo cal.
- Término do encabeçamento da ponte.

## PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 2



**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.1475.3517 (2012)  
**Nº DO PROCESSO:** 113.001.123/2013  
 (PROC. ORIGINAL 113.005.389/2011)  
**Nº DO CONTRATO:** 053/2012  
**EMPRESA:** JM TERRAPLANAGEM E  
 CONSTRUÇÃO LTDA  
**DATA DE INÍCIO:** 16/10/2012  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 31/10/2013  
 (SEGUNDO ADITIVO)  
**VALOR:** R\$ 2.604.238,43  
**RECURSOS:** FONTE 148  
**EXECUTOR:** ENGº BRUNO SOUZA ALMEIDA

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Asfaltamento DF – 355 Lote 2

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:

- 80% do serviço de terraplenagem concluído;
- Inicialização dos serviços de drenagem (bueiros e DPS);
- 20% do serviço de solo cal concluído.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
1%	6%	23%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
1%	7%	30%	%	%	%

**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

## PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 2

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

O empenho só saiu no final do 1º bimestre.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

#### ➤ 1º Bimestre:

- Término do serviço de limpeza
- Execução dos caminhos de serviço
- Execução da drenagem
- Serviço de terraplanagem
- Rebaixo do sub leito

#### ➤ 2º Bimestre

- Finalizar os serviços de terraplanagem e dos dispositivos de drenagem
- Inicializar os serviços para o reforço do sub-leito em solo cal
- Inicializar os serviços para instalação da sub-base em solo cal.

## PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 3



**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.1475.3517 (2012)  
**Nº DO PROCESSO:** 113.001.124/2013  
 (PROC. ORIGINAL 113.005.389/2011)  
**Nº DO CONTRATO:** 053/2012  
**EMPRESA:** JM TERRAPLANAGEM E  
 CONSTRUÇÃO LTDA  
**DATA DE INÍCIO:** 16/10/2012  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 31/10/2013  
 (SEGUNDO ADITIVO)  
**VALOR:** R\$ 2.560.770,55  
**RECURSOS:** FONTE 148  
**EXECUTOR:** ENGº GUILHERME JOSÉ DA  
 FONSECA BERNIZ

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Asfaltamento da DF – 355, Lote 3.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**  
 Avanço 3%. Acumulado 10%. Continuação dos serviços de drenagem e terraplenagem.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
0 %	7 %	3%	%	%	%	<b>Avanço Físico Bimestral</b>

0 %	7 %	10%	%	%	%	<b>Avanço Físico Acumulado</b>
-----	-----	-----	---	---	---	--------------------------------

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

## PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 3

### **COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

Questionamento técnicos relativo a execução dos serviços foram respondidos em junho 2013 pela SUTEC o que levou a demora na execução da obra.

### **PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 4



**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.1475.3517 (2012)  
**Nº DO PROCESSO:** 113.001.125/2013  
 (PROC. ORIGINAL 113.005.389/2011)  
**Nº DO CONTRATO:** 053/2012  
**EMPRESA:** JM TERRAPLANAGEM E  
 CONSTRUÇÃO LTDA  
**DATA DE INÍCIO:** 16/10/2012  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 31/10/2013  
 (SEGUNDO ADITIVO)  
**VALOR:** R\$ 2.658.283,00  
**RECURSOS:** FONTE 148  
**EXECUTOR:** ENG.º GUILHERME JOSÉ DA  
 FONSECA BERNIZ.

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Asfaltamento DF – 355 Lote 4.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:

Executado 3%. Acumulado 10%. Continuação dos serviços de terraplanagem e drenagem.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
0 %	7 %	3%	%	%	%	<b>Avanço Físico Bimestral</b>

0 %	7 %	10 %	%	%	%	<b>Avanço Físico Acumulado</b>
-----	-----	------	---	---	---	--------------------------------

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

## PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 4

### **COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

Questionamento técnicos relativo a execução dos serviços foram respondidos em junho 2013 pela SUTEC o que levou a demora na execução da obra.

### **PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL DO TIPO PONTE EM TRECHO DA DF – 355.



**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.1475.3517 (2012)  
**Nº DO PROCESSO:** 113.004.242/2010  
**Nº DO CONTRATO:** 056/2012  
**EMPRESA:** LAJE ENGENHARIA LTDA  
**DATA DE INÍCIO:** 22/10/2012  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 31/08/2013  
 (SEGUNDO ADITIVO)  
**VALOR:** R\$ 1.272.771,83  
**RECURSOS:** FONTES 348 E 148  
**EXECUTOR:** ENG.º GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Elaboração de Projeto Executivo e a Construção de uma Obra de Arte Especial, do tipo Ponte, sobre o Córrego Jardim na DF- 355.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:

Em 16/04/2013 solicitado a SUOBRA a paralização da obra em virtude do aterro do encabeçamento da ponte ainda não estar concluído. Em 18/06/2013 houve a reativação da obra em virtude do aterro do encabeçamento da ponte já estar concluído. O prazo de execução dos serviços foi prorrogado por 30 dias devendo expirar-se em 21/07/2013 estendendo-se por conseguinte a vigência contratual para 31/08/2013. Executado 2% da obra. Acumulado 100%, em fase de medição final.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
6%	64%	2%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

34%	98%	100%	%	%	%
-----	-----	------	---	---	---

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

- Em 16/04/2013 foi solicitado a SUOBRA a paralisação da obra em virtude do aterro do encabeçamento da ponte ainda não estar concluído.
- Em 18/06/2013 prorroga o contrato até 31/08/2013.

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

Conclusão da obra.

## RECUPERAÇÃO DA PISTA DO BALÃO DO COLORADO E IMPLANTAÇÃO DA FAIXA DE ACELERAÇÃO NA RODOVIA BR-450/DF-003 (EPIA)



**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.1475.8121 (2012) ,  
**Nº DO PROCESSO:** 113.008.571/2011  
**Nº DO CONTRATO:** 003/2012  
**EMPRESA:** CONSORCIO RV-CONVAP- ARP  
**DATA DE INÍCIO:** 11/04/2012  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 31/12/2013  
 (8º ADITIVO)  
**VALOR:** R\$ 4.651.046,38 + 284.618,07 = R\$  
 4.935.664,45 (1º ADITIVO)  
**RECURSOS:** FONTES 231, 148, 348  
**EXECUTOR:** ENGº CRISTIANO ALVES  
 CAVALCANTE

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Execução das obras de recuperação da pista do Balão do Colorado, implantação da faixa de aceleração na rodovia BR-450/DF-003 (EPIA) e a realização dos serviços complementares na DF-150, inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 60%. Aguardando autorização dos Órgãos competentes (Exército Brasileiro e Defesa Civil) para o uso de explosivos na execução da galeria de águas pluviais e para o início da escavação de mat. 3ª cat. no túnel N.A.T.M, localizado no Balão do Grande Colorado.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
0%	0%	0%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
60%	60%	60%	%	%	%	

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

## **RECUPERAÇÃO DA PISTA DO BALÃO DO COLORADO E IMPLANTAÇÃO DA FAIXA DE ACELERAÇÃO NA RODOVIA BR-450/DF-003 (EPIA)**


### **COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

- 1º Bimestre (30/01/2013): Obra paralisada a partir de 27/12/2012.
- 3º Bimestre (24/06/2013): Contrato prorrogado por 120 dias.
- Fim da paralisação do contrato em 27/03/2013, porém é necessária a liberação do uso de explosivos por parte do Exército Brasileiro para dar continuidade à obra.

### **PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

- Para 2013: Execução do túnel N.A.T.M. localizado no balão do Grande Colorado e conclusão da obra.

## RESTAURAÇÃO DA DF – 180, TRECHO BR – 060 A BR – 070, LOTE 01

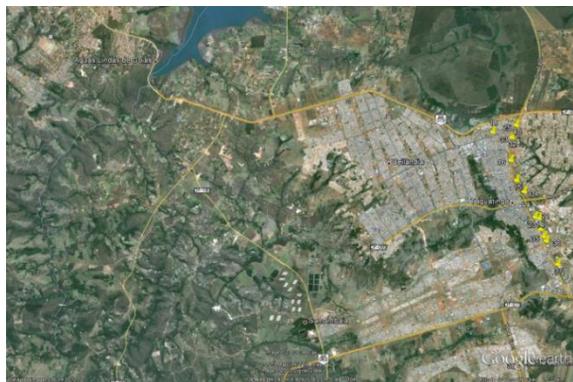

**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.1689.0005 (2012)  
**Nº DO PROCESSO:** 113.009.792/2011  
**Nº DO CONTRATO:** 058/2012  
**EMPRESA:** JM TERRAPLANAGEM E  
 CONSTRUÇÃO LTDA  
**DATA DE INÍCIO:** 13/11/2012  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 31/10/2013  
 (PRIMEIRO ADITIVO)  
**VALOR:** R\$ 2.335.435,89  
**RECURSOS:** FONTE 348  
**EXECUTOR:** ENGº GERALDO JACINTO DA  
 SILVA FILHO

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Restauração da rodovia DF-180 no trecho compreendido do seu entroncamento com a BR-070/DF-190, identificado como Lote 01. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**  
 Executado 0,15% no bimestre. Foi iniciado apenas o serviço de limpeza.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	0,15%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	0,15%	%	%	%

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

2º bimestre de 2013: Aguardando empenho.

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF – 180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO DF-190/VC 311, LOTE 02



**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.1689.0005 (2012)  
**Nº DO PROCESSO:** 113.009.792/2011  
**Nº DO CONTRATO:** 059/2012  
**EMPRESA:** JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA  
**DATA DE INÍCIO:** 13/11/2012  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 31/10/2013 (PRIMEIRO ADITIVO)  
**VALOR:** R\$ 3.860.417,26  
**RECURSOS:** FONTE: 348  
**EXECUTOR:** ENGº GERALDO JACINTO DA SILVA FILHO

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Restauração da Rodovia DF-180, compreendido do sub-trecho DF-190 até a VC 311, identificado como Lote 02. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**  
 Executado 10% no bimestre. Acumulado 10%. Foram iniciados os serviços de restauração nos acostamentos (fresagem, sub-base, base, imprimação, pintura de ligação e capa) e na pista (fresagem, sub-base, base, imprimação, pintura de ligação e capa).

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	10%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

0%	0%	10%	%	%	%
----	----	-----	---	---	---

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

**RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF – 180, COMPREENDIDO DO  
SUB-TRECHO VC 311/BR- 060, LOTE 02**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

➤ 2º bimestre de 2013: Aguardando empenho.

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF – 180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO VC 311/BR- 060, LOTE 03



**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.1689.0005 (2012)  
**Nº DO PROCESSO:** 113.009.792/2011  
**Nº DO CONTRATO:** 060/2012  
**EMPRESA:** JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA  
**DATA DE INÍCIO:** 13/11/2012  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 31/10/2013 (PRIMEIRO ADITIVO)  
**VALOR:** R\$ 3.106.491,96  
**RECURSOS:** FONTE: 348  
**EXECUTOR:** ENGº GERALDO JACINTO DA SILVA FILHO

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Restauração da rodovia DF-180 compreendido entre o sub-trecho da VC-311 até seu entroncamento com a BR- 060, identificado como Lote 03. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**  
 Executado 61% no bimestre. Acumulado 93%. Continuação dos serviços de restauração na pista e no acostamento (fresagem, sub-base, base, imprimação, pintura de ligação e capa.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
2%	30%	61%	%	%	%	<b>Avanço Físico Bimestral</b>

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
2%	32%	93%	%	%	%	<b>Avanço Físico Acumulado</b>

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída


**RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF – 180, COMPREENDIDO DO  
SUB-TRECHO VC 311/BR- 060, LOTE 03**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

➤ 2º bimestre de 2013: Foram encaminhadas fotos do andamento das obras.

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF ANEL VIÁRIO – ESTUDO EVTEA/EIA/RIMA

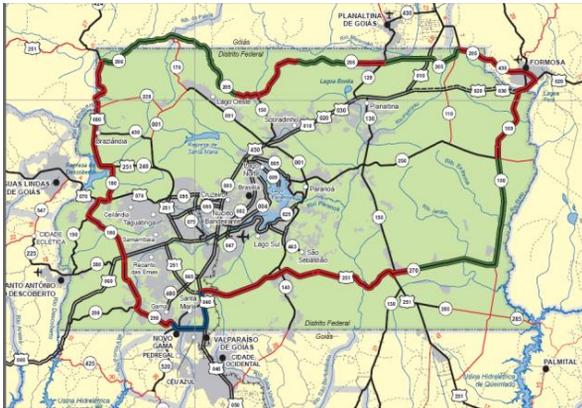

PROGRAMAS DE TRABALHO:  
 26.782.2800.3550.0001 (2011) e  
 26.782.6216.1968.0013(2012), ETAPA 66 SAG  
 RA 99 – TODO O DF  
 Nº DO PROCESSO: 113.002.321/2008  
 Nº DO CONTRATO: 040/2008  
 EMPRESA: STRATA ENGENHARIA LTDA  
 DATA DE INÍCIO: 05/11/2008  
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/10/2012  
 VALOR: R\$ 7.290.752,11  
 RECURSOS: FONTE 100  
 EXECUTOR: ENGº JOSÉ RICARDO ALMEIDA  
 DE BRITO

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Serviços de elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Estudos de Impacto Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA e dos Projetos Executivos de Engenharia das Rodovias integrantes do Anel Viário do Distrito Federal.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**  
 Permanece paralisado.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	0%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

60%	60%	60%	%	%	%
-----	-----	-----	---	---	---

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF ANEL VIÁRIO – ESTUDO EVTEA/EIA/RIMA

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

#### ➤ Comentário do 2º bimestre de 2012:

•Os serviços objeto do Contrato 040/2008 estão paralisados pelo fato dos recursos orçamentários previstos na Lei Orçamentária Anual de 2012 contemplar, na rubrica Estudos e Projetos, o valor de R\$ 3.000.000,00, para custear todos os serviços de estudos e projetos do Departamento, valor insuficiente para concluir sequer os trabalhos do Contrato nº 040/2008. Por isso foi elaborado o Memorando 027/2012 – 3º DR, de 16/01/2012, solicitando definição da Direção sobre os recursos a serem alocados no Contrato. A Direção esta viabilizando junto aos Órgãos competentes a suplementação orçamentária para fazer face às despesas com o referido contrato.

➤ Comentário 4º bimestre de 2012: Foi solicitado no final de agosto a suspensão do contrato nº 040/2008, haja vista que não houve suplementação orçamentária até o momento. O contrato continua paralisado.

➤ Comentário 5º bimestre de 2012: Contrato Suspenso: Décimo Termo Aditivo, publicado no DODF nº 186 de 15/09/2012, página 55 – suspende o prazo do contrato por 90 dias a partir de 24/08/2012.

➤ Comentário 6º bimestre de 2012: Contrato continua suspenso.

➤ Comentário 1º bimestre de 2013: Vigência do contrato expirou em 24/11/2012.

➤ Comentário 2º bimestre de 2013: Vigência do contrato expirou em 24/11/2012. Continua Suspenso.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

➤ 3º bimestre de 2013: Avaliar se ainda há interesse em prosseguir com o contrato e verificar se a vigência pode ser prorrogada.

## PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA DF - 131



**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.1968.0013 (2012)  
**Nº DO PROCESSO:** 113.011.685/2011  
**Nº DO CONTRATO:** 034/2012  
**EMPRESA:** EXTREMA CONSTRUÇÃO LTDA  
**DATA DE INÍCIO:** 25/09/2012  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 31/07/2013  
 (TERCEIRO ADITIVO)  
**VALOR:** R\$ 489.159,33  
**RECURSOS:** FONTE 100  
**EXECUTORA:** ENG<sup>a</sup> ERY DO NASCIMENTO  
 BRANDI DE OLIVEIRA

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Projeto de Engenharia para Pavimentação da DF- 131.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2013:

- Entrega da impressão definitiva do Projeto Básico (30%).
- Avanço Físico Acumulado = 100%

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:

Projeto concluído.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
45 %	30%	%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
70%	100%	%	%	%	%

**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada
  Não Iniciada
  Cancelada
  Andamento Normal
  Atrasada
  Paralisada
  Concluída


**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

- 1º Bimestre: Foi solicitado um aditivo de prazo de 30 dias para a correta finalização e aprovação do Componente Ambiental.
- 2º Bimestre: Foi solicitado o terceiro aditivo de prazo de 30 dias para a correta fiscalização e adequações do projeto de drenagem segundo orientações da ADASA.

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

- 1º Bimestre: Encerramento do contrato para o dia 23/03/2013.
- 2º Bimestre: Encerramento do contrato para o dia 23/05/2013.

**PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE EIA/RIMA, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS ENTRE AS CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E PLANO PILOTO – CORREDOR EIXO NORTE.**

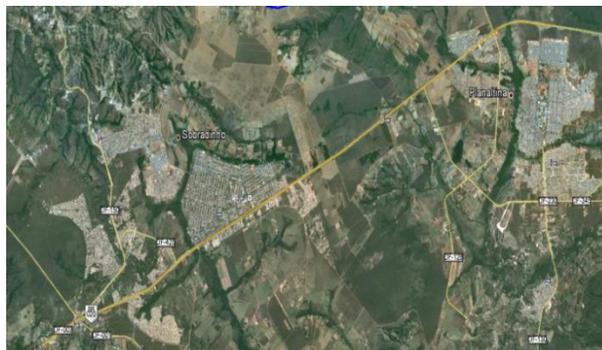

PROGRAMA DE TRABALHO:  
 26.782.6216.1968.0013 (2012)  
 Nº DO PROCESSO: 113.009.340/2011  
 Nº DO CONTRATO: 063/2012  
 EMPRESA: CONSÓRCIO DF INTERLIGADO  
 DATA DE INÍCIO: 26/11/2012  
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2014  
 VALOR: R\$ 12.251.695,70  
 RECURSOS: FONTE 100  
 EXECUTORA: ENGª ERY DO NASCIMENTO BRANDI DE OLIVEIRA

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Projeto Executivo de Engenharia e de EIA/RIMA, destinados à implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto – Corredor Eixo Norte.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2013:**

- Executado 6,13% no bimestre.
- Acumulado Físico total: 25,07%.

Etapas Realizadas:

- Elaboração do projeto do Corredor BRT do Eixo Norte (1,23%)
- Estudo Geológico-geotécnico (0,73%)
- Estudos de Processos Futuros para o ITS (0,95%)
- Relatórios de Acompanhamento 1 e 2 do Estudo Ambiental (3,22%)

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
9,75%	6,13%	%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
18,94%	25,07%	%	%	%	%

**Avanço Físico Acumulado**


A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

**PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE EIA/RIMA, DESTINADOS À  
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS  
ENTRE AS CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E PLANO PILOTO –  
CORREDOR EIXO NORTE.**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## EXECUÇÃO DA OBRA DE AUMENTO DE CAPACIDADE E MELHORAMENTOS NA RODOVIA DF- 047

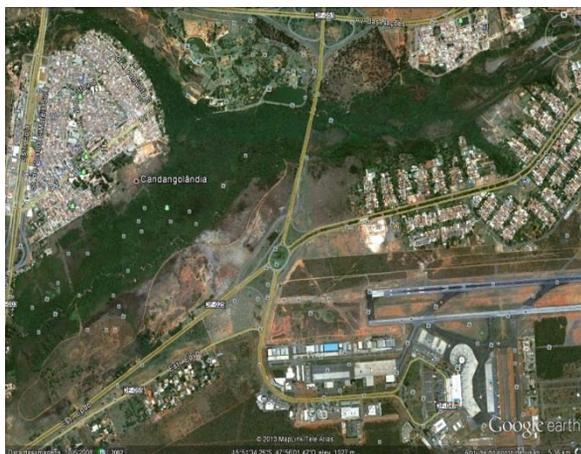

**PROGRAMAS DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.3207.0001 (2012)  
 28.782.6216.3207.0004 (2013)  
**Nº DO PROCESSO:** 113.005.351/2011  
**Nº DO CONTRATO:** 062/2012  
**EMPRESA:** CONSÓRCIO EPAR (TRIER/GEOSONDA/IQS)  
**DATA DE INÍCIO:** 26/11/2012  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 30/06/2014  
**VALOR:** R\$ 43.400.987,10  
**RECURSOS:** FONTE 100, 148, 348  
**EXECUTORES:** ENGº FÁBIO CARDOSO DA SILVA, ENGº GERALDO JACINTO DA SILVA FILHO, ENGº ÁLVARO HOLANDA BOAVISTA (INSTRUÇÃO Nº 198 de 11/12/12).

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Execução da obra de aumento de capacidade e melhoramento na Rodovia DF-047. As obras englobam os serviços de terraplanagem, pavimentação rígida e flexível, drenagem, sinalização, contenção de taludes, obras de arte especiais, obras complementares e de recuperação do meio ambiente.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:

- Executado 2,5 % no bimestre. Acumulado 8,0%.
- Terraplanagem e pavimentação das marginais;
- Drenagem nas marginais;
- Início dos serviços nos pilares centrais da trincheira.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
1%	4,5%	2,5%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

1%	5,5 %	8.0%	%	%	%
----	-------	------	---	---	---

**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

## EXECUÇÃO DA OBRA DE AUMENTO DE CAPACIDADE E MELHORAMENTOS NA RODOVIA DF- 047

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 2º bimestre de 2013:

- Projeto Executivo da trincheira em fase de aprovação pelo DER-DF.
- Projeto Executivo da drenagem em fase de aprovação pelo DER-DF.
- Foram enviadas fotos do andamento da obra.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

➤ 3º bimestre de 2013:

- Trabalhar com equipes em áreas distintas:
  - Drenagem
  - Trincheira
  - Pavimentação das marginais
- Estas ações já estão sendo executadas.

➤ Concentrar o serviço na trincheira.

## EIA/ RIMA PARA O TREVO DE TRIAGEM NORTE



**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.3711.6161 (PRIMEIRO ADITIVO)  
**Nº DO PROCESSO:** 113.005.275/2012  
**Nº DO CONTRATO:** 033/2012  
**EMPRESA:** HIDROLÓGICA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA  
**DATA DE INÍCIO:** 17/09/2012  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 31/10/2013 (QUARTO ADITIVO)  
**VALOR:** R\$ 143.840,94  
**RECURSOS:** FONTE 100  
**EXECUTOR:** ENGº PAULO ROBERTO DA SILVA

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** EIA/ RIMA para o Trevo de Triagem Norte.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**  
 Executado 0% no bimestre. Ritmo lento. Permanece o mesmo patamar de 50% dos serviços realizados até o 2º bimestre de 2013.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	0%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

50%	50%	50%	%	%	%
-----	-----	-----	---	---	---

**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

### **COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

- Os serviços estão divididos em 04 produtos: 1. EIA Versão preliminar; 2. EIA Versão Final; 3. RIMA Versão Preliminar e 4. RIMA Versão Final.
- Os Produtos 1 e 3 (Versões Preliminares do EIA e do RIMA) já foram elaborados e encaminhados ao IBRAM.
- O IBRAM solicitou correções/complementações aos Produtos.
- Os produtos 2 e 4 (Versões Finais - EIA/RIMA) já foram elaborados e encaminhados ao IBRAM.
- Aguardando a manifestação do IBRAM.

### **PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

- Receber a análise do IBRAM para os Produtos Finais e realizar o pagamento final à Empresa contratada.

## ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO TRECHO DA DF-355



PROGRAMA DE TRABALHO:  
26.205.26.782.6216.3711.6161  
Nº DO PROCESSO: 113.008.887/2012  
Nº DO CONTRATO: 009/2013  
EMPRESA: ECOTECH TECNOLOGIA  
AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA  
DATA DE INÍCIO: 25/03/2013  
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2013  
(SEGUNDO ADITIVO)  
VALOR: R\$ 124.937,18  
RECURSOS: FONTE 100  
EXECUTOR: ENGº CARLOS ANGELIM

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Elaboração dos Planos de Controle Ambiental relativos à obra de pavimentação da rodovia DF-355, no trecho compreendido entre a DF-120 e a DF-320 e a obra de pavimentação da Via de Ligação entre a DF-001 (EPCT) e a Vila Basevi, conforme especificações nos anexos do Edital.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**  
Executado 50% no bimestre. Os produtos 1 e 2 (versões preliminares dos estudos ambientais) já foram entregues pela empresa contratada. O produto 1 já foi remetido ao IBRAM para análise e produto 2 devolvido a empresa para correções.

A elaboração dos produtos finais pela empresa somente é possível após a manifestação do órgão ambiental (IBRAM).

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	0%	50%	%	%	%	

%	0%	50%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado
---	----	-----	---	---	---	-------------------------

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída


**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

- A elaboração dos produtos finais pela empresa somente é possível após a manifestação do órgão ambiental (IBRAM).

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

- Após esta manifestação do IBRAM ela será remetida à empresa contratada para a correção nas versões preliminares, realizando assim, a versão final de cada estudo ambiental.

## ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF

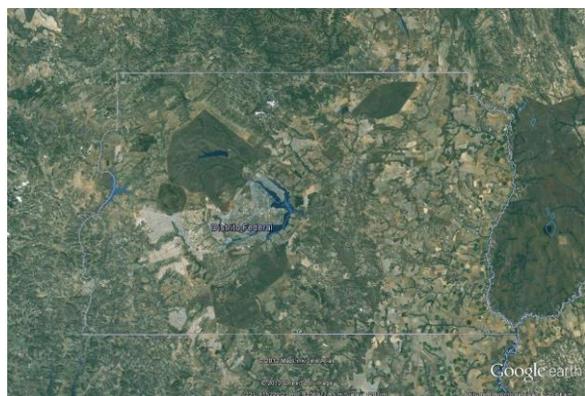

**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.3711.6162 (2013)  
 RA 99 – TODO O DF  
**Nº DO PROCESSO:** 113.005.428/2006  
**Nº DO CONTRATO:** 002/2010  
**FIRMA:** GEO-LÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL  
**INÍCIO DOS SERVIÇOS:** 19/02/2010  
**DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:** 30/09/2013 (QUINTO ADITIVO)  
**VALOR:** R\$ 1.303.632,37  
**RECURSOS:** FONTE 237  
**EXECUTOR:** ENGº PAULO ROBERTO DA SILVA

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central ( DF e Goiás).

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**  
 Executado 0% no bimestre - Ritmo lento. Permanece o mesmo patamar de 60% dos serviços já realizados até o 1º bimestre de 2013.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	0%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

60%	60%	60%	%	%	%
-----	-----	-----	---	---	---

**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

➤ Os serviços estão divididos em 07 fases de trabalho, correspondendo a elaboração de 07 produtos: 1. Plano de Trabalho; 2. Levantamento das Informações; 3. Oficina de Planejamento; 4. Estudo Plano de Manejo; 5. Plano de Manejo Parcial; 6. Oficinas Participativas; 7. Plano de Manejo Final.

➤ Executado 60% dos serviços. Produto 4 aprovado pelo Instituto Chico Mendes e Versão Preliminar do Produto 5 em análise pela Equipe de Supervisão do ICMBio.

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

Aprovar o Produto 5.

# AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO



**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.4195.0001  
 RA 99 – TODO O DF  
 Nº DO PROCESSO: 113.000.727/2012  
 Nº DO CONTRATO: 023/2012  
 EMPRESA: G. B. DA SILVA EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO- EPP  
 INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/07/2012  
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2013  
 VALOR: R\$ 222.949,00  
 RECURSOS: FONTE 100  
 EXECUTOR: ENGº LUIZ GERALDO RANGEL VILELA

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Fornecimento de Asfalto diluído CM-30

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**

Fornecimento de asfalto diluído CM-30 = 82%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
0%	14%	0%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
68%	82%	82 %	%	%	%	

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

## AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO



**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.4195.0001  
 RA 99 – TODO O DF  
 Nº DO PROCESSO: 113.000.727/2012  
 Nº DO CONTRATO: 025/2012  
 EMPRESA: DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A  
 INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/07/2012  
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2013  
 VALOR: R\$ 192.000,00  
 RECURSOS: FONTE 100  
 EXECUTOR: ENGº LUIZ GERALDO RANGEL VILELA

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**

Fornecimento de asfalto diluído RM-1C = 86%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	<b>Avanço Físico Bimestral</b>
32%	34%	0%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	<b>Avanço Físico Acumulado</b>
52%	86%	86%	%	%	%	

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

## **AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

## AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO



**PROGRAMA DE TRABALHO:**  
 26.782.6216.4195.0001  
 RA 99 – TODO O DF  
 Nº DO PROCESSO: 113.000.727/2012  
 Nº DO CONTRATO: 024/2012  
 EMPRESA: CENTRO OESTE ASFALTO LTDA  
 INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/07/2012  
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2013  
 VALOR: R\$ 77.899,80  
 RECURSOS: FONTE 100  
 EXECUTOR: ENGº LUIZ GERALDO RANGEL VILELA

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:**

Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C = 66%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
9%	22%	17%	%	%	%	<b>Avanço Físico Bimestral</b>

27%	49%	66%	%	%	%	<b>Avanço Físico Acumulado</b>
-----	-----	-----	---	---	---	--------------------------------

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

## **AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

## AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO



### PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.4195.0001

Nº DO PROCESSO: 113.007.966/2012

Nº DO CONTRATO: 005/2013

EMPRESA: PETROENGE ENGENHARIA S/A

DATA DE INÍCIO: 19/03/2013

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 18/03/2014

VALOR: R\$ 951.500,00

RECURSOS: FONTE 100

EXECUTOR: ENGº LAURO DE OLIVEIRA

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Fornecimento parcelado de 5.298 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:

O contrato já teve cumprido 55,6% com a entrega de 2.945 toneladas do produto.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	55,6%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	55,6%	%	%	%

**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

## **AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**
