




RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL— 6º Bimestre/2013

SOLUÇÃO INTEGRADA PARA DEPARTAMENTOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

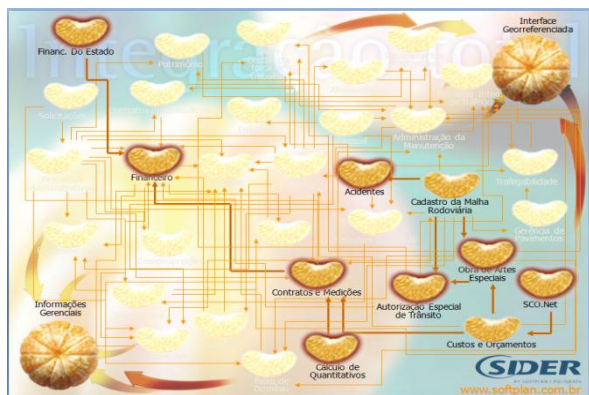

PROGRAMAS DE TRABALHO:

26.122.6010.8517.0006 (2011),

26.122.6010.8517.0014 (2012),

26.122.6010.2557.2569 (2013)

RA 99 – TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 113.000.376/2007

Nº DO CONTRATO: 051/2008

EMPRESA: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA

DATA DE INÍCIO: 01/01/2009

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013

VALOR: R\$ 2.727.734,84 + R\$ 80.660,68 =

R\$ 2.808.395,52 (8º ADITIVO)

RECURSOS: FONTES 100, 237, 300, 220, 420, 437

EXECUTOR: JESSÉ GOUVEIA DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços especializados de engenharia, visando a sistematização de um modelo integrado de gestão, permitindo ao DER-DF alcançar, com base em um banco de dados unificado, melhorias sustentáveis para a gestão de contratos de obras rodoviárias, segurança de trânsito de pessoas e de cargas do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Continua em andamento o Acompanhamento.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%
---	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 5º Bimestre de 2013:

- Contrato renovado até 31/12/2013.
- Principais atividades:

A Consultoria contratada deverá disponibilizar equipe técnica em sua sede para atender ao DER/DF por telefone, faz internet, conexão remota através de modem ou correspondência convencional, prestando serviços para: a) Assistência com análise, diagnóstico e solução de problemas; b) Atendimento às dúvidas sobre as características e utilização das ferramentas e aplicativos de apoio; c) Alterações e implementação de novas funções, consultas e/ou novos relatórios, desde que não caracterize o desenvolvimento de novos módulos ou implique em alterações estruturais no funcionamento do aplicativo.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO




PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6215.2460.0001(2012), etapa 25 SAG
 RA 99 – TODO DF
Nº DO PROCESSO: 113.008.698/2011
CONTRATO: 027/2011
EMPRESA: GRÁFICA E EDITORA
 MOVIMENTO
DATA DE INÍCIO: 19/12/2011
DATA PREVISTA CONCLUSÃO: 18/12/2014
 (SEGUNDO ADITIVO)
VALOR: R\$ 1.700.000,00
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTORA: ELIANE CAVALCANTE SANTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços gráficos e diagramação de campanhas educativas de trânsito e meio ambiente, por meio de confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços gráficos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Nesse bimestre foram gastos nos meses de Nov/Dez R\$ 194.086,54 com serviços gráficos voltados para campanhas educativas. Neste ano foram gastos R\$ 910.565,13 e alcançados 58.084 pessoas entre condutores, pedestres, motociclistas em campanhas educativas. Concluída a etapa de 2013.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 6º Bimestre de 2013: Contrato renovado para o próximo exercício, devendo encerrar-se em 18/12/2014 (DODF nº 266, 13/12/2013).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO TIPO TALÃO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.2541.0001 (2013)

RA 99 – TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 113.006353/2010

Nº DO CONTRATO: 031/2010

EMPRESA: ENGEBRÁS S/A INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 07/12/2010

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 25/06/2014
(NONO ADITIVO)

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 642.951,60

RECURSOS: FONTE 237


EXECUTOR: ISAIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Locação de 50 (cinquenta) equipamentos eletrônicos do tipo Talão para captura e registro eletrônico de infrações de trânsito.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

➤ Em 2013 já foi pago: R\$ 53.579,30 (jan/13) + R\$ 53.579,30 (fev/13) + R\$ 53.579,30 (março/12) + R\$ 53.579,30 (abr/13) + R\$ 53.579,30 (mai/13) + R\$ 53.579,30 (jun/13) + R\$ 53.579,30 (jul/13) + R\$ 53.579,30 (ago/13) + R\$ 53.579,30 (set/13) + R\$ 53.579,30 (out/13) + R\$ 53.579,30 (nov/2013) + R\$ 53.579,30 (dez/13). **Totalizando = R\$ 642.951,60 no ano de 2013.**

➤ O contrato foi prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 29/05/2013.



Avanço Físico Bimestral



% Acumulativo Executado dos Serviços

■ A Ser Iniciada ■ Não Iniciada ■ Cancelada ■ Andamento Normal ■ Atrasada ■ Paralisada ■ Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- A paralisação do presente contrato deve-se à necessidade de obtenção de dados on-line que alimentarão a base de consulta para o registro eletrônico de infrações de Trânsito. Estes dados são obtidos junto ao DETRAN/DF, órgão detentor dos registros relacionados aos veículos e condutores, no âmbito do DF.
- Até o momento, estes dados ainda não foram repassados pelo DETRAN/DF. O DER/DF tem realizado consultas sistemáticas junto ao DETRAN/DF para a obtenção desses dados (ofícios, e-mails, telefonemas, reuniões).
- Comentário 4º bimestre/2012: Fica reativado o contrato a partir de 03 de outubro de 2012, ficando inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato nº 31/2012.
- Nono Termo Aditivo (DODF nº 118 de 11/06/2013): O valor estimado para o próximo período é de R\$ 642.951,60.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6215.2541.0001
Nº DO PROCESSO: 113.001.225/2008
Nº DO CONTRATO: 028/2011
EMPRESA: ENGEBRÁS S/A INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA
DATA DE INÍCIO: 23/12/2011
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2014
VALOR: R\$ 21.979.430,01 + R\$ 1.187.120,00
(TERCEIRO ADITIVO) = R\$ 23.166.550,01
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTOR: ENG.º MURILO DE MELO
SANTOS

DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO: Monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
Executado 17% no bimestre. Acumulado 100% no ano. Contrato em ritmo normal. Concluída a etapa de 2013.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	16,6%	16,6 %	16,6%	16,6%	17%

Avanço Físico Bimestral

16,6%	33,2%	49,8%	66,4%	83%	100%
-------	-------	-------	-------	-----	------

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

Trata-se de serviço de natureza contínua.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP

3aisStacks



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.2541.0001

Nº DO PROCESSO: 113.010.751/2011

Nº DO CONTRATO: 018/2012

EMPRESA: LIG MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

DATA DE INÍCIO: 06/06/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 05/06/2014
(PRIMEIRO ADITIVO)

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 147.696,00 + R\$ 26.263,00 (PRIMEIRO ADITIVO) = R\$ 173.959,00

RECURSOS: FONTE 237

EXECUTOR: ISAIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Locação de 60 equipamentos de Rádio Comunicação e 02 (dois) Fixos (estação Rádio Base).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

➤ Até hoje, já foi pago R\$ 3.360,00 (jun/12 – habilitação dos rádios) + R\$ 1.202,80 (locação jun/12) + R\$ 12.028,00 (jul/12) + R\$ 12.028,00 (ago/12) + R\$ 12.028,00 (set/12) + R\$ 12.028,00 (out/12) + R\$ 12.028,00 (nov/12) + R\$ 12.028,00 (dez/12), + R\$ 12.028,00 (jan/13) + R\$ 12.028,00 (fev/13) + R\$ 12.028,00 (março/13) + R\$ 12.028,00 (abril/13) + R\$ 12.028,00 (maio/13), + R\$ 14.461,34 (jun/13) + R\$ 14.162,00 (jul/13) + R\$ 14.162,00 (ago/13) + R\$ 14.162,00 (set/13) + R\$ 14.162,00 (out/13), + R\$ 14.461,34 (nov/13), + R\$ 14.461,34 (dez/13) totalizando R\$ 76.730,80 (ano 2012) + R\$ 146.024,18 (ano/2013) – TOTAL GERAL = R\$ 222.754,98.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%
---	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.2541.0001

Nº DO PROCESSO: 054.001403/2011

Nº DO CONVÊNIO: 001/2012

CONVENIADO: POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DATA DE INÍCIO: 11/05/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 11/05/2014

RECURSOS: FONTES 237, 437

EXECUTOR: ENGº MURILO DE MELO SANTOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Executado 17% no bimestre. Acumulado 100%. Contrato em ritmo normal. Concluída a etapa de 2013.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	17%

Avanço Físico Bimestral

16,6%	33,2%	49,8%	66,4%	83%	100%
-------	-------	-------	-------	-----	------

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

**FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF,
SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS



DETRAN-DF

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO DISTRITO FEDERAL



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.2541.0001

Nº DO PROCESSO: 113.007.132/2008

Nº DO CONVÊNIO: 001/2010

CONVENIADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN/DF

DATA DE INÍCIO: 03/12/2010

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 28/05/2014
(TERCEIRO ADITIVO)



RECURSOS: FONTES 100 E 237

EXECUTOR: ENGº MURILO DE MELO SANTOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: O presente Convênio tem por objetivo reduzir os níveis de acidentes nas vias urbanas e rurais do DF, tendo por objeto a delegação entre os convenientes da competência para lavratura do auto de infração de trânsito, nos limites das condições e circunstâncias fixadas neste instrumento, bem assim a cooperação mútua para a execução das seguintes atividades: Processamento de Dados, Engenharia de Tráfego, Educação no Trânsito, estatística, Monitoramento Aéreo.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Executado 17% no bimestre. Acumulado 100%. Contrato em ritmo normal. Concluída a etapa de 2013.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

**PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO,
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE
ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 6º Bimestre de 2013:

- Prorrogação do prazo de prestação dos serviços por 180 dias, devendo encerrar-se 28/05/2014 (DODF nº 260 de 06/12/2013).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF




PROGRAMAS DE TRABALHO:

26.782.2800.2904.0001 (2011) e
 26.782.6215.2904.0001 (2012), ETAPA 29 SAG
 RA 99 – TODO DF
 Nº DO PROCESSO: 113.005.681/2010
 Nº DO CONTRATO: 011/2011
 EMPRESA: HOT COZINHA INDUSTRIAL
 DATA DE INÍCIO: MARÇO/ 2011
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2014
 (TERCEIRO ADITIVO)
 VALOR: R\$ 152.496,00
 RECURSOS: FONTE 237
 EXECUTORA: ELIANE CAVALCANTE SANTOS


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Lanche para as crianças das Escolas Públicas, que são levadas nos períodos matutino e vespertino, no Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o Trânsito, para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Nos meses de nov/dez foram atendidas 11.227 crianças na Transitolândia e nas escolas em atividades externas, sendo fornecidos 1.167 lanches e gastos R\$ 4.123,04. Neste ano foram atendidas pela escola 53.065 crianças em atividades externas incluindo o evento “Junto de Você” do GDF. Foram gastos com lanche em 2013 o total de R\$ 35.837,98. Concluída a etapa de 2013.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ Terceiro aditivo (DODF nº 118 de 11/06/2013): O valor estimado para o próximo período é de R\$ 152.496,00.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.3209.0001

Nº DO PROCESSO: 113.000.076/2013

Nº DO CONTRATO: 018/2013

EMPRESA: SITRAN-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETÔNICA LTDA

DATA DE INÍCIO: 03/06/2013

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 11/05/2014 (PRIMEIRO ADITIVO)

VALOR: R\$ 838.882,14



RECURSOS: FONTE 237

EXECUTOR: ENGº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de sinalização para orientação de destino específica para eventos do Comitê organizador da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Permanece posição do 5º bimestre. Acumulado 86%. Suspensão dos serviços: Primeiro Termo aditivo - Suspensão da execução dos serviços a partir de 12/07/2013, devendo encerrar-se em 11/05/2014 (DODF nº 157, de 01/08/2013), motivo: as rodovias DF-047; DF-003; DF-025; DF-065 e DF-480; 17 semipórticos não puderam ser instalados, porque modificações estão sendo realizadas nas faixas lindeiras destas rodovias como parte de obras de adequação.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 3º Bimestre: Providenciando medição dos serviços executados.

➤ 4º Bimestre: Primeiro Termo aditivo - Suspensão da execução dos serviços a partir de 12/07/2013, devendo encerrar-se em 11/05/2014 (DODF nº 157, de 01/08/2013).

- Aguardando publicação do 2º termo aditivo - correção da data do início do contrato para 03/06/2013 e não 30/05/2013. Quando reativar o contrato.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Aguardar o final da paralisação.

SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE TRAVESSIA DE ANIMAIS SILVESTRES



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.3209.0001

Nº DO PROCESSO: 113.003.307/2011

Nº DO CONTRATO: 022/2013

EMPRESA: SITRAN-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETROÔNICA LTDA

DATA DE INÍCIO: 28/06/2013 (PRIMEIRO ADITIVO)

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/10/2013 (PRIMEIRO ADITIVO)

VALOR: R\$ 84.476,66



RECURSOS: FONTE 237

EXECUTOR: ENGº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de sinalização de advertência de animais silvestres na DF-001 (EPCT) e BR-450/DF-003 (EPIA), em torno do Parque Nacional de Brasília (PNB).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2013:

Já foi realizada a medição final (R\$ 70.554,18) correspondente a 83,51% do valor total do contrato. Obra concluída com 83,51% do Contrato. Obra concluída em 2013.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE TRAVESSIA DE ANIMAIS SILVESTRES

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ Obra concluída com 83,51% do Contrato. A empresa SITRAN realizou todo o serviço solicitado.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:


SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VÁRIOS TRECHOS DE RODOVIAS DO SRDF



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6215.4197.0001(2012)
Nº DO PROCESSO: 113.007.600/2011
Nº DO CONTRATO: 013/2012
EMPRESA: SITRAN – COMÉRCIO E
 INDÚDTRIA DE ELETRÔNICA LTDA.
DATA DE INÍCIO: 15/05/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 29/10/2013
 (QUARTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 9.201.943,03 + R\$ 2.235.918,41
 (SEGUNDO ADITIVO) = R\$ 11.437.861,44
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTOR: ENGº GUILHERME JOSÉ DA
 FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA: Sinalização Horizontal em vários trechos de rodovias do SRDF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Permanece mesma posição do 5º bimestre. Serviço Concluído. Processo encaminhado para PROJUR DER/DF para promover as medidas necessária (judiciais) para ressarcimento de valores ditos como não devidos pelo TCDF. Aguardando Decisão.

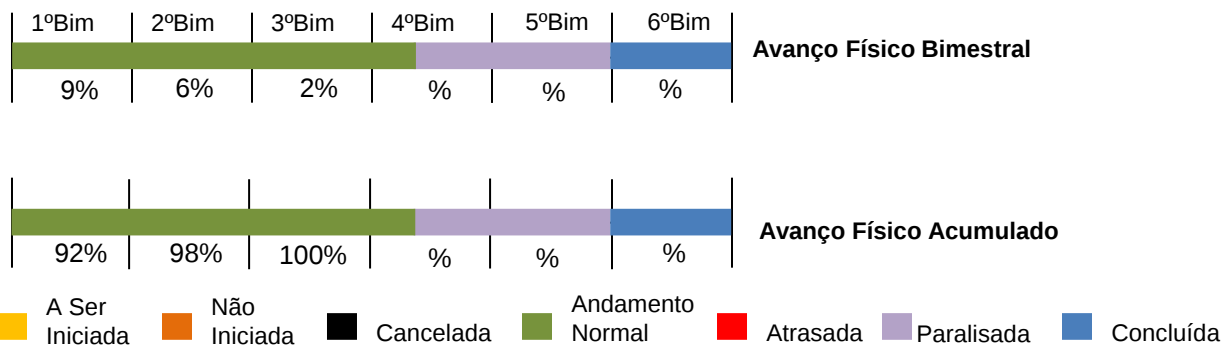

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VÁRIOS TRECHOS DE RODOVIAS DO SRDF

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 1º Bimestre de 2013: Solicitado a prorrogação de prazo de execução dos serviços por mais 30 dias tendo em vista o período chuvoso e suas consequências que impediram a aplicação de material termoplástico extrudado e hot-spray, dificultando a execução dos serviços.
- 3º Bimestre: Em 22/05/2013 foi encaminhado pelo Executor do contrato ao Superintendente de Obras /DER/DF a Decisão nº 6225/2012 do TCDF e solicitado manifestação da PROJUR, da SUAFIN, da SUTEC para aplicação dos preços do sistema SICRO 2 do DNIT, pois o Executor não pode alterar qualquer cláusula para readequação do contrato sem a anuência do ordenador de despesa.
- 4º Bimestre: Quarto Termo Aditivo- Suspende a vigência contratual por 90 dias, devendo encerrar-se em 29/10/2013 (DODF nº 157, de 01/08/2013).
- 5º bimestre : Serviços concluídos. Encaminhado para PROJUR DER/DF para promover as medidas necessária (judiciais) para ressarcimento de valores ditos como não devidos pelo TCDF

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6515.4198.0001

Nº DO PROCESSO: 113.004.476/2006

Nº DO CONTRATO: 020/2008

EMPRESA: SITRAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETÔNICA LTDA.

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 01/08/2008

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 01/08/2014
(SEXTO ADITIVO)

VALOR: R\$ 2.105.493,13 (INICIAL)

RECURSOS: FONTE 237

EXECUTOR: ENGº CARLOS ALBERTO
MUNDIM PENA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Manutenção preventiva dos equipamentos do sistema semafórico operado pelo DER/DF. Concorrência nº 01/2007.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Executado 17% no bimestre. Acumulado 100% no ano. Contrato em ritmo normal. Concluída a etapa de 2013.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	17%

Avanço Físico Bimestral

16,6%	33,2%	49,8%	66,4%	83%	100%
-------	-------	-------	-------	-----	------

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ Trata-se de serviço de natureza contínua.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-095 (EPCL)



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1347.9481 (2012)
 Nº DO PROCESSO: 113.006.748/2011
 Nº DO CONTRATO: 007/2012
 EMPRESA: AJL ENGENHARIA E
 CONSTRUÇÕES LTDA.
 DATA DE INÍCIO: 03/05/2012
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/03/2013
 (QUARTO ADITIVO).
 VALOR: R\$ 1.643.903,83
 RECURSOS: FONTE 100
 EXECUTOR: ENGº ANTÔNIO GOMES DA
 SILVA FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de Passarela em estrutura mista na Rodovia DF-095 (EPCL), Trecho DF-003(EPIA) e DF-097 (EPAC), próximo ao Ceasa.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2013:
 Medição Final já foi paga. Concluída a obra e o contrato.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
10%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Bimestral

100%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-095
(EPCL)**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:



CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-001 (EPCT), TRECHO ENTRONC. BR-060 E A DF-075, PRÓXIMO A 1ª AVENIDA



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1347.9481 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.005.702/2011
Nº DO CONTRATO: 008/2012
EMPRESA: RIO PLATENSE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 03/05/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/01/2013
VALOR: R\$ 1.218.484,17
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº ANTÔNIO GOMES DA SILVA FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de Passarela em estrutura mista na Rodovia DF-001 (EPCT), Trecho: Entroncamento da BR-060 a DF-075 (EPNB), próximo à 1ª Avenida.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2013:
 Acumulado 100%. Concluída a obra e o contrato.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-001
(EPCT), TRECHO: ENTRONC. BR-060 E A DF-075, PRÓXIMO A 1ª AVENIDA**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA RODOVIA DF-075 (EPNB), TRECHO ENTRE A DF-003 E A DF-079 (UPA).



PROGRAMAS DE TRABALHO:
 26.782.6216.1347.9481
Nº DO PROCESSO: 113.007.989/2012
Nº DO CONTRATO: 020/2013
EMPRESA: RIO PLATENSE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 26/06/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/04/2014 (SEGUNDO ADITIVO)
VALOR: R\$ 1.898.558,31
RECURSOS: FONTE 348
EXECUTORA: ENG^a MARIA LUZIA FERREIRA BORGES

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração projeto de construção de passarela na Rodovia DF-075 (EPNB), entroncamento com a DF-003 e a DF-079.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Executado 65% no bimestre. Acumulado 78,6%. Os serviços executados foram: fundações (estacas, blocos, cintas), concreto aparente (lajes, vigas e pilares em concreto armado).

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	1,1%	12,5%	65%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	1,1%	13,6%	78,6%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA RODOVIA DF-075 (EPNB), TRECHO ENTRE A DF-003 E A DF-079 (UPA).

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 4º Bimestre de 2013: A obra teve início em 06/08/2013, em consequência do recebimento da IS nº 007/2013.
- 5º Bimestre de 2013: Os serviços estão atrasados em consequência das interferências de redes de alta tensão. A CEB concluiu a remoção das referidas redes em 25/10/2013.
- 6º Bimestre de 2013: Prorrogação do prazo de execução por 90 dias (DODF nº 276, 24/12/2013).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- Aguardando a apresentação do novo cronograma da empresa contratada.

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA DF-001 (EPCT), TRECHO BR-060 E VC-331



PROGRAMAS DE TRABALHO:

26.782.6216.1347.9481

Nº DO PROCESSO: 113.005.703/2011

Nº DO CONTRATO: 032/2013

EMPRESA: CCL CONSTRUTORA LTDA

DATA DE INÍCIO: 03/09/2013

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 14/02/2014

VALOR: R\$ 1.148.241,80

RECURSOS: FONTE 100

EXECUTOR: PAULO ROBERT SANTOS MACHADO

DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de Obra de Arte Especial do tipo Passarela em estrutura mista em arco na DF-001, tr. BR-060 e VC-331/ Recanto das Emas.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Execução 15% no bimestre. Acumulado 20%. Conclusão da fundação e blocos e conclusão do canteiro de obras.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	5%	15%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	5%	20%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA DF-001 (EPCT), TRECHO BR-060 E VC-331

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 5º Bimestre: Interferência de rede elétrica no local da passarela, atrapalhando o início dos serviços.
- 6º Bimestre: Conclusão da fundação e blocos e conclusão do canteiro de obras.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- Remanejar rede elétrica;
- Execução da fundação e infraestrutura.

PAVIMENTAÇÃO VC-533, LIGAÇÃO DE BRAZLÂNDIA A PADRE LÚCIO



PROGRAMAS DE TRABALHO:
 28.782.6216.1475.1199
Nº DO PROCESSO: 113.005.439/2012
Nº DO CONTRATO: 039/2013
EMPRESA: NG ENGENHARIA E
 CONSTRUÇÕES LTDA
DATA DE INÍCIO: 22/11/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 150 DIAS
VALOR: R\$ 5.405.070,40
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº ELI CÂMARA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de obras para pavimentação de toda a extensão da rodovia vicinal VC-533, além de implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre o seu entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF/180 e a divisa com estado do Goiás (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio). Cc nº 005/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Assinatura do Contrato e início da obra.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

PAVIMENTAÇÃO VC-533, LIGAÇÃO DE BRAZLÂNDIA A PADRE LÚCIO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:



VIADUTO ENGENHO DAS LAGES, TRECHO ENTRONC. BR-060 COM A DF-290



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.0011(2012)
Nº DO PROCESSO: 113.010.021/2009
Nº DO CONTRATO: 017/2012
EMPRESA: ETEC-EMPREENDEIMENTOS
 TÉC.DE ENG^a E COMÉRCIO LTDA
DATA DE INÍCIO: 01/06/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 28/07/2013
 (QUARTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 7.266.888,31
RECURSOS: FONTES 231 e 348
EXECUTOR: ENGº SAMUEL DIAS JÚNIOR

DESCRIÇÃO DA OBRA: Viaduto do Engenho das Lages, obras de finalização de implantação do entroncamento da BR-060 com a DF-290.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:
 Contrato concluído.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

VIADUTO ENGENHO DAS LAGES, TRECHO ENTRONC. BR-060 COM A DF-290

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:



PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO: DF-410/DF-345, PLANALTINA - LOTE 1



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.0027 (2013),
 26.782.6216.1475.1199 (2013)
Nº DO PROCESSO: 113.010.929/2011
Nº DO CONTRATO: 006/2013
EMPRESA: TRIER ENGENHARIA LTDA.
DATA DE INÍCIO: 20/03/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013
(TERCEIRO ADITIVO)
VALOR: R\$ 3.130.103,78
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº PAULO ROBERT SANTOS MACHADO

DESCRIÇÃO DA OBRA: Pavimentação da DF-230 no trecho compreendido entre seu entroncamento com a DF-345 até o entroncamento com a DF-410, identificado como LOTE 1 (km 10,20 ao km 13,50, da estaca 85 a estaca 250). As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização. Extensão de Pavimentação: 3.300,00 m (conforme dados do Edital de Concorrência nº 006/2012).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Executado 5% no bimestre. Acumulado 100%. Conclusão total dos serviços em 2013.



A Ser Iniciada Não Iniciada Cancelada Andamento Normal Atrasada Paralisada Concluída

PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO DF-410/ DF-345 PLANALTINA- LOTE 1

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 2º Bimestre: Início dos serviços de drenagem a partir do 3º bimestre.
- 3º Bimestre: Início dos serviços de limpeza e terraplenagem.
- 5º Bimestre: Conclusão da terraplenagem e 90% da pavimentação.
- 6º Bimestre: Conclusão da pavimentação, sinalização, drenagem – 100% da obra concluída.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO DF-410/ DF-345 PLANALTINA- LOTE 2



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.0027(2013) ,
 26.782.6216.1475.1199 (2013)
 Nº DO PROCESSO: 113.000.768/2013
 Nº DO CONTRATO: 007/2013
 EMPRESA: TRIER ENGENHARIA LTDA .
 DATA DE INÍCIO: 20/03/2013
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013
 (TERCEIRO ADITIVO)
 VALOR: R\$ 6.132.454,62
 RECURSOS: FONTE 100
 EXECUTOR: ENGº PAULO ROBERT SANTOS
 MACHADO

DESCRIÇÃO DA OBRA: Pavimentação da DF-230 no trecho compreendido entre seu entroncamento com a DF-345 até o entroncamento com a DF-410, identificado como LOTE 2 (km. 13,50 ao km. 19,10), até o asfalto existente (da estaca 250 a estaca 530). As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização. Extensão de Pavimentação: 5.600,00 m. (Conforme dados do Edital de Concorrência nº 006/2012).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Executado 2% no bimestre. Acumulado 92%. Conclusão da pavimentação e sinalização. Em andamento.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	17%	50%	23%	2%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	17%	67%	90%	92%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO: DF-410/DF-345, PLANALTINA - LOTE 2

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 2º Bimestre: Início dos serviços de drenagem.
- 4º Bimestre: Conclusão da limpeza superficial.
- 5º Bimestre: Conclusão da terraplenagem e drenagem profunda.
- 6º Bimestre: Conclusão da pavimentação e sinalização.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- Conclusão dos serviços de pavimentação e sinalização.


**CONSTRUÇÃO DE ACESSO (AGULHA) à DF-003 (EPIA), TRECHO DF-095/DF-010,
COM IMPLANTAÇÃO DE BAIA DE PARADA DE ÔNIBUS E REMANEJAMENTO DO
ABRIGO EXISTENTE.**




PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.1199 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.010.786/2010
Nº DO CONTRATO: 028/2012
EMPRESA: CRC – CONSTRUTORA
 RODRIGUES CAMPOS LTDA
DATA DE INÍCIO: 09/08/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/09/2013
 (QUARTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 199.873,17 + R\$ 49.485,92 = R\$
 249.359,09 (QUINTO ADITIVO)
RECURSOS: FONTE 348
EXECUTOR: ENGº SAMUEL DIAS JÚNIOR

DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de acesso (Agulha) à DF-003 (EPIA), trecho DF-095/DF-010, com implantação de baia de parada de ônibus e remanejamento do abrigo existente.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:
 Contrato concluído.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado


■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

**CONSTRUÇÃO DE ACESSO (AGULHA) à DF-003 (EPIA), TRECHO DF-095/DF-010,
COM IMPLANTAÇÃO DE BAIA DE PARADA DE ONIBUS E REMANEJAMENTO DO
ABRIGO EXISTENTE.**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

DUPLICAÇÃO DF-451

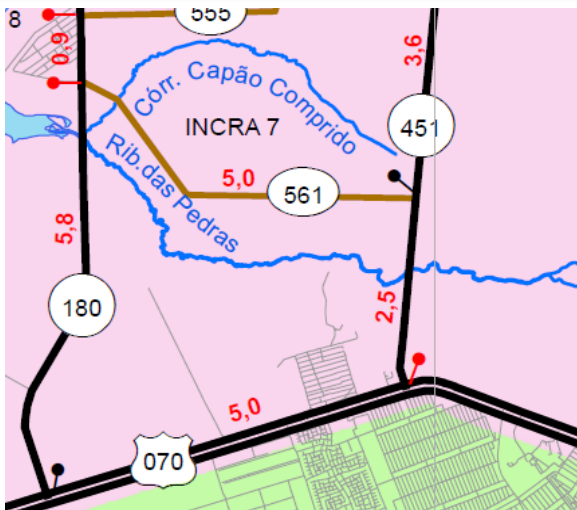

PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.1475.1199

Nº DO PROCESSO: 113.000.292/2013

Nº DO CONTRATO: 017/2013

EMPRESA: GW CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA

DATA DE INÍCIO: 07/05/2013

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/01/2014
(QUARTO ADITIVO)

VALOR: R\$ 1.588.056,20

RECURSOS: FONTE 100

EXECUTOR: ENGº ELI CÂMARA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Duplicação de 1,39 km da Rodovia DF-451, no trecho compreendido do entroncamento da Rodovia BR-070 ao entroncamento da Rodovia Vicinal - VC-561. Concorrência nº 001/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Executado 30% no bimestre. Acumulado 100%. Conclusão da obra em 2013. Foram feitos os seguintes serviços:

- Terraplenagem;
- Drenagem superficial;
- Pavimentação.
- Sinalização

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	42%	28%	30%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	42%	70%	100%
---	---	---	-----	-----	------

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

DUPLICAÇÃO DF-451

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PAVIMENTAÇÃO VIA DE ACESSO A VILA BASEVI E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA.



PROGRAMAS DE TRABALHO:

26.782.6216.1475.4734 (2012)

26.782.6216.1475.1199 (2013)

Nº DO PROCESSO: 113.009.410/2009

Nº DO CONTRATO: 061/2012 - DIVAL

ENGENHARIA LTDA (CANCELADO)

NOVO CONTRATO: 023/2013 - SETA SERVIÇOS

DE ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E

ADMINISTRAÇÃO LTDA

DATA DE INÍCIO: 12/07/2013

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/01/2014

VALOR: R\$ 1.732.147,49 + 413.252,53 (SEGUNDO ADITIVO)



RECURSOS: FONTE 100

EXECUTOR: ENGº BRUNO SOUSA ALMEIDA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Pavimentação via de acesso a Vila Basevi e implantação de ciclovia.
Concorrência Nº 003/2012.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Executado 1% no bimestre. Acumulado 99%. Conclusão dos serviços de drenagem; Início das obras complementares (plantio de mudas). Andamento normal.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO VIA DE ACESSO A VILA BASEVI E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA.

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤1º Bimestre de 2013: A Superintendência de Obras está a par da inexecução parcial da obra da Vila Basevi, mesmo tendo enviado diversas cartas cobrando celeridade da empresa (DIVAL ENGENHARIA LTDA), a contratada não retornou os serviços, estando a obra paralisada.

➤2º Bimestre de 2013: A contratada ((DIVAL ENGENHARIA LTDA)) retomou os serviços de terraplenagem após cobrança da Superintendência de Obras e da fiscalização.

- A empresa ((DIVAL ENGENHARIA LTDA))deverá apresentar ao DER qual será o novo plano de ação, uma vez que até a presente data só executou a limpeza parcial e parte do rebaixo do sub leito.

- O contrato da empresa expira em 20/03/2013 e a fiscalização informa que a empresa Dival Engenharia não deverá terminar o contrato e a obra, estando passível de sanções conforme o contrato assinado.

➤3º Bimestre de 2013: Contrato Rescindido com a DIVAL em 21/06/2013 (DODF Nº 133 de 28/06/2013).

➤4º Bimestre de 2013: Assinatura do novo contrato (023/2013) com a 2ª colocada no processo licitatório - SETA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E ADMINISTRAÇÃO LTDA.


➤6º Bimestre de 2013:

- Conclusão dos serviços de drenagem;
- Início das obras complementares (plantio de mudas).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

➤ Continuação dos serviços de obras complementares (plantio de grama e mudas de árvores).

RESTAURAÇÃO DA DF-345

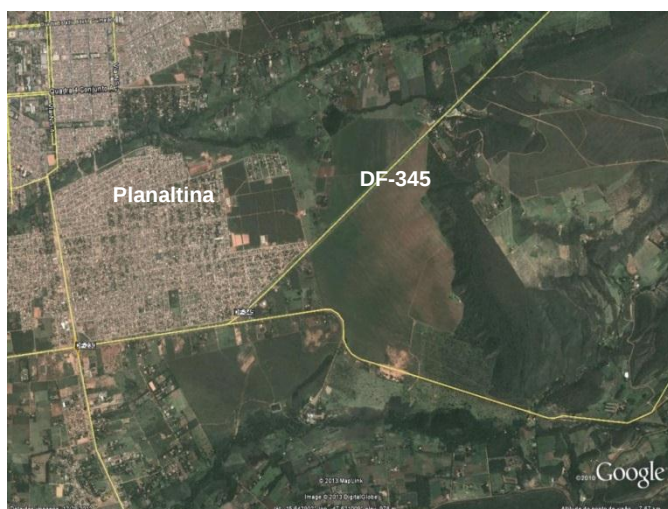

PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.3515
Nº DO PROCESSO: 113.008.569/2012
Nº DO CONTRATO: 035/2013
EMPRESA: JM TERRAPLENAGEM E
CONSTRUÇÕES LTDA
DATA DE INÍCIO: 11/10/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 180 DIAS
VALOR: R\$ 6.823.971,05
RECURSOS: 348
EXECUTORA: ENG^a MARIA LUZIA
FERREIRA BORGES

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da DF-345 e implantação das interseções desta com as rodovias DF-205 e VC-111 no trecho compreendido do entroncamento com a BR-010 (A)/Divisa GO/DF ao entroncamento com a BR-020, com extensão de 11 km.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Executado 9% no bimestre. Foram feitos os seguintes serviços: retirada da capa asfáltica existente, execução de base com adição de cimento, imprimação, execução da camada anti-trinca, banho de ligação e colocação da camada de "BINDER". Estes serviços foram realizados na extensão de 999,0 m.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	0%	9%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	0%	9%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

RESTAURAÇÃO DA DF-345


COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ Como estamos em um período de chuva, os serviços estão praticamente parados, não tendo a firma condições de trabalho, pois os serviços contratados de restauração e execução de inserções só poderão ser executados com tempo firme, face ao problema de excesso de umidade.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

➤ A expectativa é de ser executado pelo menos 70% da restauração da pista, como também a execução de 50% da implantação das interseções, caso o período de chuva permita os trabalhos.

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 1

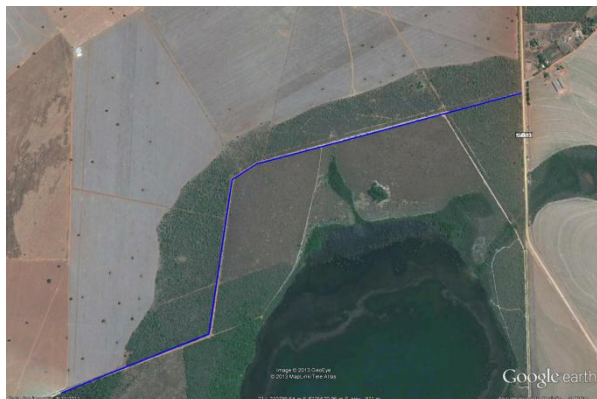

PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.005.389/2011
Nº DO CONTRATO: 053/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E
 CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 16/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 28/02/2014
 (SEXTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 2.687.681,33 + R\$ 635.554,67
 (SÉTIMO ADITIVO)
RECURSOS: FONTE 148
EXECUTOR: ENGº BRUNO SOUSA ALMEIDA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF-355 no trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Entroncamento da DF-120 (estaca 0) até a estaca 3 + 480 - Lote 1.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Executado 2% no bimestre. Acumulado 92%. Finalização da imprimação e pintura de ligação; Conclusão da execução da capa asfáltica; Inicialização dos serviços de valatas e sarjetas de concreto.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
2%	10%	38%	35%	5%	2%

Avanço Físico Bimestral

2%	12%	50%	85%	90%	92%
----	-----	-----	-----	-----	-----

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 1

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 1º Bimestre:

- O empenho só saiu no final do 1º bimestre e a empresa contratada imediatamente iniciou os serviços de terraplenagem.
- Rebaixo e regularização do sub-leito
- Serviços de terraplanagem
- Encabeçamento da ponte
- Execução dos serviços de drenagem
- Instalação do caminho de serviço
- Todos os serviços do bimestre anterior foram praticamente concluídos.

➤ 2º Bimestre:

- Inicialização do reforço do sub-leito em solo cal.
- Inicialização e término da sub-base em solo cal.
- Término do encabeçamento da ponte

➤ 6º Bimestre:

- Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 53 dias, devendo expirar-se em 31/01/2014 e estende a vigência contratual para 28/02/2014 (DODF nº 260 de 06/12/2013).
- Finalização da imprimação e pintura de ligação;
- Conclusão da execução da capa asfáltica;
- Inicialização dos serviços de valatas e sarjetas de concreto.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- Início e término das obras complementares (defensas metálicas semi-flexíveis);
- Início e término do serviço de sinalização:
 - Sinalização vertical;
 - Tachas mono e bidirecionais;
 - Sinalização horizontal
- Assentamento de meios-fios padrão Novacap.

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 2



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.1475.3517 (2012)

Nº DO PROCESSO: 113.001.123/2013

(PROC. ORIGINAL 113.005.389/2011)

Nº DO CONTRATO: 053/2012

EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E
CONSTRUÇÃO LTDA

DATA DE INÍCIO: 16/10/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 28/02/2014

(SEXTO ADITIVO)

VALOR: R\$ 2.604.238,43+ R\$ 515.237,37
(SÉTIMO ADITIVO)



RECURSOS: FONTE 148

EXECUTOR: ENGº BRUNO SOUSA ALMEIDA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF-355 no trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Entroncamento da estaca 3 + 480 até a estaca 6+960 – Lote 2.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Executado 2% no bimestre. Acumulado 84%. Continuação lenta do serviço de base em brita graduada; Continuação do serviço de imprimação e pintura de ligação.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 2

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 1º Bimestre:

- O empenho só saiu no final do 1º bimestre.
- Término do serviço de limpeza
- Execução dos caminhos de serviço
- Execução da drenagem
- Serviço de terraplanagem
- Rebaixo do sub leito

➤ 2º Bimestre

- Finalizar os serviços de terraplenagem e dos dispositivos de drenagem
- Inicializar os serviços para o reforço do sub-leito em solo cdl
- Inicializar os serviços para instalação da sub-base em solo cdl.

➤ 6º Bimestre:

- Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 53 dias, devendo expirar-se em 31/01/2014 e estende a vigência contratual para 28/02/2014 (DODF nº 260 de 06/12/2013).
- Continuação lenta do serviço de base em brita graduada
- Continuação do serviço de imprimação e pintura de ligação

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- Conclusão da base em brita graduada simples
- Conclusão da imprimação e pintura de ligação
- Conclusão do serviço de execução de capa asfáltica
- Início e término do serviço de sinalização:
 - Sinalização vertical
 - Sinalização horizontal
 - Implantação de taxas mono e bidirecionais
- Assentamento de meio-fio pré moldado padrão Novacap.

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 3



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.1475.3517 (2012)

Nº DO PROCESSO: 113.001.124/2013

(PROC. ORIGINAL 113.005.389/2011)

Nº DO CONTRATO: 053/2012

EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E
CONSTRUÇÃO LTDA

DATA DE INÍCIO: 16/10/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 28/02/2014
(QUARTO ADITIVO)

VALOR: R\$ 2.560.770,55 + R\$ 633.532,55

(QUINTO ADITIVO)



RECURSOS: FONTE 348

EXECUTOR: ENGº GUILHERME JOSÉ DA
FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF-355 no trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Entroncamento da estaca 6 + 960 até a estaca 10 + 440 – Lote 3.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Avanço bimestre: 4%. Acumulado: 99%. Executado os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, imprimação e concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 3

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 3º Bimestre: Questionamento técnicos relativo a execução dos serviços foram respondidos em junho 2013 pela SUTEC o que levou a demora no início da execução da obra .

➤ 6º Bimestre:

- Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 83 dias, devendo expirar-se em 31/01/2014 e estende a vigência contratual para 28/02/2014 (DODF nº 260 de 06/12/2013).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

➤ Próximo Bimestre: Esta sendo solicitado aditivo de valor no montante de R\$ 633.532,55, correspondente a 24,74% .

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 4





PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.001.125/2013
 (PROC. ORIGINAL 113.005.389/2011)
Nº DO CONTRATO: 053/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E
 CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 16/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 28/02/2014
 (QUARTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 2.658.283,00 + R\$ 629.571,62
 (QUINTO ADITIVO)
RECURSOS: FONTE 348
EXECUTOR: ENGº GUILHERME JOSÉ DA
 FONSECA BERNIZ.

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF-355 no trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Entroncamento da estaca 10 + 440 até o entroncamento com a DF-320 – Lote 4.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Executado bimestre: 4%. Acumulado 99%. Executado os serviços de terraplenagem; pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, imprimação e concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 4

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 3º Bimestre: Questionamento técnicos relativo a execução dos serviços foram respondidos em junho 2013 pela SUTEC o que levou a demora no início da execução da obra.

➤ 6º Bimestre:

- Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 83 dias, devendo expirar-se em 31/01/2014 e estende a vigência contratual para 28/02/2014 (DODF nº 260 de 06/12/2013).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

➤ Próximo Bimestre: Esta sendo solicitado aditivo de valor no montante de R\$ 629.571,62, correspondente a 23,68% .


EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL DO TIPO PONTE EM TRECHO DA DF – 355.



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.004.242/2010
Nº DO CONTRATO: 056/2012
EMPRESA: LAJE ENGENHARIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 23/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/08/2013
 (SEGUNDO ADITIVO)
VALOR: R\$ 1.272.771,83
RECURSOS: FONTES 348 E 148
EXECUTOR: ENGº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração de Projeto Executivo e a Construção de uma Obra de Arte Especial, do tipo Ponte, sobre o Córrego Jardim na DF- 355.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:
 Contrato concluído.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- Em 16/04/2013 foi solicitado a SUOBRA a paralisação da obra em virtude do aterro do encabeçamento da ponte ainda não estar concluído.
- Em 18/06/2013 prorroga o contrato até 31/08/2013.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:



RECUPERAÇÃO DA PISTA DO BALÃO DO COLORADO E IMPLANTAÇÃO DA FAIXA DE ACELERAÇÃO NA RODOVIA BR-450/DF-003 (EPIA)



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.8121 (2012) ,
Nº DO PROCESSO: 113.008.571/2011
Nº DO CONTRATO: 003/2012
EMPRESA: CONSORCIO RV-CONVAP- ARP
DATA DE INÍCIO: 11/04/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/04/2014
 (DÉCIMO PRIMEIRO)
VALOR: R\$ 5.616.681,44
RECURSOS: FONTES 231, 148, 348
EXECUTOR: ENGº CRISTIANO ALVES CAVALCANTE

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução das obras de recuperação da pista do Balão do Colorado, implantação da faixa de aceleração na rodovia BR-450/DF-003 (EPIA) e a realização dos serviços complementares na DF-150, inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Executado 5% no bimestre. Acumulado 65%. Início dos serviços para execução da galeria de águas pluviais localizada no Balão do Grande Colorado, fazendo uso de explosivos para realização da escavação de MAT. 3ª Categoria no Túnel N.A.T.M. e no SHAFT.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

RECUPERAÇÃO DA PISTA DO BALÃO DO COLORADO E IMPLANTAÇÃO DA FAIXA DE ACELERAÇÃO NA RODOVIA BR-450/DF-003 (EPIA)


COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 1º Bimestre (30/01/2013): Obra paralisada a partir de 27/12/2012.
- 2º Bimestre: Fim da paralisação do contrato em 27/03/2013, porém é necessária a liberação do uso de explosivos por parte do Exército Brasileiro para dar continuidade à obra.
- 3º Bimestre (24/06/2013): Contrato prorrogado por 120 dias.
- 5º Bimestre: No mês de outubro ocorreu a liberação dos Órgãos competentes (Exército Brasileiro e Defesa Civil) para o uso de explosivos na execução da galeria de águas pluviais no Balão do Grande Colorado. Assim, foi iniciado a escavação de MAT. 3ª CAT. no local.
- 6º Bimestre:
 - Prorrogação de prazo de execução dos serviços por 150 dias, DODF nº 270, 18/12/2013).
 - Estamos dando continuidade nos serviços necessários para a execução da galeria de água pluvial localizada no Balão do Grande Colorado.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- A previsão para conclusão da obra é para abril de 2014. Portanto, para o próximo bimestre, a programação é dar continuidade na execução da galeria de água pluvial localizada no Balão do Grande Colorado.


RESTAURAÇÃO DA DF-180, TRECHO: BR-060 A BR-070, LOTE 01

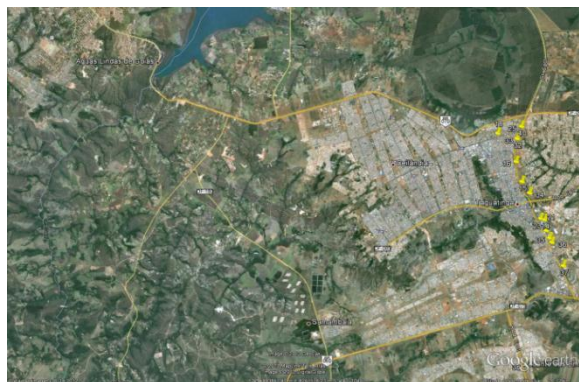


PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1689.0005 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.792/2011
Nº DO CONTRATO: 058/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E
 CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 13/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/03/2014
 (QUINTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 2.335.435,89
RECURSOS: FONTE 348
EXECUTOR: ENGº GERALDO JACINTO DA
 SILVA FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da rodovia DF-180 no trecho compreendido do seu entroncamento com a BR-070/DF-190, identificado como Lote 01. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Executado 8% no bimestre. Acumulado 99%. Andamento Normal. Obra sendo finalizada.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada Não Iniciada Cancelada Andamento Normal Atrasada Paralisada Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 2º Bimestre de 2013: Aguardando empenho.
- 4º Bimestre de 2013: Solicitado aditivo de prorrogação de prazo 90 dias.
- 6º Bimestre de 2013:
 - 4º Aditivo: Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 30 dias, devendo expirar-se em 08/12/2013 e estende a vigência contratual para 31/01/2014 (DODF nº 260 de 06/12/2013).
 - 5º Aditivo: Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 60 dias, devendo expirar-se em 06/02/2014 e estende a vigência contratual para 31/03/2014 (DODF nº 268 de 16/12/2013).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:


RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF-180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO DF-190/VC-311, LOTE 02



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1689.0005 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.804/2013
Nº DO CONTRATO: 059/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 13/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/03/2014 (QUINTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 3.860.417,26
RECURSOS: FONTE: 348
EXECUTOR: ENGº GERALDO JACINTO DA SILVA FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da Rodovia DF-180, compreendido do sub-trecho DF-190 até a VC 311, identificado como Lote 02. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Executado 4% no bimestre. Acumulado 99%. Andamento normal. Obra sendo finalizada.

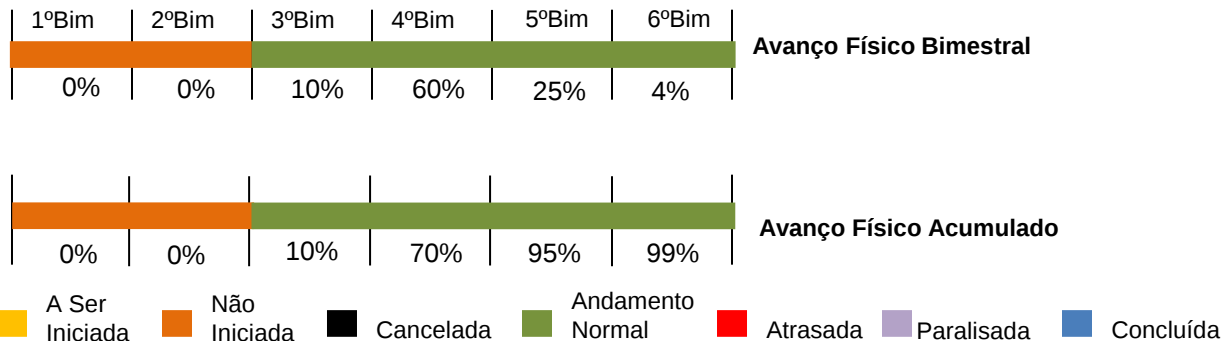

RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF-180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO VC-311/BR-060, LOTE 02

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 4º Bimestre:

- Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 90 dias, devendo expirar-se em 08/11/2013 e estende a vigência contratual para 31/12/2013 (DODF nº 180 de 29/08/2013).

➤ 6º Bimestre:

- 4º Aditivo: Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 30 dias, devendo expirar-se em 08/12/2013 e estende a vigência contratual para 31/01/2014 (DODF nº 260 de 06/12/2013).
- 5º Aditivo: Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 60 dias, devendo expirar-se em 06/02/2014 e estende a vigência contratual para 31/03/2014 (DODF nº 268 de 16/12/2013).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:


RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF-180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO VC-311/BR-060, LOTE 03



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1689.0005 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.805/2013
Nº DO CONTRATO: 060/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 13/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 01/03/2014 (QUINTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 3.106.491,96
RECURSOS: FONTE: 348
EXECUTOR: ENGº GERALDO JACINTO DA SILVA FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da rodovia DF-180 compreendido entre o sub-trecho da VC-311 até seu entroncamento com a BR- 060, identificado como Lote 03. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Executado 1% no bimestre. Acumulado 99%. Andamento normal. Obra sendo finalizada.

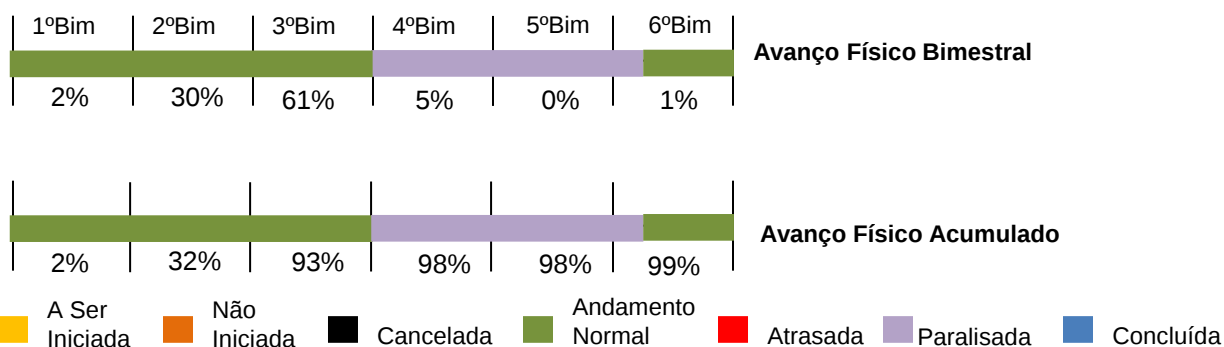

RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF – 180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO VC 311/BR- 060, LOTE 03

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 4º Bimestre:


- Fica suspenso o contrato por 90 dias, a partir de 10/08/2013, devendo encerrar-se em 08/11/2013 (DODF nº 180 de 29/08/2013).

➤ 6º Bimestre

- Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 15 dias, devendo expirar-se em 23/11/2013 e estende a vigência contratual para 31/12/2013 (DODF nº 241 de 18/11/2013).
- Prorrogação do prazo de vigência por 60 dias (DODF nº 276 de 24/12/2013).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF ANEL VIÁRIO – ESTUDO EVTEA/EIA/RIMA

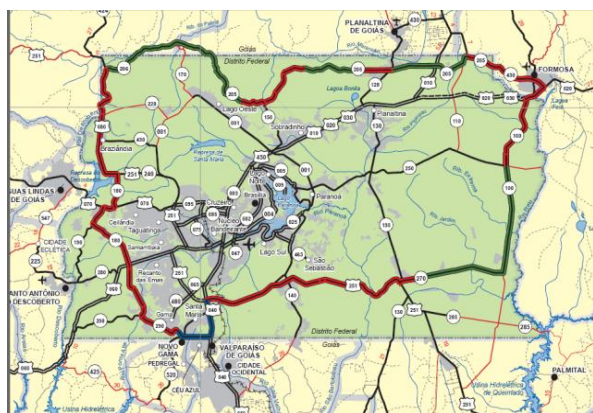

PROGRAMAS DE TRABALHO:
 26.782.2800.3550.0001 (2011) e
 26.782.6216.1968.0013(2012), ETAPA 66 SAG
 RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.002.321/2008
Nº DO CONTRATO: 040/2008
EMPRESA: STRATA ENGENHARIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 05/11/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/10/2012
VALOR: R\$ 7.290.752,11
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº JOSÉ RICARDO ALMEIDA
 DE BRITO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços de elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Estudos de Impacto Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA e dos Projetos Executivos de Engenharia das Rodovias integrantes do Anel Viário do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2013:

Por decisão do Diretor Geral, após ouvidas as áreas técnicas e o parecer do Sr. Procurador do DER, às folhas 1709 e 1710 dos autos do processo, o presente contrato será considerado expirado.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	0%	0%	0%	0%

Avanço Físico Bimestral

60%	60%	60%	60%	60%	%
-----	-----	-----	-----	-----	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF ANEL VIÁRIO – ESTUDO EVTEA/EIA/RIMA

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤Comentário do 2º bimestre de 2012:

•Os serviços objeto do Contrato nº 040/2008 estão paralisados pelo fato dos recursos orçamentários previstos na Lei Orçamentária Anual de 2012 contemplar, na rubrica Estudos e Projetos, o valor de R\$ 3.000.000,00, para custear todos os serviços de estudos e projetos do Departamento, valor insuficiente para concluir sequer os trabalhos do Contrato nº 040/2008. Por isso foi elaborado o Memorando 027/2012 – 3º DR, de 16/01/2012, solicitando definição da Direção sobre os recursos a serem alocados no Contrato. A Direção esta viabilizando junto aos Órgãos competentes a suplementação orçamentária para fazer face às despesas com o referido contrato.

➤Comentário 4º bimestre de 2012: Foi solicitado no final de agosto a suspensão do contrato nº 040/2008, haja vista que não houve suplementação orçamentária até o momento. O contrato continua paralisado.

➤Comentário 5º bimestre de 2012: Contrato Suspenso: Décimo Termo Aditivo, publicado no DODF nº 186 de 15/09/2012, página 55 – suspende o prazo do contrato por 90 dias a partir de 24/08/2012.

➤Comentário 6º bimestre de 2012: Contrato continua suspenso.

➤Comentário 1º bimestre de 2013: Vigência do contrato expirou em 24/11/2012.


➤Comentário 2º bimestre de 2013: Vigência do contrato expirou em 24/11/2012. Continua Suspenso.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

➤3º bimestre de 2013: Avaliar se ainda há interesse em prosseguir com o contrato e verificar se a vigência pode ser prorrogada.

➤4º e 5º bimestre de 2013: Por decisão do Diretor Geral, após ouvidas as áreas técnicas e o parecer do Sr. Procurador do DER, às folhas 1709 e 1710 dos autos do processo, o presente contrato será considerado expirado.

PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA DF-131

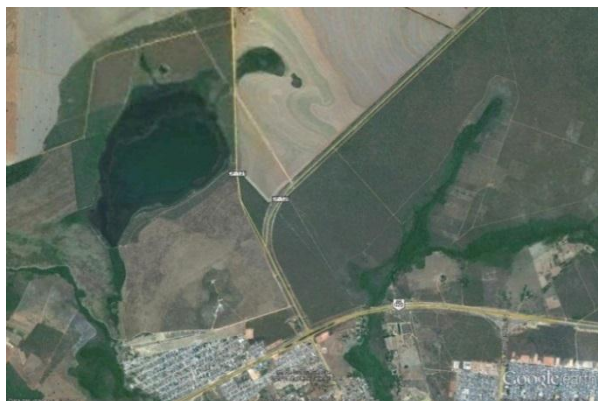

PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1968.0013 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.011.685/2011
Nº DO CONTRATO: 034/2012
EMPRESA: EXTREMA CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 25/09/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2013
 (TERCEIRO ADITIVO)
VALOR: R\$ 489.159,33
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTORA: ENG^a ERY DO NASCIMENTO
 BRANDI DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Projeto de Engenharia para Pavimentação da DF- 131.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:
 Projeto concluído.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
45 %	30%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
70%	100%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA DF-131


COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 1º Bimestre: Foi solicitado um aditivo de prazo de 30 dias para a correta finalização e aprovação do Componente Ambiental.
- 2º Bimestre: Foi solicitado o terceiro aditivo de prazo de 30 dias para a correta fiscalização e adequações do projeto de drenagem segundo orientações da ADASA.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- 1º Bimestre: Encerramento do contrato para o dia 23/03/2013.
- 2º Bimestre: Encerramento do contrato para o dia 23/05/2013.

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE EIA/RIMA, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS ENTRE AS CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E PLANO PILOTO – CORREDOR EIXO NORTE.

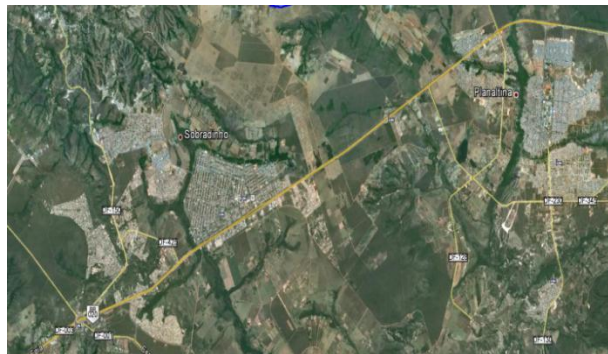

PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1968.0013 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.340/2011
Nº DO CONTRATO: 063/2012
EMPRESA: CONSÓRCIO DF INTERLIGADO
DATA DE INÍCIO: 26/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2014
VALOR: R\$ 12.251.695,70
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTORA: ENGª ERY DO NASCIMENTO
BRANDI DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Projeto Executivo de Engenharia e de EIA/RIMA, destinados à implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto – Corredor Eixo Norte.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Executado 12,8% no bimestre. Acumulado 66,24%. Etapas realizadas:

- Análise do Sistema: 0,83%
- Estudo Geológico-Geotécnico: 0,98%
- Projeto Básico Geométrico: 0,75%
- Projeto Básico de Terraplenagem: 0,30%
- Projeto Básico de OAE: 1,90%
- Projeto Básico de Pavimento: 0,40%
- Projeto Básico de Estações, Terminais e Garagens: 5,10%
- Especificações Técnicas e Métodos Construtivos: 1,28%
- Quantitativos, Custos, Orçamentos e Cronograma de Implantação: 1,26%

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
9,75%	6,13%	4,29%	5,36%	18,72%	12,8%

Avanço Físico Bimestral

18,94%	25,07%	29,36%	34,72%	53,44%	66,24%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída


**PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE EIA/RIMA, DESTINADOS À
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
ENTRE AS CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E PLANO PILOTO –
CORREDOR EIXO NORTE.**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

O Projeto Básico foi entregue dia 13/12/2013 e esta sendo analisado.

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EIA/RIMA, DESTINADO AO CORREDOR EIXO SUDOESTE.

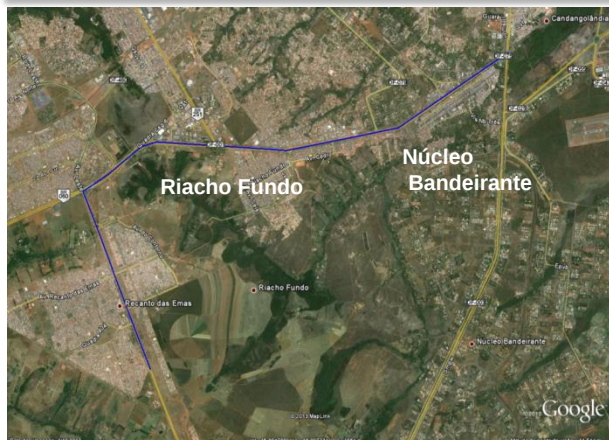

PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1968.0013
Nº DO PROCESSO: 113.001.608/2013
Nº DO CONTRATO: 036/2013
EMPRESA: ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A
DATA DE INÍCIO: 17/10/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 15 MESES
VALOR: R\$ 9.681.024,81
RECURSOS: 100
EXECUTORA: ENG^a ERY DO NASCIMENTO BRANDI DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração de projeto executivo de engenharia e EIA/RIMA, destinado a implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Taguatinga, Núcleo Bandeirantes e o Plano Piloto – Corredor Eixo Sudoeste.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Executado 4,05%. Acumulado 4,05%. Etapas realizadas:

- Relatório de Início: 1,0%
- Análise do Sistema: 0,73%
- Estudo Topográfico: 1,23%
- Estudo Geológico-Geotécnico: 0,52%
- Estudos Preliminares e Estudos de Processos Futuros para ITS: 0,57%

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	0%	4,05%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	0%	4,05%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EIA/RIMA, DESTINADO AO CORREDOR EIXO SUDOESTE.

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

De acordo com o Cronograma Físico-Financeiro aprovado para o contrato, a entrega do Projeto Executivo encontra-se atrasada.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

O Projeto Básico foi analisado pelos Analistas do DER/DF e aguarda a entrega final prevista para o dia 15/11/2013.

EXECUÇÃO DA OBRA DE AUMENTO DE CAPACIDADE E MELHORAMENTOS NA RODOVIA DF- 047 (EPAR)



PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.6216.3207.0001 (2012)
28.782.6216.3207.0004 (2013)
Nº DO PROCESSO: 113.005.351/2011
Nº DO CONTRATO: 062/2012
EMPRESA: CONSÓRCIO EPAR
(TRIER/GEOSONDA/IQS)
DATA DE INÍCIO: 26/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2014
VALOR: R\$ 43.400.987,10
RECURSOS: FONTE 100, 148, 348
EXECUTORES: ENGº FÁBIO CARDOSO DA
SILVA, ENGº GERALDO JACINTO DA SILVA
FILHO, ENGº ÁLVARO HOLANDA BOAVISTA
(INSTRUÇÃO Nº 198 de 11/12/12).

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução da obra de aumento de capacidade e melhoramento na Rodovia DF-047 (EPAR). As obras englobam os serviços de terraplanagem, pavimentação rígida e flexível, drenagem, sinalização, contenção de taludes, obras de arte especiais, obras complementares e de recuperação do meio ambiente.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
Executado 20% no bimestre. Acumulado 70%.

- Execução dos serviços de drenagem (túnel linear)
- Conclusão da parede diafragma
- Escavação das rampas e trincheira
- Início da drenagem na trincheira
- Início dos serviços de lançamento de viga e pré-laje (cobertura da trincheira)
- Início dos serviços de plantio de grama nas marginais

Obra sob a responsabilidade direta da Secretaria de Transportes.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
1%	4,5%	2,5%	22%	20%	20%

Avanço Físico Bimestral

1%	5,5 %	8%	30%	50%	70%
----	-------	----	-----	-----	-----

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

EXECUÇÃO DA OBRA DE AUMENTO DE CAPACIDADE E MELHORAMENTOS NA RODOVIA DF- 047 (EPAR)

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 2º bimestre de 2013:

- Projeto Executivo da trincheira em fase de aprovação pelo DER-DF.
- Projeto Executivo da drenagem em fase de aprovação pelo DER-DF.
- Foram enviadas fotos do andamento da obra.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

REMANEJAMENTO DE REDE ELÉTRICA NA DF-047 (EPAR)



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.3207.0004
 Nº DO PROCESSO: 113.002.255/2013
 CONTRATO: INFORMAR
 EMPRESA: CEB DISTRIBUIÇÃO
 DATA DE INÍCIO: INFORMAR
 DATA PREVISTA:
 VALOR: R\$ 730.869,21
 RECURSOS: FONTE 100
 EXECUTOR: INFORMAR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Remanejamento de rede para melhorias nas vias marginais da Rodovia DF-047.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

REMANEJAMENTO DE REDE ELÉTRICA NA DF-047 (EPAR)

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL DO TIPO PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO PIPIRIPAU NA DF-230.



PROGRAMAS DE TRABALHO:
 28.782.6216.1475.1199
Nº DO PROCESSO: 113.008.111/2013
Nº DO CONTRATO: 040/2013
EMPRESA: NG ENGENHARIA E
 CONSTRUÇÕES LTDA
DATA DE INÍCIO: 05/12/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 120 DIAS
VALOR: R\$ 436.767,57
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: PAULO ROBERT SANTOS
 MACHADO

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de alargamento de 01 ponte sobre o Rio Ribeirão Pipiripau na DF- 230, no trecho compreendido entre a DF-345 e a VC-137. TP nº 007/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Não houve avanço físico nesse bimestre.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

**EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL DO TIPO PONTE SOBRE O RIO
RIBEIRÃO PIPIRIPAU NA DF-230.**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:


ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/ RIMA) PARA O TREVO DE TRIAGEM NORTE (TTN)



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.3711.6161 (PRIMEIRO ADITIVO)
Nº DO PROCESSO: 113.005.275/2012
Nº DO CONTRATO: 033/2012
EMPRESA: HIDROLÓGICA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 17/09/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: REATIVA O PRAZO DE EXECUÇÃO A PARTIR DE 18/11/2013 (SEXTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 143.840,94
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº PAULO ROBERTO DA SILVA

DESCRIÇÃO DA OBRA: EIA/ RIMA para o Trevo de Triagem Norte (DF-002 – Eixo Norte / DF-007 (EPTT) – Ponte do Braghetto.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Serviço concluído.

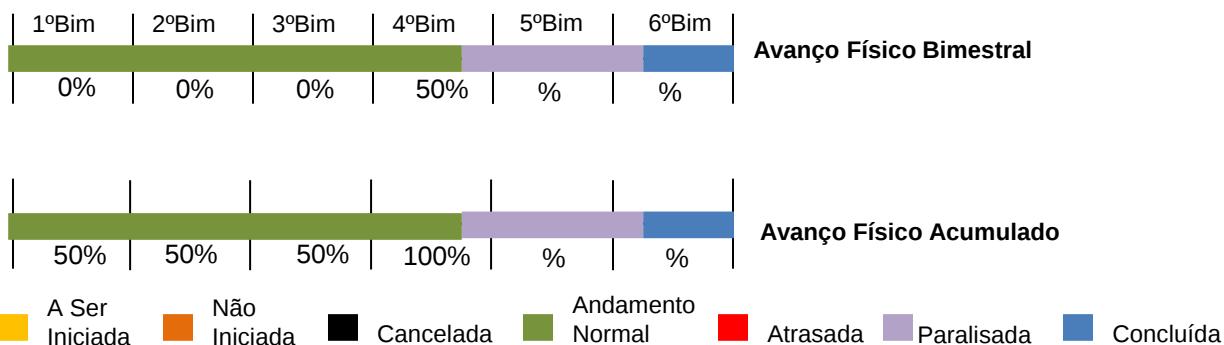

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/ RIMA) PARA O TREVO DE TRIAGEM NORTE (TTN)

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- Os serviços estão divididos em 04 produtos: 1. EIA Versão preliminar; 2. EIA Versão Final; 3. RIMA Versão Preliminar e 4. RIMA Versão Final.
- Os Produtos 1 e 3 (Versões Preliminares do EIA e do RIMA) já foram elaborados e encaminhados ao IBRAM.
- O IBRAM solicitou correções/complementações aos Produtos.
- Os produtos 2 e 4 (Versões Finais - EIA/RIMA) já foram elaborados e encaminhados ao IBRAM.
- Aguardando a manifestação do IBRAM.
- Foi solicitada a suspensão do contrato enquanto aguarda a manifestação do IBRAM.
- DODF nº 191, de 13/09/2013: Paralisa o prazo de execução dos serviços a partir de 22/08/2013, devendo encerrar-se a paralisação em 20/11/2013.
- DODF nº 247, de 25/11/2013: Reativa o prazo de execução dos serviços a partir de 18/11/2013.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- Elaborar os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo dos serviços.



ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO TRECHO DA DF-355



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.205.26.782.6216.3711.6161
Nº DO PROCESSO: 113.008.887/2012
Nº DO CONTRATO: 009/2013
EMPRESA: ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 25/03/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/04/2014
 (QUINTA ADITIVO)
VALOR: R\$ 124.937,18
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº CARLOS ANGELIM

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração dos Planos de Controle Ambiental relativos à obra de pavimentação da rodovia DF-355, no trecho compreendido entre a DF-120 e a DF-320 e a obra de pavimentação da Via de Ligação entre a DF-001 (EPCT) e a Vila Basevi, conforme especificações nos anexos do Edital.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Executado 10% no bimestre. Acumulado 80%. Os produtos 1 e 2 (versões preliminares dos estudos ambientais) já foram entregues pela empresa contratada. Os dois produtos foram remetido ao IBRAM para análise, e com isso, foram solicitados correções e complementações aos mesmos. Estas correções e complementações já estão sendo feitas pela empresa contratada e serão novamente remetidas ao IBRAM para análise e aprovação.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO TRECHO DA DF-355


COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 3º Bimestre de 2013: A elaboração dos produtos finais pela empresa somente é possível após a manifestação do órgão ambiental (IBRAM).
- 4º Bimestre de 2013:
 - Por meio do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2013, houve a prorrogação do prazo de execução dos serviços por 90 dias, devendo expirar-se em 21/09/2013, estende-se por consequência a vigência contratual para 30/11/2013.
 - No dia 04/09/2013 foi solicitado ao Diretor Geral a suspensão do Contrato por um período de 90 (noventa) dias, enquanto aguardamos a manifestação do IBRAM para a análise dos referidos produtos (DODF nº 194, 18/09/2013).
 - A elaboração dos produtos finais pela empresa somente é possível após a manifestação do órgão ambiental (IBRAM).
- 6º Bimestre de 2013:
 - Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 90 dias, devendo encerrar-se em 20/03/2014 e estende a vigência contratual para 30/04/2014 (DODF nº 266, 13/12/2013).
 - A elaboração dos produtos finais pela empresa somente é possível após a manifestação final do órgão ambiental (IBRAM).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- A elaboração dos produtos finais pela empresa após a manifestação do órgão ambiental (IBRAM).


ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF

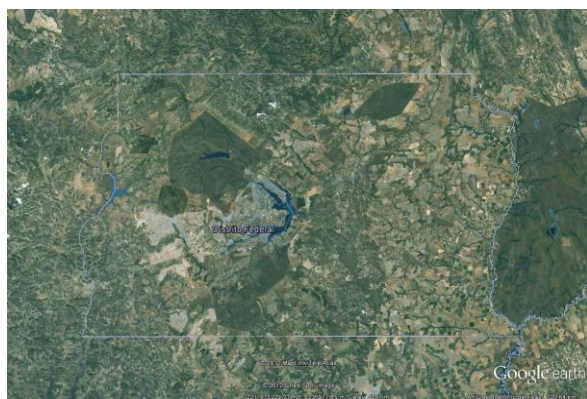


PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.3711.6162 (2013)
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.005.428/2006
Nº DO CONTRATO: 002/2010
FIRMA: GEO-LÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 19/02/2010
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 28/02/2014 (SEXTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 1.303.632,37
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTOR: ENGº PAULO ROBERTO DA SILVA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central (DF e Goiás).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Executado 0% no bimestre. Permanece o mesmo patamar de 70%.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.4195.0001

RA 99 – TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 113.000.727/2012

Nº DO CONTRATO: 023/2012

EMPRESA: G. B. DA SILVA EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO- EPP

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/07/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2013

VALOR: R\$ 222.949,00



RECURSOS: FONTE 100

EXECUTOR: ENGº LUIZ GERALDO RANGEL VILELA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de Asfalto diluído CM-30

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

Contrato concluído. Fornecimento de 9,7% de asfalto diluído CM-30 no bimestre.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.4195.0001

RA 99 – TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 113.000.727/2012

Nº DO CONTRATO: 025/2012

EMPRESA: DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/07/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2014
(PRIMEIRO ADITIVO)

VALOR: R\$ 192.000,00


RECURSOS: FONTE 100

EXECUTOR: ENGº LUIZ GERALDO RANGEL VILELA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Fornecimento de 11,48% de asfalto diluído RM-1C no bimestre.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.4195.0001

RA 99 – TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 113.000.727/2012

Nº DO CONTRATO: 024/2012

EMPRESA: CENTRO OESTE ASFALTO LTDA

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/07/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2014
(PRIMEIRO ADITIVO)

VALOR: R\$ 77.899,80



RECURSOS: FONTE 100

EXECUTOR: ENGº LUIZ GERALDO RANGEL
VILELA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Fornecimento de 17,54% de asfalto diluído RR-2C no bimestre.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.4195.0001

Nº DO PROCESSO: 113.007.966/2012

Nº DO CONTRATO: 005/2013

EMPRESA: PETROENGE ENGENHARIA S/A

DATA DE INÍCIO: 19/03/2013

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 18/03/2014

VALOR: R\$ 951.500,00 + R\$ 237.875,00

(PRIMEIRO ADITIVO)



RECURSOS: FONTE 100

EXECUTOR: ENGº LAURO DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Fornecimento parcelado de 5.298 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Foi consumido 42,19% do termo aditivo de R\$ 237.875,00.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

CONSTRUÇÃO DA SEDE E ILUMINAÇÃO EXTERNA DO 4º DISTRITO RODOVIÁRIO DO DER/DF



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.451.6216.3197.0001

Nº DO PROCESSO: 113.002.641/2010

Nº DO CONTRATO: 043/2013

EMPRESA: MENDONÇA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

DATA DE INÍCIO: 11/12/2013

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 120 DIAS

VALOR: R\$ 408.254,65

RECURSOS: FONTE 100

EXECUTOR: ENGº SÉRGIO HENRIQUE REZENDE VALLE

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de reforma e acabamento na nova Sede do 4º Distrito Rodoviário do DER/DF localizado no Setor de Área Especial nº 02, rodovia DF-130, km 53 – Paranoá.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Assinatura do contrato e início da obra.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

**CONSTRUÇÃO DA SEDE E ILUMINAÇÃO EXTERNA DO 4º DISTRITO RODOVIÁRIO DO
DER/DF**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ALAMBRADO E MURO DE DIVISA DO 5º DISTRITO RODOVIÁRIO DO DER-DF



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.451.6216.3197.0001
Nº DO PROCESSO: 113.010.563/2011
Nº DO CONTRATO: 042/2013
EMPRESA: MENDONÇA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
DATA DE INÍCIO: 11/12/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 120 DIAS
VALOR: R\$ 309.242,70
RECURSOS: FONTE
EXECUTOR: ENGº CYRINO FLÁVIO FERREIRA SILVA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução das obras de reforma e acabamento da Nova Sede do 5º Distrito Rodoviário do DER-DF, localizado na Vila São José DF-180, Km 19 – Brazlândia-DF .

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Assinatura do contrato e início da obra.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

**CONSTRUÇÃO DA SEDE E ILUMINAÇÃO EXTERNA DO 4º DISTRITO RODOVIÁRIO DO
DER/DF**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:
