




Relatório de Acompanhamento Governamental – 2º Bimestre/2014

SOLUÇÃO INTEGRADA PARA DEPARTAMENTOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

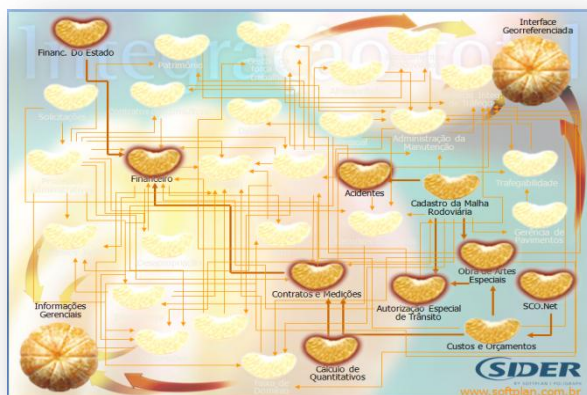

Programas de Trabalho:

26.122.6010.8517.0006 (2011),
26.122.6010.8517.0014 (2012),
26.122.6010.2557.2569 (2013)

RA 99 – Todo o DF

Nº do Processo: 113.000.376/2007

Nº do Contrato: 051/2008

Empresa: Poligraph Sistemas e Representações Ltda.

Data de início: 01/01/2009

Data prevista de conclusão: 31/12/2013

Valor: R\$ 2.727.734,84 + R\$ 80.660,68 =
R\$ 2.808.395,52 (Oitavo Aditivo)

Recurso: Fontes 100, 237, 300, 220, 420, 437

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços especializados de engenharia, visando a sistematização de um modelo integrado de gestão, permitindo ao DER-DF alcançar, com base em um banco de dados unificado, melhorias sustentáveis para a gestão de contratos de obras rodoviárias, segurança de trânsito de pessoas e de cargas do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
Continua em andamento o Acompanhamento.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:
Concluída a prestação dos serviços.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

100%	%	%	%	%	%
------	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO



Programa de Trabalho:
26.782.6215.2460.0001(2012)
etapa 25 SAG
RA 99 – Todo o DF
Nº do Processo: 113.008.698/2011
Contrato: 027/2011
Empresa: Gráfica e Editora Movimento
Data de Início: 19/12/2011
Data prevista de conclusão: 18/12/2014
(Segundo aditivo)
Valor Inicial: R\$ 4.482.722,70
Recurso: Fonte 237


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços gráficos e diagramação de campanhas educativas de trânsito e meio ambiente, por meio de confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços gráficos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:


Neste 1º bimestre foram gastos R\$ 38.913,98 com serviços gráficos para campanhas educativas voltadas para o carnaval – Álcool x Direção e infantil – Agentes mirins.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Até 16/04/2014 foram gastos com material educativo R\$ 53.777,07. As Campanhas foram de cinto de segurança, pedestres, caminhoneiros e álcool x direção.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 6º Bimestre de 2013: Contrato renovado para o próximo exercício, devendo encerrar-se em 18/12/2014 (DODF nº 266, 13/12/2013).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO TIPO TALÃO



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001 (2013)
 RA 99 – Todo o DF
 Nº do Processo: 113.006.353/2010
 Nº do Contrato: 031/2010
 Empresa: Engebrás S/A Indústria, Comércio e
 Tecnologia de Informática
 Data de Início: 07/12/2010
 Data prevista de conclusão: 25/06/2014
 (Nono Aditivo)
 Valor dos Serviços: R\$ 642.951,60
 Recurso: Fonte 237


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Locação de 50 (cinquenta) equipamentos eletrônicos do tipo Talão para captura e registro eletrônico de infrações de trânsito.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:


➤ Em 2014 já foi pago: R\$ 53.579,30 (jan/14) + R\$ 53.579,30 (fev/14). Total = R\$ 107.158,60

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

➤ Em 2014 já foi pago: R\$ 53.579,30 (jan/14) + R\$ 53.579,30 (fev/14) + R\$ 53.579,30 (março/14) + R\$ 53.579,30 (abr/14). Total (ano/2014) = R\$ 214.317,20.



Avanço Físico Bimestral



% Acumulativo Executado dos Serviços

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO TIPO TALÃO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001
 Nº do Processo: 113.001.225/2008
 Nº do Contrato: 028/2011
 Empresa: Engebrás S/A Indústria, Comércio e
 Tecnologia de Informática
 Data de Início: 23/12/2011
 Data prevista de conclusão: 30/06/2014
 Valor: R\$ 21.979.430,01 + R\$ 1.187.120,00
 (Terceiro Aditivo) = R\$ 23.166.550,01
 Recurso: Fonte 237

DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO: Monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:
 Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 16,6%. Contrato em ritmo normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:
 Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 33,2%. Contrato em ritmo normal.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	16,6%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	33,2 %	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

Trata-se de serviço de natureza contínua.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP



Programa de Trabalho:

26.782.6215.2541.0001

Nº do Processo: 113.010.751/2011

Nº do Contrato: 018/2012

Empresa: Lig Móvil Telecomunicações Ltda

Data de início: 06/06/2012

Data prevista de conclusão: 05/06/2014

(Primeiro Aditivo)

Valor dos Serviços: R\$ 147.696,00 + R\$

26.263,00 (Primeiro Aditivo) = R\$ 173.959,00

Recurso: Fonte 237

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Locação de 60 equipamentos de Rádio Comunicação e 02 (dois) Fixos (estação Rádio Base).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

➤ Em 2014 já foi pago R\$ 14.162,00 (jan/14) + R\$ 14.162,00 (fev/14), Total R\$ 28.324,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

➤ Em 2014 já foi pago R\$ 14.162,00 (jan/14) + R\$ 14.162,00 (fev/14) + R\$ 14.162,00 (março/14) + R\$ 14.162,00 (abr/14). Total R\$ 56.648,00.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%
---	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS



DETRAN-DF
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO DISTRITO FEDERAL



Programa de Trabalho:

26.782.6215.2541.0001

Nº do Processo: 113.007.132/2008

Nº do Convênio: 001/2010

Conveniado: Departamento de Trânsito do
Distrito Federal - DETRAN/DF

Data de Início: 03/12/2010

Data prevista de conclusão: 28/05/2014
(Terceiro Aditivo)

Recurso: Fontes 100 e 237

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: O presente Convênio tem por objetivo reduzir os níveis de acidentes nas vias urbanas e rurais do DF, tendo por objeto a delegação entre os convenientes da competência para lavratura do auto de infração de trânsito, nos limites das condições e circunstâncias fixadas neste instrumento, bem assim a cooperação mútua para a execução das seguintes atividades: Processamento de Dados, Engenharia de Tráfego, Educação no Trânsito, estatística, Monitoramento Aéreo.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 16,6%. Contrato em ritmo normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 33,2%. Contrato em ritmo normal.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
16,6%	16,6%	%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
16,6%	33,2 %	%	%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

**PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO,
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE
ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 6º Bimestre de 2013:

- Prorrogação do prazo de prestação dos serviços por 180 dias, devendo encerrar-se 28/05/2014 (DODF nº 260 de 06/12/2013).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001
 Nº do Processo: 054.001.403/2011
 Nº do Convênio: 001/2012
 Conveniado: Polícia Militar do Distrito Federal
 Data de Início: 11/05/2012
 Data prevista de conclusão: 11/05/2014
 Recurso: Fontes 237, 437

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:
 Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 16,6%. Contrato em ritmo normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:
 Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 33,2%. Contrato em ritmo normal.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
16,6%	16,6%	%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
16,6 %	33,2%	%	%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

**FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF,
SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programas de Trabalho:
 26.782.2800.2904.0001 (2011) e
 26.782.6215.2904.0001 (2012), Etapa 29 SAG
 RA 99 – Todo o DF
 Nº do Processo: 113.005.681/2010
 Nº do Contrato: 011/2011
 Empresa: Hot Cozinha Industrial
 Data de Início: Março/ 2011
 Data prevista de conclusão: 31/05/2014
 (Terceiro Aditivo)
 Valor: R\$ 293.760,00
 Recurso: Fonte 237

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Lanche para as crianças das Escolas Públicas, que são levadas nos períodos matutino e vespertino, no Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o Trânsito, para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Houve fornecimento de lanche apenas um dia e foram gastos R\$ 317,70, embora a escola tenha atendido 532 crianças.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Foram fornecidos lanches no valor total de R\$ 2.340,39 e atendidas 1.307 crianças, até o dia 16/04/2014.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%
---	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO



Programa de Trabalho:

26.782.6215.3209.0001

Nº do Processo: 113.000.076/2013

Nº do Contrato: 018/2013

Empresa: Sitran - Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda

Data de Início: 03/06/2013

Data prevista de conclusão: Encerramento da suspensão em 11/05/2014 (Primeiro Aditivo)

Valor: R\$ 838.882,14

Recurso: Fonte 237

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de sinalização para orientação de destino específica para eventos do Comitê organizador da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:



Permanece posição do 5º bimestre. Acumulado 86%. Suspensão dos serviços: Primeiro Termo aditivo - Suspensão da execução dos serviços a partir de 12/07/2013, devendo encerrar-se em 11/05/2014 (DODF nº 157, de 01/08/2013), motivo: as rodovias DF-047; DF-003; DF-025; DF-065 e DF-480; 17 semipórticos não puderam ser instalados, porque modificações estão sendo realizadas nas faixas lindeiras destas rodovias como parte de obras de adequação.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Suspensão.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Suspensão.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 4º Bimestre de 2013: Primeiro Termo aditivo - Suspensão da execução dos serviços a partir de 12/07/2013, devendo encerrar-se em 11/05/2014 (DODF nº 157, de 01/08/2013).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Aguardar o final da paralisação.

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO



Programa de Trabalho:
 26.782.6515.4198.0001
 Nº do Processo: 113.004.476/2006
 Nº do Contrato: 020/2008
 Empresa: Sitran - Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
 Data de Início: 01/08/2008
 Data prevista de conclusão: 01/08/2014
 (Sexto Aditivo)
 Valor: R\$ 2.105.493,13 (Inicial)
 Recurso: Fonte 237

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Manutenção preventiva dos equipamentos do sistema semafórico operado pelo DER/DF. Concorrência nº 01/2007.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Executado 17% no bimestre. Acumulado 100% no ano. Contrato em ritmo normal. Concluída a etapa de 2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:
 Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 16,6%. Contrato em ritmo normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:
 Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 33,2%. Contrato em ritmo normal.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	16,6 %	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	33,2%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ Trata-se de serviço de natureza contínua.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES DOS CRUZAMENTOS SEMAFÓRICOS NAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL



Programa de Trabalho:

26.782.6515.4198.0001

Nº do Processo: 113.011.026/2013

Nº do Contrato: 005/2014

Empresa: Sitran - Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.

Data de Início: 17/02/2014

Data prevista de conclusão: 180 dias (contados da data do recebimento da IS pela contratada)

Valor: R\$ 68.946,50

Recurso: Fonte 237

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Substituição de 730 lâmpadas incandescentes dos cruzamentos semafóricos instalados em rodovias do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Os focos à led foram entregues à empresa para substituição paulatina dentro do prazo de execução.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES DOS CRUZAMENTOS SEMAFÓRICOS NAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 2º Bimestre de 2014: A Ordem de Serviço para o início da execução foi emitida no dia 18/03/2014.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA RODOVIA DF-075 (EPNB), TRECHO ENTRE A DF-003 E A DF-079 (UPA).



Programa de Trabalho:

26.782.6216.1347.9481

Nº do Processo: 113.007.989/2012

Nº do Contrato: 020/2013

Empresa: Rio Platense Construções, Projetos e Consultorias Ltda.

Data de Início: 26/06/2013

Data prevista de conclusão: 30/06/2014

(Quinto Aditivo)

Valor: R\$ 1.898.558,31

Recurso: Fontes 100 e 348 (Terceiro Aditivo)

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração projeto de construção de passarela na Rodovia DF-075 (EPNB), entroncamento com a DF-003 e a DF-079.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Executado 6,16% no bimestre. Acumulado 84,76%. Os serviços executados foram: montagem e pintura da parte aérea e da estrutura metálica.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 13,24% no bimestre. Acumulado 98%. Em fase de acabamento dos serviços complementares.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
6,16%	13,24%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
84,76%	98%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA RODOVIA DF-075 (EPNB), TRECHO ENTRE A DF-003 E A DF-079 (UPA).

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 4º Bimestre de 2013: A obra teve início em 06/08/2013, em consequência do recebimento da IS nº 007/2013.
- 5º Bimestre de 2013: Os serviços estão atrasados em consequência das interferências de redes de alta tensão. A CEB concluiu a remoção das referidas redes em 25/10/2013.
- 6º Bimestre de 2013: Prorrogação do prazo de execução por 90 dias (DODF nº 276, 24/12/2013).
- 1º Bimestre de 2014: Solicitado prorrogação por mais 30 dias em consequência do atraso provocado pelas chuvas.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- Conclusão dos serviços.

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA DF-001 (EPCT), TRECHO BR-060 E VC-331



Programa de Trabalho:
26.782.6216.1347.9481
Nº do Processo: 113.005.703/2011
Nº do Contrato: 032/2013
Empresa: CCL Construtora Ltda.
Data de Início: 03/09/2013
Data prevista de conclusão: 31/07/2014
(Terceiro Aditivo)
Valor: R\$ 1.148.241,80
Recurso: Fonte 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de Obra de Arte Especial do tipo Passarela em estrutura mista em arco na DF-001, tr. BR-060 e VC-331/ Recanto das Emas.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:
Execução de 10% no bimestre. Acumulado 30%. Execução de 50% dos pilares. Início da mobilização da estrutura metálica.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:
Executado 33% no bimestre. Acumulado 63%. A estrutura de concreto armado (fundação, blocos, pilares e escada) foi 100% concluída e a estrutura metálica foi 50% executada.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
10%	33%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
30%	63%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA DF-001 (EPCT), TRECHO BR-060 E VC-331

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:


➤ 1º Bimestre de 2014: Aguardando empenho.

➤ 2º Bimestre de 2014: Os serviços foram prejudicados em razão de interferências com a rede elétrica da CEB e adutora de água pluvial da CAESB.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Conclusão da obra e remanejamento da rede elétrica.

RESTAURAÇÃO DA DF-180, TRECHO: BR-060 A BR-070, LOTE 01

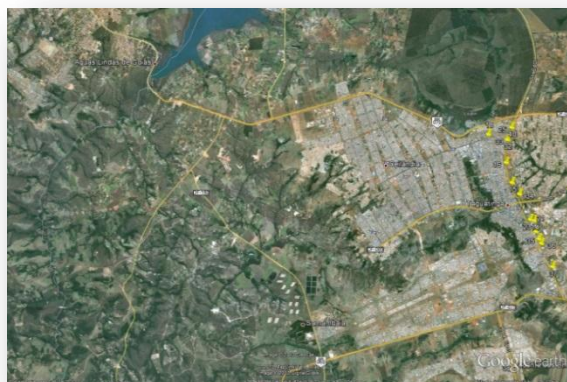

Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1689.0005 (2012)
 Nº do Processo: 113.009.792/2011
 Nº do Contrato: 058/2012
 Empresa: JM Terraplenagem e Construção Ltda
 Data de Início: 13/11/2012
 Data prevista de conclusão: 31/03/2014
 (Quinto Aditivo)
 Valor: R\$ 2.335.435,89
 Recurso: Fonte 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da rodovia DF-180 no trecho compreendido do seu entroncamento com a BR-070/DF-190, identificado como Lote 01. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Executado 8% no bimestre. Acumulado 99%. Andamento Normal. Obra sendo finalizada.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:
 Obra concluída.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
1%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

100%	%	%	%	%	%
------	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

RESTAURAÇÃO DA DF-180, TRECHO: BR-060 A BR-070, LOTE 01


COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 6º Bimestre de 2013:

- 4º Aditivo: Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 30 dias, devendo expirar-se em 08/12/2013 e estende a vigência contratual para 31/01/2014 (DODF nº 260 de 06/12/2013).
- 5º Aditivo: Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 60 dias, devendo expirar-se em 06/02/2014 e estende a vigência contratual para 31/03/2014 (DODF nº 268 de 16/12/2013).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF-180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO DF-190/VC-311, LOTE 02

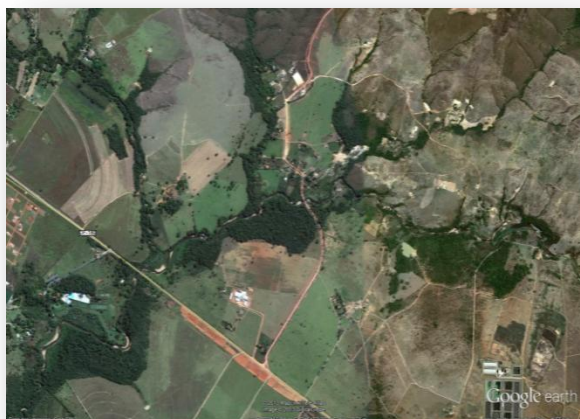

Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1689.0005 (2012)
 Nº do Processo: 113.009.804/2013
 Nº do Contrato: 059/2012
 Empresa: JM Terraplenagem e Construção Ltda
 Data de Início: 13/11/2012
 Data prevista de conclusão: 31/03/2014
 (Quinto Aditivo)
 Valor: R\$ 3.860.417,26
 Recurso: Fonte: 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da Rodovia DF-180, compreendido do sub-trecho DF-190 até a VC-311, identificado como Lote 02. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Executado 4% no bimestre. Acumulado 99%. Andamento normal. Obra sendo finalizada.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:
 Obra concluída.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
1%	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
100%	%	%	%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF-180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO VC-311/BR-060, LOTE 02


COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 6º Bimestre de 2013:

- 4º Aditivo: Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 30 dias, devendo expirar-se em 08/12/2013 e estende a vigência contratual para 31/01/2014 (DODF nº 260 de 06/12/2013).
- 5º Aditivo: Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 60 dias, devendo expirar-se em 06/02/2014 e estende a vigência contratual para 31/03/2014 (DODF nº 268 de 16/12/2013).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF-180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO VC-311/BR-060, LOTE 03

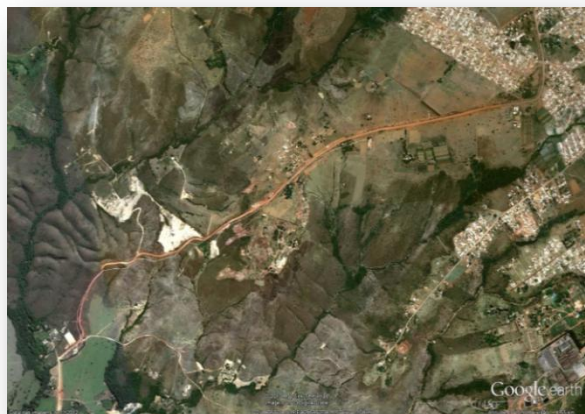

Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1689.0005 (2012)
 Nº do Processo: 113.009.805/2013
 Nº do Contrato: 060/2012
 Empresa: JM Terraplenagem e Construção Ltda
 Data de Início: 13/11/2012
 Data prevista de conclusão: 01/03/2014
 (Quinto Aditivo)
 Valor: R\$ 3.106.491,96
 Recurso: Fonte: 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da rodovia DF-180 compreendido entre o sub-trecho da VC-311 até seu entroncamento com a BR- 060, identificado como Lote 03. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Executado 1% no bimestre. Acumulado 99%. Andamento normal. Obra sendo finalizada.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:
 Obra concluída.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
1%	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
100%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF – 180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO VC 311/BR- 060, LOTE 03

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 6º Bimestre

- Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 15 dias, devendo expirar-se em 23/11/2013 e estende a vigência contratual para 31/12/2013 (DODF nº 241 de 18/11/2013).
- Prorrogação do prazo de vigência por 60 dias (DODF nº 276 de 24/12/2013).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

RECUPERAÇÃO DA PISTA DO BALÃO DO COLORADO E IMPLANTAÇÃO DA FAIXA DE ACELERAÇÃO NA RODOVIA DF-003 (EPIA)



Programas de Trabalho:
 26.782.6216.1475.8121 (2012) ,
 26.782.6216.1475.1199 (2014)
 Nº do Processo: 113.008.571/2011
 Nº do Contrato: 003/2012
 Empresa: Consórcio RV-ARP
 (Décimo Segundo Aditivo)
 Data de Início: 11/04/2012
 Data prevista de conclusão: 31/07/2014
 (Décimo Terceiro Aditivo)
 Valor: R\$ 5.616.681,44
 Recurso: Fontes 231, 148, 348



DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução das obras de recuperação da pista do Balão do Colorado, implantação da faixa de aceleração na rodovia DF-003 (EPIA) e a realização dos serviços complementares na DF-150, inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente. Extensão de 2.428 km.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Executado 3% no bimestre. Acumulado 68%. Dando sequência aos serviços para execução da galeria de águas pluviais localizada no Balão do Grande Colorado, fazendo uso de explosivos para realização da escavação de MAT. 3ª Categoria no Túnel N.A.T.M. e no SHAFT.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 7% no bimestre. Acumulado 75%. Continuação dos serviços para execução da galeria de águas pluviais localizada no Balão do Grande Colorado, fazendo uso explosivos para realização da escavação de MAT. 3ª Categoria no Túnel N.A.T.M. e no SHAFT.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

RECUPERAÇÃO DA PISTA DO BALÃO DO COLORADO E IMPLANTAÇÃO DA FAIXA DE ACELERAÇÃO NA RODOVIA DF-003 (EPIA)

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 1º Bimestre de 2014:

- Prorrogação de prazo de execução dos serviços por 150 dias, DODF nº 270, 18/12/2013).
- Estamos dando continuidade nos serviços necessários para a execução da galeria de água pluvial localizada no Balão do Grande Colorado
- A previsão para conclusão da obra é para abril de 2014. Portanto, para o próximo bimestre, a programação é dar continuidade na execução da galeria de água pluvial localizada no Balão do Grande Colorado.

➤ 2º Bimestre de 2014:

- Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 90 dias (DODF nº 87, 05/05/2014).
- A previsão para conclusão da obra é para junho de 2014. Portanto, para o próximo bimestre, a programação é dar continuidade na execução da galeria de água pluvial localizada no Balão do Grande Colorado.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 1



Programas de Trabalho:

26.782.6216.1475.3517 (2012)

26.782.6216.1475.1199 (2014)

Nº do Processo: 113.005.389/2011

Nº do Contrato: 053/2012

Empresa: JM Terraplenagem e Construção Ltda

Data de Início: 16/10/2012

Data prevista de conclusão: 30/06/2014

(Nono Aditivo)

Valor: R\$ 2.687.681,33 + R\$ 635.554,67

(Sétimo Aditivo) = R\$ 3.323.236,00

Recurso: Fontes 148 e 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF-355 no trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Entroncamento da DF-120 (estaca 0) até a estaca 3 + 480 - Lote 1. Extensão de 3,48 km.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Executado 1% no bimestre. Acumulado 93%. Conclusão de 80% dos serviços de drenagem e obras de arte especial.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 7% no bimestre. Acumulado 100%. Finalização completa de todos os serviços e entrega da obra.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
1%	7%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
93%	100%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 1

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 6º Bimestre de 2013:

- Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 53 dias, devendo expirar-se em 31/01/2014 e estende a vigência contratual para 28/02/2014 (DODF nº 260 de 06/12/2013).
- Finalização da imprimação e pintura de ligação;
- Conclusão da execução da capa asfáltica;
- Inicialização dos serviços de valatas e sarjetas de concreto.

➤ 1º Bimestre de 2013:

- Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 60 dias, devendo expirar-se em 01/04/2014 e estende a vigência contratual para 31/05/2014 (DODF nº 22 de 29/01/2014). Tal prorrogação se deve à falta de recursos financeiros para conclusão da obra.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 2



Programas de Trabalho:

26.782.6216.1475.3517 (2012)

26.782.6216.1475.1199 (2014)

Nº do Processo: 113.001.123/2013

(Proc. Original 113.005.389/2011)

Nº do Contrato: 053/2012

Empresa: JM Terraplenagem e Construção Ltda

Data de Início: 16/10/2012

Data prevista de conclusão: 30/06/2014

(Nono Aditivo)

Valor: R\$ 2.604.238,43+ R\$ 515.237,37

(Sétimo Aditivo) = R\$ 3.119.475,80

Recurso: Fontes 148 e 100



DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF-355 no trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Entroncamento da estaca 3 + 480 até a estaca 6+960 – Lote 2. Extensão de 3,48 km.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Executado 4% no bimestre. Acumulado 88%. Conclusão de 50% dos serviços de drenagem e obras de arte correntes. Conclusão do serviço de execução de base em brita gravada. Conclusão do serviço de imprimação. Concluído 80% do serviço de capa asfáltica.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 12% no bimestre. Acumulado 100%. Conclusão da execução de capa asfáltica; conclusão dos serviços de drenagem e obra de arte corrente; conclusão dos serviços de sinalização horizontal e vertical. Finalização completa de todos os serviços e entrega da obra.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 2

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 6º Bimestre de 2013:

- Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 53 dias, devendo expirar-se em 31/01/2014 e estende a vigência contratual para 28/02/2014 (DODF nº 260 de 06/12/2013).
- Continuação lenta do serviço de base em brita graduada
- Continuação do serviço de imprimação e pintura de ligação

➤ 1º Bimestre de 2014:

- Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 60 dias, devendo expirar-se em 01/04/2014 e estende a vigência contratual para 31/05/2014 (DODF nº 22 de 29/01/2014). Tal prorrogação se deve à falta de recursos financeiros para conclusão da obra.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 3



Programas de Trabalho:

26.782.6216.1475.3517 (2012)

26.782.6216.1475.1199 (2014)

Nº do Processo: 113.001.124/2013

(Proc. Original 113.005.389/2011)

Nº do Contrato: 053/2012

Empresa: JM Terraplenagem e Construção Ltda

Data de Início: 16/10/2012

Data prevista de conclusão: 30/06/2014

(Sétimo Aditivo)

Valor: R\$ 2.560.770,55 + R\$ 633.532,55

(Quinto Aditivo) = R\$ 3.194.303,10

Recurso: Fontes 348 e 100



DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF-355 no trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Entroncamento da estaca 6 + 960 até a estaca 10 + 440 – Lote 3. Extensão de 3,48 km.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Avanço Acumulado: 99%. Continuação dos serviços de pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, imprimação e concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Concluídos os serviços de terraplenagem.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 1% no bimestre. Acumulado 100%. Obra concluída.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 3

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 6º Bimestre de 2013:

- Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 83 dias, devendo expirar-se em 31/01/2014 e estende a vigência contratual para 28/02/2014 (DODF nº 260 de 06/12/2013).

- Esta sendo solicitado aditivo de valor no montante de R\$ 633.532,55, correspondente a 24,74% .

➤ 1º Bimestre de 2014 :

- Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 60 dias, devendo expirar-se em 31/05/2014 (DODF nº 22 de 29/01/2014 , pág. 84).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 4



Programas de Trabalho:

26.782.6216.1475.3517 (2012)

26.782.6216.1475.1199 (2014)

Nº do Processo: 113.001.125/2013

(Proc. Original 113.005.389/2011)

Nº do Contrato: 053/2012

Empresa: JM Terraplenagem e Construção Ltda

Data de início: 16/10/2012

Data prevista de conclusão: 30/06/2014

(Sétimo Aditivo)

Valor: R\$ 2.658.283,00 + R\$ 629.571,62

(Quinto Aditivo) = R\$ 3. 287.854,62

Recurso: Fontes 348 e 100



DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF-355 no trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Entroncamento da estaca 10 + 440 até o entroncamento com a DF-320 – Lote 4. Extensão de 3,48 km.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Avanço Acumulado : 99%. Continuação dos serviços de pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, imprimação e concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Concluído os serviços de terraplenagem.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 1% no bimestre. Acumulado 100%. Obra concluída.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 4

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 6º Bimestre de 2013:


- Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 83 dias, devendo expirar-se em 31/01/2014 e estende a vigência contratual para 28/02/2014 (DODF nº 260 de 06/12/2013).
- Esta sendo solicitado aditivo de valor no montante de R\$ 629.571,62, correspondente a 23,68% .

➤ 1º Bimestre de 2014:

- Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 60 dias, devendo expirar-se em 31/05/2014 (DODF nº 22 de 29/01/2014 , pág . 84).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO DF-410/ DF-345 PLANALTINA- LOTE 2

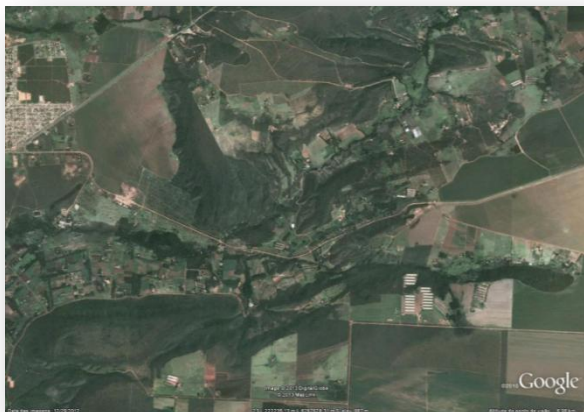

Programas de Trabalho:

26.782.6216.1475.0027(2013),

26.782.6216.1475.1199 (2013)

Nº do Processo: 113.000.768/2013

Nº do Contrato: 007/2013

Empresa: Trier Engenharia Ltda.

Data de Início: 20/03/2013

Data prevista de conclusão: Paralisado até 13/02/2014 (Quinto Aditivo)

Valor: R\$ 6.132.454,62

Recurso: Fonte 100



DESCRIÇÃO DA OBRA: Pavimentação da DF-230 no trecho compreendido entre seu entroncamento com a DF-345 até o entroncamento com a DF-410, identificado como LOTE 2 (km 13,50 ao km 19,10), até o asfalto existente (da estaca 250 a estaca 530). As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização. Extensão de Pavimentação: 5.600,00 m. (Conforme dados do Edital de Concorrência nº 006/2012).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Permanece mesmo patamar de 2013 - 92%. Aguardando empenho relativo a 2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 92%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO: DF-410/DF-345, PLANALTINA - LOTE 2

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 1º Bimestre de 2014: Aguardando empenho.
- 2º Bimestre de 2014: Aguardando empenho.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Conclusão dos serviços.

PAVIMENTAÇÃO VIA DE ACESSO A VILA BASEVI E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA.



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1475.4734 (2012)
 26.782.6216.1475.1199 (2013)
 Nº do Processo: 113.009.410/2009
 Nº do Contrato: 061/2012 - Dival Engenharia Ltda (Cancelado)
 Novo Contrato: 023/2013 - SETA Serviços de Engenharia, Terraplenagem e Administração Ltda
 Data de início: 12/07/2013
 Data prevista de conclusão: 31/01/2014
 Valor: R\$ 1.732.147,49 + 413.252,53 (Segundo Aditivo)
 Recurso: Fonte 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Pavimentação via de acesso a Vila Basevi e implantação de ciclovia.
 Concorrência Nº 003/2012.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Executado 1% no bimestre. Acumulado 99%. Conclusão dos serviços de drenagem; Início das obras complementares (plantio de mudas). Andamento normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:
 Conclusão da obra.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
1%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

100%	%	%	%	%	%
------	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO VIA DE ACESSO A VILA BASEVI E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA.

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤4º Bimestre de 2013: Assinatura do novo contrato (023/2013) com a 2ª colocada no processo licitatório - SETA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

➤6º Bimestre de 2013:

- Conclusão dos serviços de drenagem;
- Início das obras complementares (plantio de mudas).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

RESTAURAÇÃO DA DF-345



Programas de Trabalho:
 26.782.6216.1475.3515 (2013)
 26.782.6216.1475.1199 (2014)
 (Segundo Aditivo)
 Nº do Processo: 113.008.569/2012
 Nº do Contrato: 035/2013
 Empresa: JM Terraplenagem e Construção Ltda.
 Data de Início: 11/10/2013
 Data prevista de conclusão: 31/07/2014
 (Quarto Aditivo)
 Valor: R\$ 6.823.971,05 + R\$ 673.484,14
 (Terceiro Aditivo) = R\$ 7.497.455,19
 Recurso: Fontes 348 e 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da DF-345 e implantação das interseções desta com as rodovias DF-205 e VC-111 no trecho compreendido do entroncamento com a BR-010 (A)/Divisa GO/DF ao entroncamento com a BR-020, com extensão de 11 km.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Executado 30,54% no bimestre. Acumulado 39,54%. Os serviços executados foram os mesmo do bimestre anterior incluindo o canteiro de obras e sinalização da obra.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 11,43% no bimestre. Acumulado 50,97%.

Foram concluídos os seguintes serviços na pista existente:

- Remoção do pavimento;
- Estabilização da base;
- Execução da câmara anti-trinca;
- Camada de Bider

Serviços em andamento:

- Capa da pista existente;
- Serviços de drenagem;
- Terraplenagem nas interseções com a DF-205 e DF-111.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
30,54%	11,43%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
39,54%	50,97%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

RESTAURAÇÃO DA DF-345

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 1º Bimestre de 2014: Há interferência com a CEB no local de implantação da interseção com a DF-205.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

➤ Dar continuidade aos serviços.

PAVIMENTAÇÃO VC-533, LIGAÇÃO DE BRAZLÂNDIA A PADRE LÚCIO



Programa de Trabalho:
 28.782.6216.1475.1199
 Nº do Processo: 113.005.439/2012
 Nº do Contrato: 039/2013
 Empresa: NG Engenharia e Construções Ltda
 Data de Início: 22/11/2013
 Data prevista de conclusão: 150 dias
 (contados da data do recebimento da IS pela contratada)
 Valor: R\$ 5.405.070,40
 Recurso: Fonte100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de obras para pavimentação de toda a extensão da rodovia vicinal VC-533, além de implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre o seu entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF/180 e a divisa com estado do Goiás (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio). Extensão de 3,852 km. Cc nº 005/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Obra não iniciada. Aguardando emissão da ordem de serviço para dar início aos serviços.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Obra não iniciada. Aguardando emissão da ordem de serviço para dar início aos serviços.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO VC-533, LIGAÇÃO DE BRAZLÂNDIA A PADRE LÚCIO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 1º Bimestre de 2014 :Aguardando a licença ambiental.

➤ 2º Bimestre de 2014: Não foi emitida a Ordem de Serviço devido a falta de licença ambiental.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Aguardando a Ordem de Serviço.

EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL DO TIPO PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO PIPIRIPAU NA DF-230.



Programa de Trabalho:

28.782.6216.1475.1199 (2013)

26.782.6216.3361.4359 – PEDF

(Primeiro Aditivo)

Nº do Processo: 113.008.111/2013

Nº do Contrato: 040/2013

Empresa: NG Engenharia e Construções Ltda

Data de Início: 05/12/2013

Data prevista de conclusão: 120 dias (contados da data do recebimento da IS pela contratada)

Valor: R\$ 436.767,57

Recurso: Fonte 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de alargamento de 01 ponte sobre o Rio Ribeirão Pipiripau na DF- 230, no trecho compreendido entre a DF-345 e a VC-137. TP nº 007/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Não houve avanço físico no bimestre. O projeto executivo está em análise.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 10% no bimestre. Acumulado 10%. O Projeto Executivo foi aprovado. Concluída a fundação e início dos blocos e pilares.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	10%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	10%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL DO TIPO PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO PIPIRIPAU NA DF-230.

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤1º Bimestre de 2014: Aguardando emissão da Nota de Empenho para dar início aos serviços.

➤2º Bimestre de 2014: Após a aprovação do Projeto Executivo e emissão da Nota de Empenho, foram iniciados os serviços de fundação profunda através da execução de Estaca Raiz , os serviços dos blocos de fundação e forma dos pilares.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Conclusão de toda infraestrutura.

RECUO DO ALAMBRADO DO CLUBE DO CONGRESSO PARA EXECUÇÃO DA CICLOVIA NA RODOVIA DF-009




Programa de Trabalho:
 28.782.6216.1475.1199
Nº do Processo: 113.007.159/2011
Nº do Contrato: 003/2014
Empresa: Construteq Construções, Terraplenagem e Comércio de Equipamentos Ltda.
Data de início: 14/02/2014
Data prevista de conclusão: Suspenso até 04/05/2014 (Primeiro Aditivo)
Valor: R\$ 316.065,50
Recurso: Fonte 100


DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução das obras para recuo do alambrado do Clube do Congresso para execução da ciclovia na rodovia DF-009. As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, obras complementares e sinalização. Extensão de 500 metros. TP nº 008/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Nenhum serviço realizado devido a problemas no Projeto Executivo face à execução da obra.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

RECUO DO ALAMBRADO DO CLUBE DO CONGRESSO PARA EXECUÇÃO DA CICLOVIA NA RODOVIA DF-009

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 2º Bimestre de 2014:

- Devido a incoerências encontradas entre o Projeto Executivo e o local previsto para a implantação da obra, o executor do contrato solicitou que fosse averiguado pela Superintendência Técnica (SUTEC) do DER todo o projeto. Foi solicitado também a paralisação do contrato até que todas as incompatibilidades fossem totalmente sanadas.
- DODF nº 90, de 08/05/2014, suspende a execução dos serviços, a partir de 04/04/2014, encerrando-se a suspensão em 04/05/2014.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO DA VIA MARGINAL DF-095 (EPCL)



Programa de Trabalho:
 28.782.6216.1475.1199
 Nº do Processo: 113.015.251/2013
 Nº do Contrato: 011/2014
 Empresa: LTEC –Laboratório Técnico e Engenharia S/S Ltda.
 Data de início: 06/03/2014
 Data prevista de conclusão: 30 dias (contados do recebimento da IS pela Contratada)
 Valor: R\$ 14.500,00
 Recurso: Fonte 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução dos serviços geotécnicos, constantes de sondagem para reconhecimento do solo da obra de implantação da via marginal da DF-095 (EPCL), nas imediações do Córrego Vicente Pires.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:
 Estudos 100% concluídos. Os serviços geotécnicos foram entregues e aprovados.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	100%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	100%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO DA VIA MARGINAL DF-095 (EPCL)


COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 2º Bimestre de 2014:

- Os serviços geotécnicos, constantes de sondagem para reconhecimento do solo da Obra DF-095, foram entregues e aprovados antes da data prevista de 24 de abril de 2014 constante na IS.
- Em fase de elaboração o Termo de Encerramento do contrato.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE EIA/RIMA, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS ENTRE AS CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E PLANO PILOTO – CORREDOR EIXO NORTE.

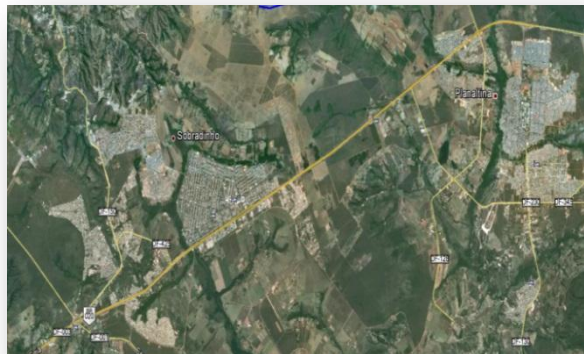

Programa de Trabalho:
26.782.6216.1968.0013 (2012)
Nº do Processo: 113.009.340/2011
Nº do Contrato: 063/2012
Empresa: Consórcio DF Interligado
Data de Início: 26/11/2012
Data prevista de conclusão: 30/09/2014
(Primeiro Aditivo)
Valor: R\$ 12.251.695,70
Recurso: Fonte 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Projeto Executivo de Engenharia e de EIA/RIMA, destinados à implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto – Corredor Eixo Norte.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:
Executado 0% no bimestre. Acumulado 66,24%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:
Executado 0% no bimestre. Acumulado 66,24%. Permanece o mesmo patamar do 1º bimestre.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
66,24%	66,24%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

**PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE EIA/RIMA, DESTINADOS À
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
ENTRE AS CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E PLANO PILOTO –
CORREDOR EIXO NORTE.**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 1º Bimestre de 2014: Não houve relatório novo, apenas correções.

➤ 2º Bimestre de 2014:

- O Projeto Básico entregue dia 28/02/2014 foi analisado e aguarda as correções solicitadas.
- Primeiro Aditivo: Prorrogação do prazo de execução por 133 dias, devendo expirar-se em 31/08/2014, estendendo-se a vigência contratual para 30/09/2014 (assinatura do aditivo em 17/04/2014).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EIA/RIMA, DESTINADO AO CORREDOR EIXO SUDOESTE.



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1968.0013
Nº do Processo: 113.001.608/2013
Nº do Contrato: 036/2013
Empresa: ITEC Infra Tech Engenharia e Consultoria S.A
Data de início: 17/10/2013
Data prevista de conclusão: 15 meses (contados da data do recebimento da IS pela contratada)
Valor: R\$ 9.681.024,81
Recurso: Fonte 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração de projeto executivo de engenharia e EIA/RIMA, destinado a implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Taguatinga, Núcleo Bandeirantes e o Plano Piloto – Corredor Eixo Sudoeste.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Executado: 8,45% Acumulado:12,50%. Etapas Realizadas:

- Relatório de Coordenação:0,32%
- Levantamento de Dados:1,47%
- Análise do Sistema: 0,57%
- Estudo de Traçado:0,33%
- Estudo Topográfico: 3,64%
- Estudos Preliminares e Estudos de Processos Futuros para ITS: 1,33%
- Diagnóstico Ambiental Preliminar da Área de Influência: 0,79%

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 9,79% no bimestre. Acumulado 22,29%. Etapas Realizadas:

- Relatório de Coordenação:1,62%
- Análise do Sistema: 2,82%
- Elaboração do Modelo Operacional do Corredor BRT do Eixo Sudoeste:3,02%
- Projeto Básico de paisagismo:0,24%
- Projeto Básico de Estações, Terminais e Garagens: 2,09%

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
8,45%	9,79%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
12,5%	22,29%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EIA/RIMA, DESTINADO AO CORREDOR EIXO SUDOESTE.

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 6º Bimestre de 2013: De acordo com o Cronograma Físico-Financeiro aprovado para o contrato, a entrega do Projeto Executivo encontra-se atrasada.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA DF-206 E DA DF-170



Programa de Trabalho:

26.782.6216.1968.0013

Nº do Processo: 113.003.206/2012

Nº do Contrato: 013/2014

Empresa: Skill Engenharia Ltda.

Data de início: 26/03/2014

Data prevista de conclusão: 300 dias (contados da data do recebimento da IS pela contratada)

Valor: R\$ 2.231.470,28

Recurso: Fonte 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração do Projeto Básico de Engenharia para Pavimentação das Rodovias: DF-206 – no trecho compreendido do entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF-180 ao entroncamento com a rodovia DF-170, incluindo-se o segmento no Estado de Goiás, numa extensão total aproximada de 19,5 km e na DF-170 – no trecho compreendido do entroncamento com a rodovia DF-206 ao entroncamento com a rodovia DF-001 (EPCT), numa extensão de 10,5 km.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:
Início da elaboração do projeto.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%
---	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA DF-206 E DA DF-170

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

EXECUÇÃO DA OBRA DE AUMENTO DE CAPACIDADE E MELHORAMENTOS NA RODOVIA DF- 047 (EPAR)



Programas de Trabalho:

26.782.6216.3207.0001 (2012)

28.782.6216.3207.0004 (2013)

Nº do Processo: 113.005.351/2011

Nº do Contrato: 062/2012

Empresa: Consórcio EPAR (Trier/Geosonda/IQS)

Data de Início: 26/11/2012

Data prevista de conclusão: 30/06/2014

Valor: R\$ 48.510.171,17 + R\$ 5.713.219,60 =
R\$ 54.223.390,77 (Quarto aditivo)

Recurso: Fontes 100, 148, 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução da obra de aumento de capacidade e melhoramento na Rodovia DF-047 (EPAR). As obras englobam os serviços de terraplanagem, pavimentação rígida e flexível, drenagem, sinalização, contenção de taludes, obras de arte especiais, obras complementares e de recuperação do meio ambiente. Extensão de 3,9 km.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Executado 15% no bimestre. Acumulado 85%. Continuação dos serviços iniciados no 6º bimestre de 2013. Conclusão da cobertura da trincheira. Início da impermeabilização da cobertura. Início do serviço de pavimentação e placas cimentícias na trincheira.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 13% no bimestre. Acumulado 98%. Foram feitos os seguintes serviços:

- Conclusão dos serviços de impermeabilização e cobertura da trincheira;
- Continuidade nos serviços de pavimentação e placas cimentícias da trincheira;
- Início do plantio de grama, colocação de calçadas e meios fios.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
15%	13%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
85%	98%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

EXECUÇÃO DA OBRA DE AUMENTO DE CAPACIDADE E MELHORAMENTOS NA RODOVIA DF- 047 (EPAR)

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 2º Bimestre de 2014: Quarto Termo Aditivo - Inclusão de itens novos e acréscimo no valor contratual (DODF nº 83, 28/04/2014).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO TRECHO DA DF-355



Programa de Trabalho:
26.782.6216.3711.6161
Nº do Processo: 113.008.887/2012
Nº do Contrato: 009/2013
Empresa: Ecotech Tecnologia Ambiental e Consultoria Ltda.
Data de início: 25/03/2013
Data prevista de conclusão: 31/07/2014
(Sexto Aditivo)
Valor: R\$ 124.937,18
Recurso: Fonte 100



DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração dos Planos de Controle Ambiental relativos à obra de pavimentação da rodovia DF-355, no trecho compreendido entre a DF-120 e a DF-320 e a obra de pavimentação da Via de Ligação entre a DF-001 (EPCT) e a Vila Basevi, conforme especificações nos anexos do Edital.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Executado 10% no bimestre. Acumulado 90%. Os produtos 1 e 2 (versões preliminares dos estudos ambientais) já foram entregues pela empresa contratada. Os dois produtos foram remetido ao IBRAM para análise, e com isso, foram solicitadas correções e complementações aos mesmos. Estas correções e complementações já foram protocoladas no órgão ambiental para análise e aprovação. A elaboração dos produtos finais pela empresa somente é possível após a manifestação final do órgão ambiental (IBRAM).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 90%. Permanece o mesmo patamar do 1º Bimestre.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO TRECHO DA DF-355

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 6º Bimestre de 2013:

- Prorrogação do prazo de execução dos serviços por 90 dias, devendo encerrar-se em 20/03/2014 e estende a vigência contratual para 30/04/2014 (DODF nº 266, 13/12/2013).
- A elaboração dos produtos finais pela empresa somente é possível após a manifestação final do órgão ambiental (IBRAM).


➤ 2º Bimestre de 2014:

- Por meio do Sexto Termo Aditivo, houve a prorrogação do prazo de execução dos serviços por 90 dias.
- A elaboração dos produtos finais pela empresa somente é possível após a manifestação final do órgão ambiental (IBRAM).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

A elaboração dos produtos finais pela empresa após a manifestação do órgão ambiental (IBRAM).

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF

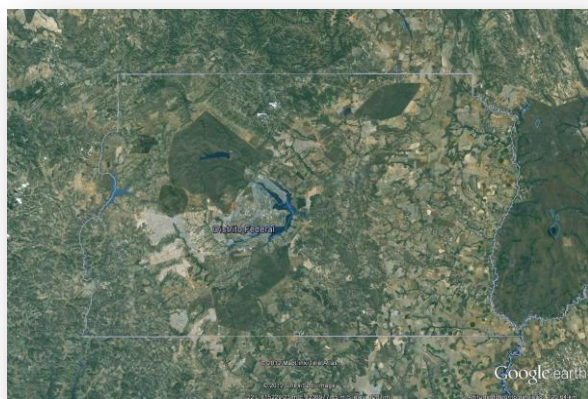

Programa de Trabalho:
 26.782.6216.3711.6162 (2013)
 RA 99 –Todo o DF
 Nº do Processo: 113.005.428/2006
 Nº do Contrato: 002/2010
 Empresa: Geo-Lógica Consultoria Ambiental
 Data de início: 19/02/2010
 Data prevista de conclusão: 31/08/2014
 (Sétimo Aditivo)
 Valor: R\$ 1.303.632,37
 Recurso: Fonte 237

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central (DF e Goiás).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:
 Executado 0% no bimestre. Permanece o mesmo patamar de 70%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:
 Executado 0% no bimestre. Permanece o mesmo patamar acumulado de 70%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

70%	70%	%	%	%	%
-----	-----	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 1º Bimestre de 2014:

- Os serviços estão divididos em 07 fases de trabalho, correspondendo à elaboração de 07 produtos: 1. Plano de Trabalho; 2. Levantamento de Informações; 3. Oficina de Planejamento; 4. Estudos para o Plano de Manejo; 5. Plano de Manejo Parcial; 6. Oficinas Participativas e 7. Plano de Manejo Final.

- O prazo de execução foi prorrogado por 180 dias.

➤ 2º Bimestre de 2014: O Produto 5 foi aprovado pelo Instituto Chico Mendes.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Concluir o Produto 6.

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001
 RA 99 – Todo o DF
 Nº do Processo: 113.000.727/2012
 Nº do Contrato: 024/2012
 Empresa: Centro Oeste Asfalto Ltda.
 Data de início: 31/07/2012
 Data prevista de conclusão: 31/07/2014
 (Primeiro Aditivo)
 Valor Inicial: R\$ 77.899,80
 Recurso: Fonte 100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Fornecimento de 8,95% de emulsão asfáltica RR-2C no bimestre.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Fornecimento de 17,55% de emulsão asfáltica RR-2C no bimestre.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001
 RA 99 – Todo o DF
 Nº do Processo: 113.000.727/2012
 Nº do Contrato: 025/2012
 Empresa: Distribuidora Brasileira de Asfaltos S/A
 Data de Início: 31/07/2012
 Data prevista de conclusão: 31/07/2014
 (Primeiro Aditivo)
 Valor Inicial: R\$ 192.000,00
 Recurso: Fonte 100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Fornecimento de 15,28% de asfalto diluído RM-1C no bimestre.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Fornecimento de 0% de asfalto diluído RM-1C no bimestre.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001
 Nº do Processo: 113.007.966/2012
 Nº do Contrato: 005/2013
 Empresa: Petroenge Engenharia S/A
 Data de Início: 19/03/2013
 Data prevista de conclusão: 18/03/2014
 Valor: R\$ 951.500,00 + R\$ 237.875,00
 (Primeiro Aditivo)
 Recurso: Fonte 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Fornecimento parcelado de 5.298 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:
 Foi consumido 42,19% do termo aditivo de R\$ 237.875,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:
 O fornecimento do material foi 100% concluído.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO DER/DF



Programa de Trabalho:
 26.451.6010.3903.9710
 Nº do Processo: 113.008.058/2012
 Nº do Contrato: 030/2013
 Empresa: Engix Construções e Serviços Ltda
 Data de Início: 18/07/2013
 Data prevista de conclusão: 12/02/2014
 Valor: R\$ 300.000,00
 Recurso: Fonte 237

DESCRIÇÃO DA OBRA: Serviços de engenharia para reformas e ampliação da infraestrutura instalada dos imóveis de responsabilidade do DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Executado 70% no bimestre. Acumulado 80%. Foram feitos os seguintes serviços: Instalação da caixa de incêndio, execução da rampa de acesso, pintura nas paredes externas, requadrção da alvenaria, assentamento das pastilhas na alvenaria posterior (nos fundos), limpeza interna, instalação do piso vinílico tipo paviflex, instalação do Dry Wall, rede de lógica e elétrica, instalação das esquadrias.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Executado 20% no bimestre. Acumulado 100%. Serviço concluído. Foram executados os seguintes serviços: Pintura, instalação dos vidros, forros mineral e luminárias.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
20%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Bimestral

100%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO DER/DF

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 5º Bimestre de 2013: Início dos serviços como tapume, serviço de incêndio, alvenaria, remoção dos vidros temperados, execução do concreto armado, contra piso.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ALAMBRADO E MURO DE DIVISA DO 5º DISTRITO RODOVIÁRIO DO DER-DF



Programa de Trabalho:
 26.451.6216.3197.0001 (2013)
 26.451.6010.1984.9792 (Primeiro Aditivo)
 Nº do Processo: 113.010.563/2011
 Nº do Contrato: 042/2013
 Empresa: Mendonça Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP
 Data de Início: 11/12/2013
 Data prevista de conclusão: 120 dias (contados da data do recebimento da IS pela contratada)
 Valor: R\$ 309.242,70
 Recurso: Fonte 100



DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução das obras de reforma e acabamento da Nova Sede do 5º Distrito Rodoviário do DER-DF, localizado na Vila São José DF-180, Km 19 – Brazlândia-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:
 Obra não iniciada.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 5,67% no bimestre. Acumulado 5,67%. Foram realizados os seguintes serviços:

- 232,36 m² de regularização de base para colocação de piso;
- 191,44 m² de colocação de piso tipo cerâmica 45x45 cm;
- 40,56 m² de colocação de piso do tipo cerâmica 33x33 cm;
- 31,96 m² de alvenaria com tijolo cerâmico;
- 44,06 m² de chapisco em parede interna;
- 44,06 m² de emboço em parede interna;
- 150,03 m² de colocação de cerâmica 33x45 cm em parede interna.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ALAMBRADO E MURO DE DIVISA DO 5º DISTRITO RODOVIÁRIO DO DER-DF

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤1º Bimestre de 2014: Nota de empenho cancelada no final de 2013. O empenho foi emitido no final do bimestre.

➤2º Bimestre de 2014:

- Um empenho parcial no valor R\$ 135.000,00 foi emitido somente em 26/02/2014, impossibilitando o início dos serviços no 1º bimestre.
- Os serviços só tiveram início no 2º bimestre. Esperamos um desembolso de aproximadamente R\$ 90.000,00 nesse bimestre, valor este, correspondente a 50% do valor contratual, já que o empenho complementar no valor de R\$ 174.242,70 foi emitido em 07/04/2014.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

CONSTRUÇÃO DA SEDE E ILUMINAÇÃO EXTERNA DO 4º DISTRITO RODOVIÁRIO DO DER/DF



Programas de Trabalho:

26.451.6216.3197.0001 (2013)

26.451.6010.1984.9792 (Primeiro Aditivo)

Nº do Processo: 113.002.641/2010

Nº do Contrato: 043/2013

Empresa: Mendonça Construtora e Incorporadora Ltda. – EPP

Data de Início: 11/12/2013

Data prevista de conclusão: 120 dias (contados da data do recebimento da IS pela contratada)

Valor: R\$ 408.254,65

Recurso: Fonte 100



DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de reforma e acabamento na nova Sede do 4º Distrito Rodoviário do DER/DF localizado no Setor de Área Especial nº 02, rodovia DF-130, km 53 – Paranoá.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Obra não iniciada. Aguardando empenho.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 3% no bimestre. Acumulado 3%. Início de reboco das paredes internas e externas do prédio.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO DA SEDE E ILUMINAÇÃO EXTERNA DO 4º DISTRITO RODOVIÁRIO DO DER/DF

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 1º Bimestre de 2014: Aguardando empenho.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Dar continuidade à obra.

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA GERÊNCIA DE CONTROLE OPERACIONAL (GECOP) – SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO DER



Programa de Trabalho:
 26.451.6010.1984.9792
 Nº do Processo: 113.003.265/2011
 Nº do Contrato: 008/2014
 Empresa: Titan Construções e Investimentos Imobiliários Ltda.
 Data de Início: 27/02/2014
 Data prevista de conclusão: 180 dias (contados da data do recebimento da IS pela contratada)
 Valor: R\$ 934.540,32
 Recurso: Fonte 100

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução das obras de construção do Edifício Sede da Gerência de Controle Operacional – GECOP da Superintendência de Trânsito.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:
 Executado 0% no bimestre. Ritmo lento devido às chuvas e à falta do serviço de terraplenagem.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	0%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	0%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

**CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA GERÊNCIA DE CONTROLE OPERACIONAL
(GECOP) – SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO DER**


COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ Devido às chuvas, o DER não pôde executar o serviço de terraplenagem e corte de árvores, o que originou um atraso no início da obra.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Com a execução do serviço de terraplenagem e corte das árvores, dar prosseguimento à obra.

DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

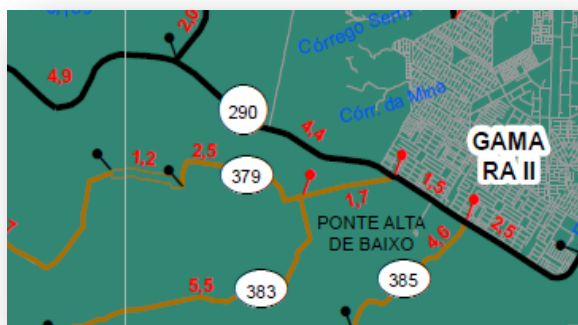

Programa de Trabalho:
26.782.6216.3361.4359
Nº do Processo: 112.002.730/2013
Nº do Contrato: 078/13 - SO
Prazo de Execução: 31/01/2014
Prazo de Vigência: 30/04/2014
Valor: R\$ 143.303,41
Recurso: Fonte 100

Portaria Conjunta nº 02, de 13 de fevereiro de 2014 (DODF nº 35, 14/02/2014)

De: UO: 26.205 – Departamento de Estradas de Rodagem – DER
UG: 200.202 - Departamento de Estradas de Rodagem – DER
Para: UO: 22.101 – Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal
UG: 190.101 - Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Descentralização de créditos orçamentários destinados a custear despesas com a contratação das obras de construção de Ponte em concreto pré-moldado protendido, localizada na DF-290 entre o km 18 e o km 20 – Ponte Alta do Gama (Ponte Recanto das Garças), no Gama/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:
Obra 100% concluída. Executada a estrutura e encabeçamento da ponte.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
100%	%	%	%	%	%	


A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

**DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA SECRETARIA DE
ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

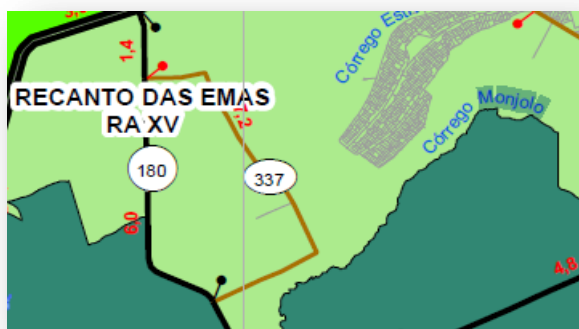

Programa de Trabalho:
26.782.6216.3361.4359
Nº do Processo: 112.004.068/2011
Nº do Contrato: 005/2014- SO
Prazo de Execução: 21/07/2014
Prazo de Vigência: 21/10/2014
Valor: R\$ 494.038,57
Recurso: Fonte 100

Portaria Conjunta nº 03, de 13 de fevereiro de 2014 (DODF nº 37, 18/02/2014)

De: UO: 26.205 – Departamento de Estradas de Rodagem – DER
UG: 200.202 - Departamento de Estradas de Rodagem – DER
Para: UO: 22.101 – Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal
UG: 190.101 - Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Descentralização de créditos orçamentários destinados a custear despesas com a contratação das obras de construção de Ponte sobre o Córrego Monjolo, localizada no Núcleo Rural Monjolo, Recanto das Emas/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:
A ser iniciada.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:
Executado 1% no bimestre. Acumulado 1%. Obra iniciada com a mobilização de equipe e instalação de container.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
0%	1%	%	%	%	%	Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
0%	1%	%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

**DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA SECRETARIA DE
ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:
