




## **Relatório de Acompanhamento Governamental – 6º Bimestre/2014**

## SOLUÇÃO INTEGRADA PARA DEPARTAMENTOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

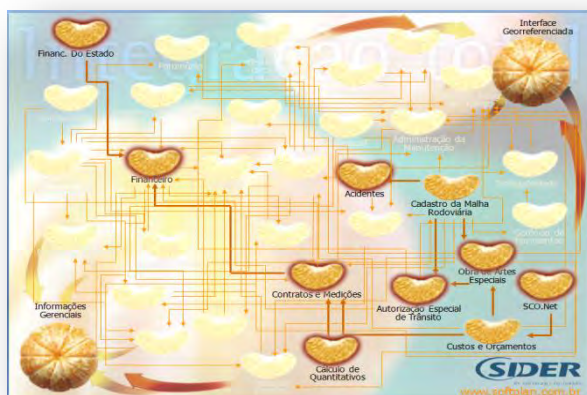

Programas de Trabalho:

26.122.6010.8517.0006 (2011),

26.122.6010.8517.0014 (2012),

26.122.6010.2557.2569 (2013)

RA 99 – Todo o DF

Nº do Processo: 113.000.376/2007

Nº do Contrato: 051/2008

Empresa: Poligraph Sistemas e Representações Ltda.

Data de início: 01/01/2009

Data prevista de conclusão: 31/12/2013

Valor: R\$ 2.727.734,84 + R\$ 80.660,68 =

R\$ 2.808.395,52 (Oitavo Aditivo)

Recurso: Fontes 100, 237, 300, 220, 420, 437

Executor: Jessé Gouveia de Oliveira

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Prestação de serviços especializados de engenharia, visando a sistematização de um modelo integrado de gestão, permitindo ao DER-DF alcançar, com base em um banco de dados unificado, melhorias sustentáveis para a gestão de contratos de obras rodoviárias, segurança de trânsito de pessoas e de cargas do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Concluída a prestação dos serviços.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| %     | %     | %     | %     | %     | %     |


**Avanço Físico Bimestral**

|      |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|
| 100% | % | % | % | % | % |
|------|---|---|---|---|---|

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO

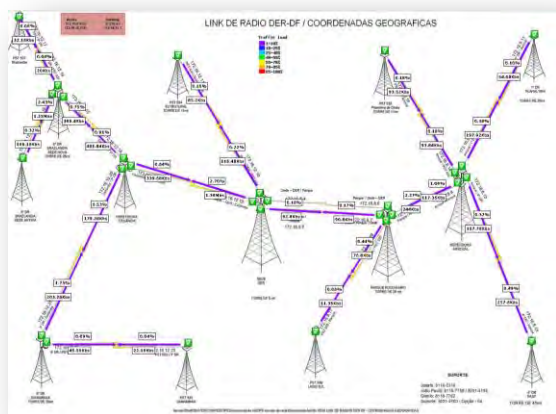

Programas de Trabalho:

26.122.2800.8517.0014 (2011)

26.122.6010.2557.2569 (2013, 2014)

Nº do Processo: 113.000.559/2011

Nº do Contrato: 025/2011

Empresa: Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda.

Data de início: 21/11/2011

Data prevista de conclusão: 20/11/2015

(Quarto Aditivo)

Valor: R\$ 306.175,68 (Quarto Aditivo)

Recurso: Fontes 100

Executor: Thiago Vinícius de Melo Almeida

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Serviços especializados de engenharia, contemplando a manutenção de sistema de comunicação de dados com todos os equipamentos de infraestrutura e serviços necessários para interligação das Unidades que compõem o complexo administrativo do DER/DF e BPRv (Batalhão de Policiamento Rodoviário). Farão parte da prestação dos serviços a manutenção, inspeção periódica dos rádios e switches e manutenção das torres de comunicação de microondas que interligam os 5 Distritos Rodoviários e os postos do BPRv com a sede do Órgão.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Ordens de serviço do mês de novembro/Assunto:

- 1410- voip; 1409 -5º DR; 1407- 3º DR; 1405- Repetidora Arrozal; 1403- 5º DR Sede antiga; 1403- Enlace 3º DR, PST532.

Ordens de serviço do mês de dezembro/Assunto:

- 1412- Antenas dos 3 e 5 distritos sem link de rádio; 1417- Antenas 5º DR e PST537; 1418- Antena de Ceilândia sem conexão de rádio; 1423- Repetidora Ceilândia; 1425- 5º DR; 1427- Rádio para o parque com problema.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| %     | %     | %     | %     | %     | %     |

**Avanço Físico Bimestral**

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % |
|---|---|---|---|---|---|

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

## CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO



Programa de Trabalho:  
26.782.6215.2460.0001(2012)  
Etapa 23 SAG 2014  
Nº do Processo: 113.008.698/2011  
Contrato: 027/2011  
Empresa: Gráfica e Editora Movimento  
Data de Início: 19/12/2011  
Data prevista de conclusão: 18/12/2015  
(Terceiro aditivo)  
Valor Inicial: R\$ 4.482.722,70  
Recurso: Fonte 237  
Executora: Eliane Cavalcante Santos


**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Prestação de serviços gráficos e diagramação de campanhas educativas de trânsito e meio ambiente, por meio de confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços gráficos.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Neste bimestre foram gastos com material educativo R\$ 456.085,59 nas campanhas “Semana Nacional de Trânsito” (material adulto e infantil), “Semana Nacional de Ciência e Tecnologia” (material infantil), Campanhas Álcool e Direção, as quais alcançaram 9.826 abordagens a adultos e 30.022 a crianças, totalizando 39.848 abordagens.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Neste bimestre foram gastos com material educativo (material infantil e campanha para motociclista) R\$ 79.605,16. Foram feitas 3.000 abordagens a adultos e 1.000 a crianças, totalizando 4.000 abordagens. Concluída a etapa de 2014.



**Avanço Físico Bimestral**



**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída



## LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO TIPO TALÃO



Programa de Trabalho:  
 26.782.6215.2541.0001 (2013)  
 Etapa 24 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.006.353/2010  
 Nº do Contrato: 031/2010  
 Empresa: Engebrás S/A Indústria, Comércio e  
 Tecnologia de Informática  
 Data de Início: 07/12/2010  
 Data prevista de conclusão: 25/06/2015  
 (Décimo Aditivo)  
 Valor dos Serviços: R\$ 642.951,60  
 (Décimo Aditivo)  
 Recurso: Fonte 237  
 Executor: Isaias Rodrigues de Oliveira


**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Locação de 50 (cinquenta) equipamentos eletrônicos do tipo Talão para captura e registro eletrônico de infrações de trânsito.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

➤ Em 2014 já foi pago: R\$ 53.579,30 (jan/14) + R\$ 53.579,30 (fev/14) + R\$ 53.579,30 (março/14) + R\$ 53.579,30 (abr/14) + R\$ 53.579,30 (maio/2014) + R\$ 44.649,00 (jun/2014) + R\$ 64.294,56 (jul/2014) + R\$ 53.579,30 (ago/2014) + R\$ 53.579,30 (set/2014) + R\$ 53.579,30 (out/2014). Total (ano/2014) = R\$ 537.577,96.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

➤ Em 2014 já foi pago: R\$ 53.579,30 (jan/14) + R\$ 53.579,30 (fev/14) + R\$ 53.579,30 (março/14) + R\$ 53.579,30 (abr/14) + R\$ 53.579,30 (maio/2014) + R\$ 44.649,00 (jun/2014) + R\$ 64.294,56 (jul/2014) + R\$ 53.579,30 (ago/2014) + R\$ 53.579,30 (set/2014) + R\$ 53.579,30 (out/2014) + R\$ 53.579,00 (nov/2014) + R\$ 53.579,00 (dez/2014). Total (ano/2014) = R\$ 644.735,96.



**Avanço Físico Bimestral**



**% Acumulativo Executado dos Serviços**

A Ser Iniciada
  Não Iniciada
  Cancelada
  Andamento Normal
  Atrasada
  Paralisada
  Concluída



Programa de Trabalho:  
26.782.6215.2541.0001  
Etapa 24 SAG 2014  
Nº do Processo: 113.001.225/2008  
Nº do Contrato: 028/2011  
Empresa: Engebrás S/A Indústria, Comércio e  
Tecnologia de Informática  
Data de Início: 23/12/2011  
Data prevista de conclusão: 23/12/2016  
(Quinto Aditivo)  
Valor: R\$ 21.979.430,01 (Quinto Aditivo)  
Recurso: Fonte 237  
Executor: Eng.º Murilo de Melo Santos

**DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO:** Monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N).

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:**  
Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 86%. Contrato em ritmo normal.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:**  
Executado 17% no bimestre. Acumulado 100% no ano. Concluída a etapa de 2014.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 16,6% | 16,6% | 16,6% | 16,6% | 16,6% | 17%   |

**Avanço Físico Bimestral**

|       |        |       |       |     |      |
|-------|--------|-------|-------|-----|------|
| 16,6% | 33,2 % | 49,8% | 66,4% | 83% | 100% |
|-------|--------|-------|-------|-----|------|

**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada
  Não Iniciada
  Cancelada
  Andamento Normal
  Atrasada
  Paralisada
  Concluída

## LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP



Programa de Trabalho:

26.782.6215.2541.0001

Etapa 24 SAG 2014

Nº do Processo: 113.010.751/2011

Nº do Contrato: 018/2012

Empresa: Lig Móvel Telecomunicações Ltda

Data de início: 06/06/2012

Data prevista de conclusão: 05/06/2014

(Primeiro Aditivo)

Valor dos Serviços: R\$ 147.696,00 + R\$

26.263,00 (Primeiro Aditivo) = R\$ 173.959,00

Recurso: Fonte 237

Executor: Isaías Rodrigues de Oliveira

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Prestação de serviço móvel especializado do tipo sistema troncalizado, e locação de equipamento de rádio comunicação para o NCOP/SUTRAN.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2014:

➤ Em 2014 já foi pago R\$ 14.162,00 (jan/14) + R\$ 14.162,00 (fev/14) + R\$ 14.162,00 (março/14) + R\$ 14.162,00 (abr/14) + R\$ 14.162,00 (maio/2014) + R\$ 2.360,33 (jun/2014). Total R\$ 73.170,33.

➤ Contrato encerrado em 05/06/2014.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| %     | %     | %     | %     | %     | %     |

**Avanço Físico Bimestral**

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| %     | %     | %     | %     | %     | %     |

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP



Programa de Trabalho:  
 26.782.6215.2541.0001  
 Etapa 24 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.003.563/2014  
 Nº do Contrato: 060/2014  
 Empresa: Lig Móvil Telecomunicações Ltda  
 Data da Assinatura do Contrato: 29/09/2014  
 Data prevista de conclusão: 28/09/2015  
 Valor dos Serviços: R\$ 1.146.696,00  
 Recurso: Fonte 237  
 Executor: Isaias Rodrigues de Oliveira

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Contratação de serviço móvel especializado (SME) do tipo sistema troncalizado digital tecnologia tetra para locação de equipamentos para Gerência de Controle Operacional da Diretoria de Fiscalização de Trânsito da Superintendência de Trânsito do DER-DF.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Já foi pago R\$ 29.664,00 (out/14 – habilitação dos rádios) Total Geral = R\$ 29.664,00.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Até hoje, já foi pago R\$ 29.664,00 (out/14 – habilitação dos rádios) + R\$ 93.086,00 (locação nov/14) + R\$ 93.086,00 (dez/14). Total Geral= R\$ 215.836,00.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| %     | %     | %     | %     | %     | %     |

**Avanço Físico Bimestral**

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
| % | % | % | % | % | % |

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída



**PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO,  
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE  
ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS**



Programa de Trabalho:  
26.782.6215.2541.0001  
Etapa 24 SAG 2014  
Nº do Processo: 113.007.132/2008  
Nº do Convênio: 001/2010  
Conveniado: Departamento de Trânsito do  
Distrito Federal - DETRAN/DF  
Data de Início: 03/12/2010  
Data prevista de conclusão: 23/05/2015  
(Quinto Aditivo)  
Recurso: Fontes 100 e 237  
Executor: Engº Murilo de Melo Santos



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** O presente Convênio tem por objetivo reduzir os níveis de acidentes nas vias urbanas e rurais do DF, tendo por objeto a delegação entre os convenientes da competência para lavratura do auto de infração de trânsito, nos limites das condições e circunstâncias fixadas neste instrumento, bem assim a cooperação mútua para a execução das seguintes atividades: Processamento de Dados, Engenharia de Tráfego, Educação no Trânsito, estatística, Monitoramento Aéreo.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:**

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 83%. Contrato em ritmo normal.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:**

Executado 17% no bimestre. Acumulado 100%. Concluída a etapa de 2014.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SITEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF



Programa de Trabalho:  
 26.782.6215.2541.0001  
 Etapa 24 SAG 2014  
 Nº do Processo: 054.001.403/2011  
 Nº do Convênio: 001/2012  
 Conveniado: Polícia Militar do Distrito Federal  
 Data de Início: 11/05/2012  
 Data prevista de conclusão: 21/05/2017  
 Recurso: Fontes 237, 437  
 Executor: Engº Murilo de Melo Santos

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 83%. Contrato em ritmo normal.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:


Executado 17% no bimestre. Acumulado 100%. Concluída a etapa de 2014.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |                                |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 16,6% | 16,6% | 16,6% | 16,6% | 16,6% | 17%   | <b>Avanço Físico Bimestral</b> |

| 1ºBim  | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |                                |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 16,6 % | 33,2% | 49,8% | 66,4% | 83%   | 100%  | <b>Avanço Físico Acumulado</b> |

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## SERVIÇO INTEGRADO MÓVEL PARA GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

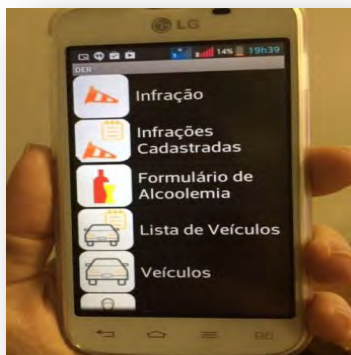

Programa de Trabalho:  
26.782.6215.2541.0001  
Etapa 24 SAG 2014  
Nº do Processo: 113.011.356/2013  
Nº do Contrato: 014/2014  
Empresa: TNL PCS S/A  
Data da Assinatura do Contrato: 28/03/2014  
Data prevista de conclusão: 28/03/2015  
Valor inicial: R\$ 976.440,00  
Recurso: Fonte 237  
Executor: Graziela de Sousa Portela

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Serviço Integrado Móvel para Gestão de Trânsito e Mobilidade – SIMGT, incluindo serviços de instalação, suporte técnico e repasse de conhecimentos para atender a necessidade do DER/DF. Equipamento do tipo celular que utiliza rede de telefonia e de internet para comunicação interna, consulta de veículo e habilitação, registro de infrações de trânsito (on line), registro de ocorrência de acidente de trânsito, emissão de ficha de missão e relatórios voltados para a fiscalização de trânsito e demais funções afins à autarquia.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:



Setembro – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

Outubro – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Novembro – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

Dezembro – Prestação dos serviços dentro da normalidade.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## MONITORAMENTO E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO



Programa de Trabalho:

26.782.6215.2541.0001

Etapa 24 SAG 2014

Nº do Processo: 113.001.811/2009

Nº do Contrato: 041/2014

Empresa: Eliseu Kopp & Cia Ltda

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2014

Data prevista de conclusão: 24/12/2016

Valor inicial: R\$ 6.445.569,64

Recurso: Fonte 237

Executor: Engº Darione José Maria Cavalcanti de Oliveira

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Prestação de serviços de monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos instalados em pontos definidos no Edital da Concorrência nº 008/2010. Complementarmente, deverão ser elaborados inventários, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos, com expedição concomitante de relatório individual para emissão de autos de infração e notificação, utilizando medidores eletrônicos de velocidade fixos de operação autônoma.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Alguns equipamentos instalados, aferidos e em operação.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Os trinta equipamentos instalados estão em operação.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim | Avanço Físico Bimestral |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| %     | %     | %     | %     | %     | %     |                         |

|   |   |   |   |   |   | Avanço Físico Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|-------------------------|
| % | % | % | % | % | % |                         |

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programas de Trabalho:  
 26.782.2800.2904.0001 (2011) e  
 26.782.6215.2904.0001 (2012),  
 Etapa 27 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.005.681/2010  
 Nº do Contrato: 011/2011  
 Empresa: Hot Cozinha Industrial  
 Data de Início: Março/ 2011  
 Data prevista de conclusão: 31/05/2015  
 (Quarto Aditivo)  
 Valor: R\$ 166.658,02 (Quarto Aditivo)  
 Recursos Fonte 237  
 Executora: Eliane Cavalcante Santos

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Lanche para as crianças das Escolas Públicas, que são levadas nos períodos matutino e vespertino, no Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o Trânsito, para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Neste 5º bimestre foram gastos R\$ 21.568,30 com lanche e foram atendidas crianças na Transitolândia e em atendimento externo nas escolas, na Semana Nacional de Trânsito e na Semana de Ciência e Tecnologia, totalizando 30.022 abordagens educativas no período de setembro/outubro.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Neste bimestre não houve solicitação de lanche para a Transitolândia. A última fatura paga em novembro, referente ao mês de outubro foi no valor de R\$ 2.862,83.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| %     | %     | %     | %     | %     | %     |

**Avanço Físico Bimestral**

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % |
|---|---|---|---|---|---|

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída



## MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programa de Trabalho:  
 26.782.6215.2904.0001  
 Etapa 27 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.012.201/2013  
 Nº do Contrato: 012/2014  
 Empresa: Travel Bus Ltda-Me  
 Data de Início: 24/03/2014  
 Data prevista de conclusão: 24/03/2015  
 Valor: R\$ 816.480,00  
 Recurso: Fonte 237  
 Executora: Eliane Cavalcante dos Santos



**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Prestação de serviço de transporte de crianças a serem atendidas pela Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia) do DER-DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2014.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Neste bimestre foram gastos com transporte de crianças à Transitolândia, na Semana Nacional de Trânsito, R\$ 99.304,38.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Neste bimestre foram gastos com o serviço de transporte R\$ 6.507,00.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO




Programa de Trabalho:  
 26.782.6215.3209.0001  
 Etapa 29 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.000.076/2013  
 Nº do Contrato: 018/2013  
 Empresa: Sitran - Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda  
 Data de Início: 03/06/2013  
 Data prevista de conclusão: 31/08/2014  
 (Segundo Aditivo)  
 Valor: R\$ 838.882,14  
 Recurso: Fonte 237  
 Executor: Engº Guilherme José da Fonseca Berniz

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Execução de sinalização para orientação de destino específica para eventos do Comitê organizador da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:**  
 Suspenso.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2014:**  
 Reativação dos serviços. Executado 12% no bimestre. Acumulado 98%, restando o pagamento da última medição.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2014:**  
 Última medição paga. 100% concluído.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO



Programa de Trabalho:  
 26.782.6515.4198.0001  
 Etapa 31 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.004.476/2006  
 Nº do Contrato: 020/2008  
 Empresa: Sitran - Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.  
 Data de Início: 01/08/2008  
 Data prevista de conclusão: 01/08/2014  
 (Sexto Aditivo)  
 Valor: R\$ 2.105.493,13 (Inicial)  
 Recurso: Fonte 237  
 Executor: Engº Carlos Alberto Mundim Pena

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Manutenção preventiva dos equipamentos do sistema semafórico operado pelo DER/DF. Concorrência nº 01/2007.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2014:

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 49,8%. Contrato em ritmo normal.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2014:

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 66,4%. Contrato encerrado em 01/08/2014. Execução normal conforme previsto. Serviço de manutenção contínua que será sucedida por novo contrato (053/2014). Considerando os bimestres, é previsto então o percentual mensal de 16,6% de execução.

| 1ºBim | 2ºBim  | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 16,6% | 16,6 % | 16,6% | 16,6% | %     | %     |

**Avanço Físico Bimestral**

|       |       |       |       |   |   |
|-------|-------|-------|-------|---|---|
| 16,6% | 33,2% | 49,8% | 66,4% | % | % |
|-------|-------|-------|-------|---|---|

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES DOS CRUZAMENTOS SEMAFÓRICOS NAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL




Programa de Trabalho:  
 26.782.6515.4198.0001  
 Etapa 31 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.011.026/2013  
 Nº do Contrato: 005/2014  
 Empresa: Sitran - Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.  
 Data de Início: 17/02/2014  
 Data prevista de conclusão: 14/09/2014  
 Valor: R\$ 68.946,50  
 Recurso: Fonte 237  
 Executor: Engº Carlos Alberto Mundim Pena


**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Substituição de 730 lâmpadas incandescentes dos cruzamentos semaforicos instalados em rodovias do Distrito Federal.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2014:**  
 Executado 40% no bimestre. Acumulado 60%. Em ritmo normal de substituição.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2014:**  
 Executado 40% no bimestre. Acumulado 100%. Todos os focos foram substituídos.



**Avanço Físico Bimestral**



**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO DO DER-DF



Programa de Trabalho:  
 26.782.6515.4198.0001  
 Etapa 31 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.006.446/2014  
 Nº do Contrato Emergencial: 053/2014  
 Empresa: Sitran - Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda  
 Data de Início: 02/08/2014  
 Data prevista de conclusão: 02/02/2015  
 Valor: R\$ 616.088,04  
 Recurso: Fonte 237  
 Executor: Engº Carlos Alberto Mundim Pena

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico do DER-DF, instalados em diversos pontos do Distrito Federal.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Executado 30% no bimestre. Acumulado 50%. Serviço de natureza contínua.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Executado 30% no bimestre. Acumulado 80%. Serviço de natureza contínua.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| %     | %     | %     | 20%   | 30%   | 30%   |

**Avanço Físico Bimestral**

|   |   |   |     |     |     |
|---|---|---|-----|-----|-----|
|   |   |   |     |     |     |
| % | % | % | 20% | 50% | 80% |

**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada
  Não Iniciada
  Cancelada
  Andamento Normal
  Atrasada
  Paralisada
  Concluída



## CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA RODOVIA DF-075 (EPNB), TRECHO ENTRE A DF-003 E A DF-079 (UPA).



Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.1347.9481  
 Etapa 36 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.007.989/2012  
 Nº do Contrato: 020/2013  
 Empresa: Rio Platense Construções, Projetos e Consultorias Ltda.  
 Data de Início: 26/06/2013  
 Data prevista de conclusão: 30/06/2014  
 (Quinto Aditivo)  
 Valor: R\$ 1.898.558,31  
 Recurso: Fonte 100 e 348 (Terceiro Aditivo)  
 Executora: Eng<sup>a</sup> Maria Luzia Ferreira Borges

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Execução de obra para construção de Obras-de-Arte Especial, do tipo passarela em estrutura mista no km 3,3 da rodovia DF-075, no trecho compreendido entre a DF-003 e a DF-079. Os serviços a serem realizados compreendem a elaboração de projeto executivo, execução de infra, meso e superestrutura das passarelas e serviços complementares (calçadas, grama, piso tátil, implantação de baia de ônibus, meio-fio, etc.), tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 009/2012.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 13,24% no bimestre. Acumulado 98%. Em fase de acabamento dos serviços complementares.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2014:

Executado 2% no bimestre. Acumulado 100%. Obra concluída.

| 1ºBim | 2ºBim  | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 6,16% | 13,24% | 2%    | %     | %     | %     |

**Avanço Físico Bimestral**

| 1ºBim  | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 84,76% | 98%   | 100%  | %     | %     | %     |

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA DF-001 (EPCT), TRECHO BR-060 E VC-331



Programa de Trabalho:

26.782.6216.1347.9481

Etapa 84 SAG 2014

Nº do Processo: 113.005.703/2011

Nº do Contrato: 032/2013

Empresa: CCL Construtora Ltda.

Data de Início: 03/09/2013

Data prevista de conclusão: 30/09/2014

(Quinto Aditivo)

Valor: R\$ 1.148.241,80

Recurso: Fonte 100

Executor: Paulo Robert Santos Machado

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Construção de Obra de Arte Especial do tipo Passarela em estrutura mista em arco na DF-001, trecho: BR-060 a VC-331 / Recanto das Emas.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2014:

Executado 33% no bimestre. Acumulado 96%. Conclusão da instalação da estrutura metálica da passarela.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2014:

Executado 2% no bimestre. Acumulado 98%. Aguardando pagamento da medição final.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Executado 2% no bimestre. Acumulado 100%. Última medição paga. Obra concluída.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10%   | 33%   | 33%   | 2%    | 2%    | %     |


**Avanço Físico Bimestral**

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30%   | 63%   | 96%   | 98%   | 100%  | %     |

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## RESTAURAÇÃO DA DF-180, TRECHO: BR-060 A BR-070, LOTE 01

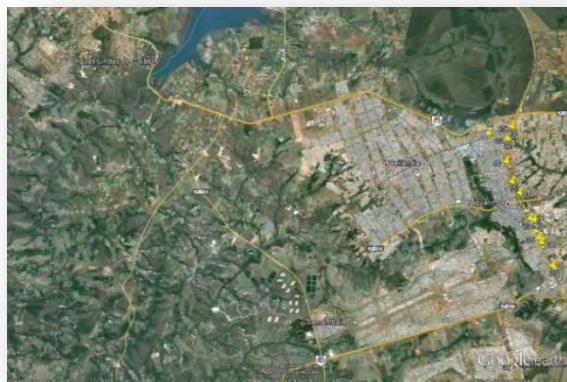

Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.1689.0005 (2012)  
 Etapa 39 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.009.792/2011  
 Nº do Contrato: 058/2012  
 Empresa: JM Terraplenagem e Construção Ltda.  
 Data de Início: 13/11/2012  
 Data prevista de conclusão: 31/03/2014  
 (Quinto Aditivo)  
 Valor: R\$ 2.335.435,89  
 Recurso: Fonte 348  
 Executor: Engº Geraldo Jacinto da Silva Filho

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Restauração da rodovia DF-180 no trecho compreendido do seu entroncamento com a BR-070/DF-190, identificado como Lote 01. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares. Extensão de 4,3 km.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:**  
 Executado 8% no bimestre. Acumulado 99%. Andamento Normal. Obra sendo finalizada.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:**  
 Obra concluída.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1%    | %     | %     | %     | %     | %     |

**Avanço Físico Bimestral**

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100%  | %     | %     | %     | %     | %     |

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF-180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO DF-190/VC-311, LOTE 02



Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.1689.0005 (2012)  
 Etapa 39 SAG 2014  
 N° do Processo: 113.009.804/2013  
 N° do Contrato: 059/2012  
 Empresa: JM Terraplenagem e Construção Ltda.  
 Data de Início: 13/11/2012  
 Data prevista de conclusão: 31/03/2014  
 (Quinto Aditivo)  
 Valor: R\$ 3.860.417,26  
 Recurso: Fonte: 348  
 Executor: Engº Geraldo Jacinto da Silva Filho

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Restauração da Rodovia DF-180, compreendido do sub-trecho DF-190 até a VC-311, identificado como Lote 02. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares. Extensão de 6,7 km.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:**  
 Executado 4% no bimestre. Acumulado 99%. Andamento normal. Obra sendo finalizada.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:**  
 Obra concluída.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1%    | %     | %     | %     | %     | %     |


**Avanço Físico Bimestral**

| 100% | % | % | % | % | % |
|------|---|---|---|---|---|
|------|---|---|---|---|---|

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF-180, COMPREENDIDO DO SUB- TRECHO VC-311/BR-060, LOTE 03

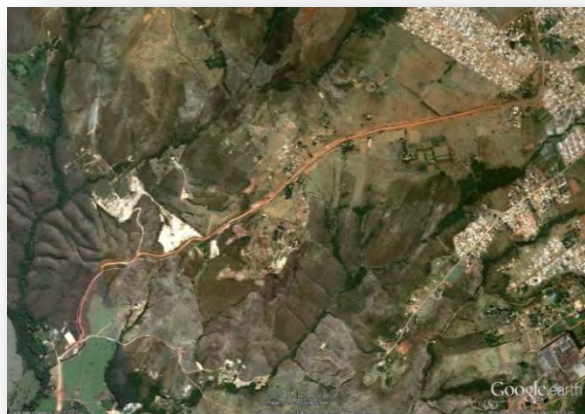

Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.1689.0005 (2012)  
 Etapa 39 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.009.805/2013  
 Nº do Contrato: 060/2012  
 Empresa: JM Terraplenagem e Construção Ltda.  
 Data de Início: 13/11/2012  
 Data prevista de conclusão: 01/03/2014  
 (Quinto Aditivo)  
 Valor: R\$ 3.106.491,96  
 Recurso: Fonte: 348  
 Executor: Engº Geraldo Jacinto da Silva Filho

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Restauração da rodovia DF-180 compreendido entre o sub-trecho da VC-311 até seu entroncamento com a BR- 060, identificado como Lote 03. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares. Extensão de 5,7 km.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:**  
 Executado 1% no bimestre. Acumulado 99%. Andamento normal. Obra sendo finalizada.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:**  
 Obra concluída.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1%    | %     | %     | %     | %     | %     |

**Avanço Físico Bimestral**

| 100% | % | % | % | % | % |
|------|---|---|---|---|---|
|------|---|---|---|---|---|

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída



## RECUPERAÇÃO DA PISTA DO BALÃO DO COLORADO E IMPLANTAÇÃO DA FAIXA DE ACELERAÇÃO NA RODOVIA DF-003 (EPIA)




Programas de Trabalho:  
 26.782.6216.1475.8121 (2012) ,  
 26.782.6216.1475.1199 (2014)  
 Etapa 70 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.008.571/2011  
 Nº do Contrato: 003/2012  
 Empresa: Consórcio RV-ARP  
 (Décimo Segundo Aditivo)  
 Data de Início: 11/04/2012  
 Data prevista de conclusão: 28/02/2015  
 (Décimo Sétimo Aditivo)  
 Valor: R\$ 5.616.681,44 + R\$ 149.017,39  
 (Décimo Sexto Aditivo)  
 Recurso: Fontes 231, 148, 348, 100  
 Executor: Engº Cristiano Alves Cavalcante

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Execução das obras de recuperação da pista do Balão do Colorado, implantação da faixa de aceleração na rodovia BR-450/DF-003 (EPIA) e a realização dos serviços complementares na DF-150, inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente. Extensão de 2.428 km.


**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:**  
 Executado 7% no bimestre. Acumulado 95%. Continuação dos serviços para execução da galeria de águas pluviais localizada no Balão do Grande Colorado, fazendo uso explosivos para realização da escavação de Mat. 3ª Categoria no Túnel N.A.T.M. e no SHAFT.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:**  
 Executado 5% no bimestre. Acumulado 100%. Conclusão dos serviços para execução da Galeria de águas pluviais localizada no Balão do Grande Colorado. Obra concluída.

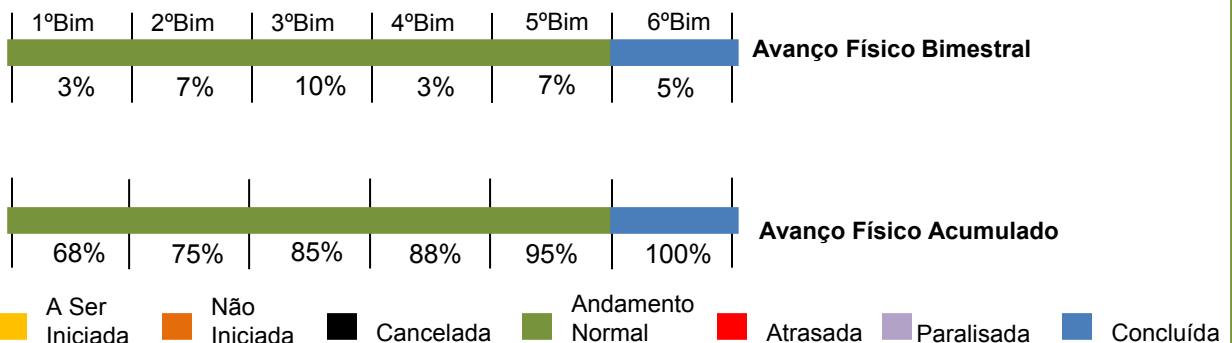



## PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 1

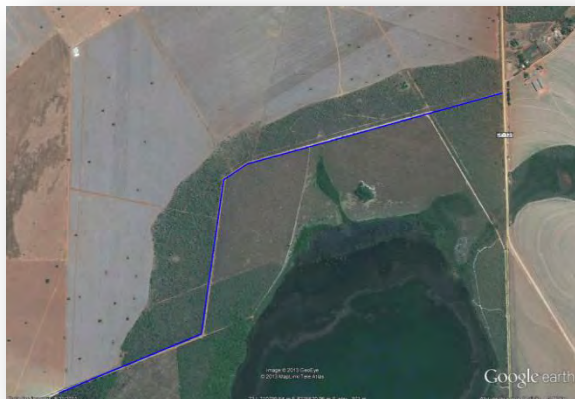

### Programas de Trabalho:

26.782.6216.1475.3517 (2012)

26.782.6216.1475.1199 (2014)

Etapa 66 SAG 2014

Nº do Processo: 113.005.389/2011

Nº do Contrato: 053/2012

Empresa: JM Terraplenagem e Construção Ltda.

Data de Início: 16/10/2012

Data prevista de conclusão: 30/06/2014

(Nono Aditivo)

Valor: R\$ 2.687.681,33 + R\$ 635.554,67

(Sétimo Aditivo) = R\$ 3.323.236,00

Recurso: Fontes 148 e 100

Executor: Engº Bruno Sousa Almeida

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Asfaltamento DF-355 no trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Entroncamento da DF-120 (estaca 0) até a estaca 3 + 480 - Lote 1. Extensão de 3,48 km.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Executado 1% no bimestre. Acumulado 93%. Conclusão de 80% dos serviços de drenagem e obras de arte especial.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 7% no bimestre. Acumulado 100%. Finalização completa de todos os serviços e entrega da obra.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2014:

Em fase de pagamento da última medição. Obra concluída.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Obra concluída.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1%    | 7%    | %     | %     | %     | %     |

**Avanço Físico Bimestral**

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 93%   | 100%  | %     | %     | %     | %     |

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 2



### Programas de Trabalho:

26.782.6216.1475.3517 (2012)

26.782.6216.1475.1199 (2014)

Etapa 67 SAG 2014

Nº do Processo: 113.001.123/2013

(Proc. Original 113.005.389/2011)

Nº do Contrato: 053/2012

Empresa: JM Terraplenagem e Construção Ltda

Data de Início: 16/10/2012

Data prevista de conclusão: 30/06/2014

(Nono Aditivo)

Valor: R\$ 2.604.238,43+ R\$ 515.237,37

(Sétimo Aditivo) = R\$ 3.119.475,80

Recurso: Fontes 148 e 100

Executor: Engº Bruno Sousa Almeida

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Asfaltamento DF-355 no trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Entroncamento da estaca 3 + 480 até a estaca 6+960 – Lote 2. Extensão de 3,48 km.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Executado 4% no bimestre. Acumulado 88%. Conclusão de 50% dos serviços de drenagem e obras de arte correntes. Conclusão do serviço de execução de base em brita gravada. Conclusão do serviço de imprimação. Concluído 80% do serviço de capa asfáltica.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:



Executado 12% no bimestre. Acumulado 100%. Conclusão da execução de capa asfáltica; conclusão dos serviços de drenagem e obra de arte corrente; conclusão dos serviços de sinalização horizontal e vertical. Finalização completa de todos os serviços e entrega da obra.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2014:

Em fase do pagamento da última medição. Obra concluída.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Obra concluída.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 3



Programas de Trabalho:

26.782.6216.1475.3517 (2012)

26.782.6216.1475.1199 (2014)

Etapa 68 SAG 2014

Nº do Processo: 113.001.124/2013

(Proc. Original 113.005.389/2011)

Nº do Contrato: 053/2012

Empresa: JM Terraplenagem e Construção Ltda

Data de Início: 16/10/2012

Data prevista de conclusão: 30/06/2014

(Sétimo Aditivo)

Valor: R\$ 2.560.770,55 + R\$ 633.532,55

(Quinto Aditivo) = R\$ 3.194.303,10

Recurso: Fontes 348 e 100

Executor: Engº Guilherme José da Fonseca  
Berniz



**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Asfaltamento DF-355 no trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Entroncamento da estaca 6 + 960 até a estaca 10 + 440 – Lote 3. Extensão de 3,48 km.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Avanço Acumulado: 99%. Continuação dos serviços de pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, imprimação e concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Concluídos os serviços de terraplenagem.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 1% no bimestre. Acumulado 100%. Obra concluída.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 4



Programas de Trabalho:

26.782.6216.1475.3517 (2012)

26.782.6216.1475.1199 (2014)

Etapa 69 SAG 2014

Nº do Processo: 113.001.125/2013

(Proc. Original 113.005.389/2011)

Nº do Contrato: 053/2012

Empresa: JM Terraplenagem e Construção Ltda.

Data de início: 16/10/2012

Data prevista de conclusão: 30/06/2014

(Sétimo Aditivo)

Valor: R\$ 2.658.283,00 + R\$ 629.571,62

(Quinto Aditivo) = R\$ 3.287.854,62

Recurso: Fontes 348 e 100

Executor: Engº Guilherme José da Fonseca  
Berniz



**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Asfaltamento DF-355 no trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Entroncamento da estaca 10 + 440 até o entroncamento com a DF-320 – Lote 4. Extensão de 3,48 km.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Avanço Acumulado : 99%. Continuação dos serviços de pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, imprimação e concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Concluído os serviços de terraplenagem.


### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 1% no bimestre. Acumulado 100%. Obra concluída.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO DF-410/ DF-345 PLANALTINA- LOTE 2

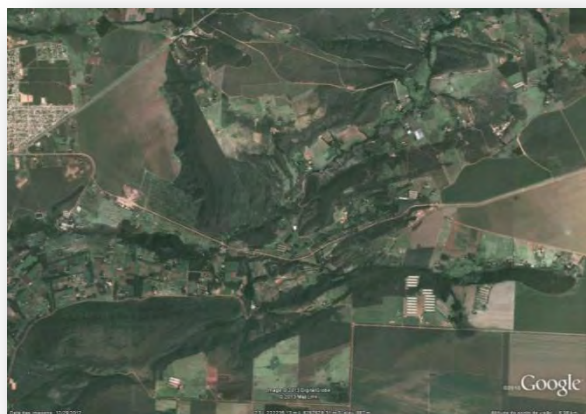

Programas de Trabalho:

26.782.6216.1475.0027(2013),

26.782.6216.1475.1199 (2013)

Etapa 37 SAG 2014

Nº do Processo: 113.000.768/2013

Nº do Contrato: 007/2013

Empresa: Trier Engenharia Ltda.

Data de Início: 20/03/2013

Data prevista de conclusão: Paralisado até 13/02/2014 (Quinto Aditivo)

Valor: R\$ 6.132.454,62

Recurso: Fonte 100

Executor: Paulo Robert Santos Machado

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Pavimentação da DF-230 no trecho compreendido entre seu entroncamento com a DF-345 até o entroncamento com a DF-410, identificado como LOTE 2 (km 13,50 ao km 19,10), até o asfalto existente (da estaca 250 a estaca 530). As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização. Extensão de Pavimentação: 5.600,00 m. (Conforme dados do Edital de Concorrência nº 006/2012).

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:



Executado 0% no bimestre. Acumulado 92%.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2014:

Executado 8% no bimestre. Acumulado 100%. Obra concluída. Em fase de pagamento da última medição.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2014:

Obra concluída.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída



## PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO A VILA BASEVI E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA.



Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.1475.4734 (2012)  
 26.782.6216.1475.1199 (2013)  
 Nº do Processo: 113.009.410/2009  
 Nº do Contrato: 061/2012 - Dival Engenharia Ltda (Cancelado)  
 Novo Contrato: 023/2013 - SETA Serviços de Engenharia, Terraplenagem e Administração Ltda  
 Data de início: 12/07/2013  
 Data prevista de conclusão: 31/01/2014  
 Valor: R\$ 1.732.147,49 + 413.252,53 (Segundo Aditivo)  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Engº Bruno Sousa Almeida

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Pavimentação da via de acesso a Vila Basevi e implantação de ciclovia., com extensão aproximada de 2,4 km tanto para a via quanto para a ciclovia. Concorrência Nº 003/2012.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:**  
 Executado 1% no bimestre. Acumulado 99%. Conclusão dos serviços de drenagem; Início das obras complementares (plantio de mudas). Andamento normal.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:**  
 Conclusão da obra.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1%    | %     | %     | %     | %     | %     |

**Avanço Físico Bimestral**

| 100% | % | % | % | % | % |
|------|---|---|---|---|---|
|------|---|---|---|---|---|

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## RESTAURAÇÃO DA DF-345



Programas de Trabalho:

26.782.6216.1475.3515 (2013)

26.782.6216.1475.1199 (2014)

(Segundo Aditivo)

Etapa 65 SAG 2014

Nº do Processo: 113.008.569/2012

Nº do Contrato: 035/2013

Empresa: JM Terraplenagem e Construção Ltda.

Data de Início: 11/10/2013

Data prevista de conclusão: 31/07/2014

(Quarto Aditivo)

Valor: R\$ 6.823.971,05 + R\$ 673.484,14

(Terceiro Aditivo) = R\$ 7.497.455,19

Recurso: Fonte 348 e 100

Executora: Engª Maria Luzia Ferreira Borges

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Restauração da DF-345 e implantação das interseções desta com as rodovias DF-205 e VC-111 no trecho compreendido do entroncamento com a BR-010 (A)/Divisa GO/DF ao entroncamento com a BR-020, com extensão de 11 km.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2014:

Executado 47,03% no bimestre. Acumulado 98%.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2014:

Executado 2% no bimestre. Acumulado 100%. Obra concluída.

| 1ºBim  | 2ºBim  | 3ºBim  | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim | Avanço Físico Bimestral |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------------------------|
| 30,54% | 11,43% | 47,03% | 2%    | %     | %     |                         |

| 1ºBim  | 2ºBim  | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim | Avanço Físico Acumulado |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| 39,54% | 50,97% | 98%   | 100%  | %     | %     |                         |

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## PAVIMENTAÇÃO VC-533, LIGAÇÃO DE BRAZLÂNDIA A PADRE LÚCIO





Programa de Trabalho:  
 28.782.6216.1475.1199  
 Etapa 86 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.005.439/2012  
 Nº do Contrato: 039/2013  
 Empresa: NG Engenharia e Construções Ltda.  
 Data da assinatura do contrato: 22/11/2013  
 Data prevista de conclusão: 27/03/2015  
 Valor: R\$ 5.405.070,40  
 Recurso: Fonte100  
 Executor: Engº Antônio Gomes da Silva Filho

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Execução de obras para pavimentação de toda a extensão da rodovia vicinal VC-533, além de implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre o seu entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF/180 e a divisa com estado do Goiás (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio). Extensão de 3,852 km. Cc nº 005/2013.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:**  
 Executado 15% no bimestre. Acumulado 15%. Foram realizados os seguintes serviços: limpeza, início da terraplenagem e execução de bueiros de 1000.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:**  
 Executado 5% no bimestre. Acumulado 20%. Início da drenagem e continuação da terraplenagem e do subleito.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL DO TIPO PONTE SOBRE O RIO RIBEIRÃO PIPIRIPAU NA DF-230.



Programa de Trabalho:  
 28.782.6216.1475.1199 (2013)  
 26.782.6216.3361.4359 – PEDF  
 (Primeiro Aditivo)  
 Etapa 47 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.008.111/2013  
 Nº do Contrato: 040/2013  
 Empresa: NG Engenharia e Construções Ltda  
 Data de Início: 05/12/2013  
 Data prevista de conclusão: 31/10/2014  
 (Segundo Aditivo)  
 Valor: R\$ 436.767,57  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Paulo Robert Santos Machado

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Execução de alargamento de 01 ponte sobre o Rio Ribeirão Pipiripau na DF- 230, no trecho compreendido entre a DF-345 e a VC-137. TP nº 007/2013.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 10% no bimestre. Acumulado 10%. O Projeto Executivo foi aprovado. Concluída a fundação e início dos blocos e pilares.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2014:


Executado 85% no bimestre. Acumulado 95%, restando apenas a laje de transição, ou seja, foi executada toda estrutura da ponte.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2014:


Executado 3% no bimestre. Acumulado 98%. Foi concretada a laje de transição.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Executado 2% no bimestre. Acumulado 100%. Obra concluída.



**Avanço Físico Bimestral**



**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## RECUO DO ALAMBRADO DO CLUBE DO CONGRESSO PARA EXECUÇÃO DA CICLOVIA NA RODOVIA DF-009



Programa de Trabalho:  
 28.782.6216.1475.1199  
 Etapa 87 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.007.159/2011  
 Nº do Contrato: 003/2014  
 Empresa: Construteq Construções,  
 Terraplenagem e Comércio de Equipamentos  
 Ltda.  
 Data de início: 14/02/2014  
 Data prevista de conclusão: Paralisado até  
 06/10/2014 (Terceiro Aditivo)  
 Valor: R\$ 316.065,50  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Engº Bruno Sousa Almeida



**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Execução das obras para recuo do alambrado do Clube do Congresso para execução da ciclovia na rodovia DF-009. As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, obras complementares e sinalização. Extensão de 500 metros. TP nº 008/2013.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Nenhum serviço realizado devido a problemas no Projeto Executivo face à execução da obra.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Contrato rescindido unilateralmente.



A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída



## ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO DA VIA MARGINAL DF-095 (EPCL)



Programa de Trabalho:  
28.782.6216.1475.1199  
Etapa 75 SAG 2014  
Nº do Processo: 113.015.251/2013  
Nº do Contrato: 011/2014  
Empresa: LTEC –Laboratório Técnico e Engenharia S/S Ltda.  
Data de início: 06/03/2014  
Data prevista de conclusão: 30 dias (contados do recebimento da IS pela Contratada)  
Valor: R\$ 14.500,00  
Recurso: Fonte 100  
Executor: Rogério Soares dos Santos

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Execução dos serviços geotécnicos, constantes de sondagem para reconhecimento do solo da obra de implantação da via marginal da DF-095 (EPCL), nas imediações do Córrego Vicente Pires.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Estudos 100% concluídos. Os serviços geotécnicos foram entregues e aprovados.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| %     | 100%  | %     | %     | %     | %     |


**Avanço Físico Bimestral**

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| %     | 100%  | %     | %     | %     | %     |

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## RECUPERAÇÃO DA DF-290

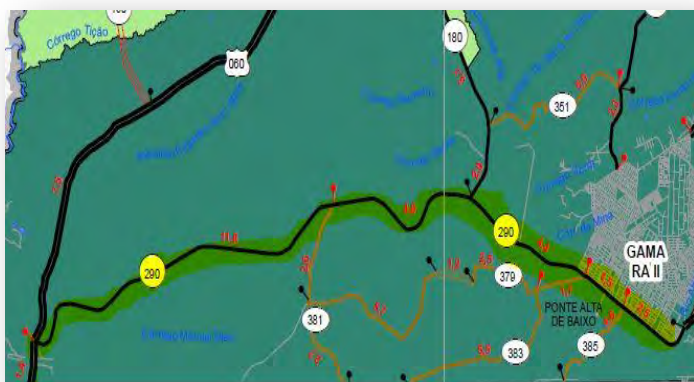

Programa de Trabalho:  
26.782.6216.1475.1199  
Etapa 78 SAG 2014  
Nº do Processo: 113.000.420/2013  
Nº do Contrato: 015/2014  
Empresa: EPC Construções Ltda.  
Data de Início: 25/04/2014  
Data prevista de conclusão: 02/01/2015  
(Terceiro Aditivo)  
Valor: R\$ 8.895.125,37 + R\$ 2.181.772,08 =  
R\$ 11.076.897,45 (Segundo Aditivo)  
Recurso: Fonte 100 e 348  
(Primeiro Aditivo)  
Executor: Paulo Robert Santos Machado

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Execução das obras de restauração da rodovia DF-290 e acostamentos, no trecho do entroncamento da BR-060 com o km 25,1. As obras previstas englobam de pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização. Extensão de 25,1 km.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Executado 10% no bimestre. Acumulado 95%. Foi executado 100% da capa asfáltica, 100% da drenagem e 50% da sinalização.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Executado 5% no bimestre. Acumulado 100%. Obra concluída restando o pagamento da última medição.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| %     | %     | 35%   | 50%   | 10%   | 5%    |

**Avanço Físico Bimestral**

|   |   |      |      |     |      |
|---|---|------|------|-----|------|
| % | % | 35 % | 85 % | 95% | 100% |
|---|---|------|------|-----|------|

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## DUPLICAÇÃO DA DF-463



Programa de Trabalho:

26.782.6216.1475.1199

Etapa 82 SAG 2014

Nº do Processo: 113.005.051/2010

Nº do Contrato: 043/2014

Empresa: Serterra Transportes Escavações  
Terraplenagem e Pavimentação Ltda.

Data do Início: 10/07/2014

Data prevista de conclusão: Paralisado até  
13/12/2014 (Segundo Aditivo)

Valor: R\$ 6.785.814,41

Recurso: Fonte 100

Executor: Engº Guilherme José da Fonseca  
Berniz

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Execução das obras de duplicação da rodovia DF-463, adequação da rodovia e acessos aos Setores Habitacionais Mangueiral e Jardim Botânico.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Executado 10% no bimestre. Acumulado 17,35%. Continuam a serem executados os serviços preliminares e de terraplenagem e início dos serviços de sub-base.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 17,35%.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| %     | %     | %     | 7,35% | 10%   | 0%    |

**Avanço Físico Bimestral**

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim  | 6ºBim  |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| %     | %     | %     | 7,35% | 17,35% | 17,35% |

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## IMPLANTAÇÃO DA MARGINAL DA DF-480



Programa de Trabalho:  
26.782.6216.1475.1199  
Etapa 83 SAG 2014  
Nº do Processo: 113.001.927/2014  
Nº do Contrato: 046/2014  
Empresa: GW Construções e Incorporações Ltda.  
Data da Assinatura do Contrato: 22/07/2014  
Data prevista de conclusão: 04/03/2015  
Valor inicial: R\$ 4.459.511,78  
Recurso: Fonte 100  
Executor: Eli Câmara

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Execução das obras de implantação da marginal da rodovia DF-480, trecho entre a DF-001 e a UNB, com extensão de 6.0001,24 m, compreendendo eixo principal e acessos.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Executado 13% no bimestre. Acumulado 25%. Foram executados os seguintes serviços:

- Rede de drenagem de diâmetro 0,600 mm;
- Regularização e compactação de sub-leito.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:


Executado 0% no bimestre. Acumulado 25%. Aguardando empenho para continuar a execução dos serviços.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim | Avanço Físico Bimestral |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| %     | %     | %     | 12%   | 13%   | 0%    |                         |

|   |   |   |     |     |     | Avanço Físico Acumulado |
|---|---|---|-----|-----|-----|-------------------------|
| % | % | % | 12% | 25% | 25% |                         |

A Ser Iniciada
  Não Iniciada
  Cancelada
  Andamento Normal
  Atrasada
  Paralisada
  Concluída

# **PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE EIA/RIMA, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS ENTRE AS CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E PLANO PILOTO – CORREDOR EIXO NORTE.**

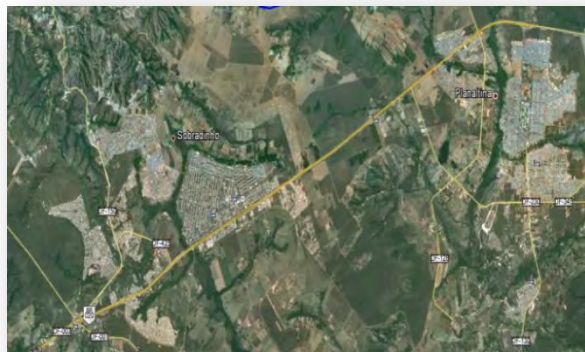

Programa de Trabalho:  
26.782.6216.1968.0013 (2012)  
Etapa 42 SAG 2014  
Nº do Processo: 113.009.340/2011  
Nº do Contrato: 063/2012  
Empresa: Consórcio DF Interligado  
Data de Início: 26/11/2012  
Data prevista de conclusão: 30/04/2015  
(Terceiro Aditivo)  
Valor: R\$ 12.251.695,70 + R\$ 233.714,04  
(Terceiro Aditivo)  
Recurso: Fonte 100  
Executora: Eng<sup>a</sup> Ery do Nascimento Brandi de Oliveira

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Projeto Executivo de Engenharia e de EIA/RIMA, destinados à implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto – Corredor Eixo Norte.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:**  
Executado 0% no bimestre. Acumulado 73,89%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:**  
Executado 9,35% no bimestre. Acumulado 83,24%.

As etapas realizadas foram: Projeto Básico de Drenagem: 0,54%; Projeto Executivo Geométrico: 1,00%; Projeto Executivo de Terraplenagem: 0,40%; Projeto Executivo de Pavimentação: 0,44%; Projeto Executivo de Obras de Arte Especiais: 0,81%; Projeto Executivo de Sinalização: 0,48%; Projeto Executivo de Obras Complementares: 0,31%; Projeto Executivo de Sistemas ITS: 2,42%; Projeto Executivo de Terminais, Estações e Garagens: 0,09%; Projeto Executivo de Desapropriações: 0,47%; Projeto Executivo de Interferências: 0,81%; Projeto Executivo de Paisagismo: 0,30%; Detalhamento de Informações das Licenças Ambientais: 0,81%; Veículos e Equipamentos: 0,47%.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0%    | 0%    | 0%    | 7,65% | 0%    | 9,35% |

**Avanço Físico Bimestral**

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 66,24% | 66,24% | 66,24% | 73,89% | 73,89% | 83,24% |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada
  Não Iniciada
  Cancelada
  Andamento Normal
  Atrasada
  Paralisada
  Concluída



## ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EIA/RIMA, DESTINADO AO CORREDOR EIXO SUDOESTE.



**Programa de Trabalho:**  
 26.782.6216.1968.0013  
**Etapa 72 SAG 2014**  
**Nº do Processo:** 113.001.608/2013  
**Nº do Contrato:** 036/2013  
**Empresa:** ITEC Infra Tech Engenharia e Consultoria S.A  
**Data de início:** 17/10/2013  
**Data prevista de conclusão:** 31/07/2015  
 (Terceiro Aditivo)  
**Valor:** R\$ 9.681.024,81  
**Recurso:** Fonte 100, 235 (Primeiro Aditivo) e 135 (Segundo Aditivo)  
**Executores:** Paula Ferri Paixão, Wilson Eulálio Porto, Samuel Dias Júnior, Luciano dos Santos  
 (Instrução de Serviço de 19/08/2014)

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Elaboração de projeto executivo de engenharia e EIA/RIMA, destinado a implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Taguatinga, Núcleo Bandeirantes e o Plano Piloto – Corredor Eixo Sudoeste.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Executado 4,8% no bimestre. Acumulado 44,82%. Etapas Realizadas:

Relatório de Coordenação: 0,95%; Elaboração do Modelo Operacional: 0,6%; Estudo de Traçado: 0,67%; Estudo Geológico-geotécnico: 1,04%; Projeto Básico Geométrico: 0,13%; Projeto Básico de Terraplenagem: 0,01%; Projeto de Drenagem: 0,21%; Projeto de Pavimentação: 0,23%; Projeto Básico de OAE: 0,71%; Projeto Básico de Sinalização: 0,25%; Projeto Básico de Interferências: 0,14%; Projeto Básico de Paisagismo: 0,16%.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Executado 13,66% no bimestre. Acumulado 58,48%. Etapas realizadas:

Relatório de Coordenação: 1,95%; Elaboração do Modelo Operacional: 1,81%; Estudo de Traçado: 0,67%; Estudo Topográfico: 1,30%; Estudo Geológico-geotécnico: 2,60%; Projeto Básico Geométrico: 0,13%; Projeto Básico de Terraplenagem: 0,01%; Projeto de Drenagem: 0,22%; Projeto de Pavimentação: 0,42%; Projeto Básico de OAE: 0,84%; Projeto Básico de Sinalização: 0,25%; Projeto Básico dos Sistemas ITS: 1,61%; Projeto Básico de Interferências: 0,14%; Projeto Básico de Paisagismo: 0,36%; Projeto Básico de Estações e Terminais: 0,45%.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim  | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim  |
|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 8,45% | 9,79% | 6,73 % | 11%   | 4,8%  | 13,66% |

**Avanço Físico Bimestral**

|       |        |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 12,5% | 22,29% | 29,02% | 40,02% | 44,82% | 58,48% |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

## PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA DF-206 E DA DF-170



Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.1968.0013  
 Etapa 81 SAG 2014  
 N° do Processo: 113.003.206/2012  
 N° do Contrato: 013/2014  
 Empresa: Skill Engenharia Ltda.  
 Data de início: 26/03/2014  
 Data prevista de conclusão: 31/03/2015  
 Valor: R\$ 2.231.470,28  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Engº Roberto Léda Saldanha  
 (Instrução de Serviço de 02/09/2014)

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Elaboração do Projeto Básico de Engenharia para Pavimentação das Rodovias: DF-206 – no trecho compreendido do entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF-180 ao entroncamento com a rodovia DF-170, incluindo-se o segmento no Estado de Goiás, numa extensão total aproximada de 19,5 km e na DF-170 – no trecho compreendido do entroncamento com a rodovia DF-206 ao entroncamento com a rodovia DF-001 (EPCT), numa extensão de 10,5 km.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 70%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 70%.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| %     | 10%   | 30%   | 30%   | 0%    | 0%    |


**Avanço Físico Bimestral**

|   |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| % | 10% | 40% | 70% | 70% | 70% |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DA DF-250

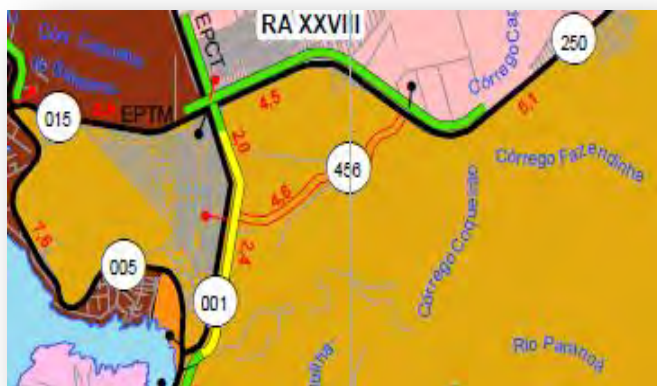

Programa de Trabalho:  
 28.782.6216.1968.0013  
 Etapa 85 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.013.987/2013  
 Nº do Contrato: 023/2014  
 Empresa: STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A  
 Data de Início: 20/05/2014  
 Data prevista de conclusão: 30/01/2015 (Terceiro Aditivo)  
 Valor: R\$ 492.214,41 + R\$ 112.645,13 = R\$ 604.859,54 (Segundo Aditivo)  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Engº Willkerson Victor da Silva

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Elaboração de projeto executivo de engenharia para duplicação da DF-250, no seguimento compreendido do entroncamento com a DF- 001 (EPCT) e DF- 015 (EPTM) até o acesso a Sobradinho dos Melos, com extensão aproximada de 5,3 km.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 69%. A Empresa estava realizando os ajustes e a fatura, citada no 4º bimestre, foi liberada no dia 11/11/2014.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Executado 21% no bimestre. Acumulado 90%. A Empresa entregou os produtos referentes ao contrato, foram analisados e foram devolvidos com as ponderações do executor para que possam ser feitos os ajustes e complementos necessários.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| %     | %     | 28%   | 41%   | 0%    | 21%   |


**Avanço Físico Bimestral**

|   |   |     |     |     |     |
|---|---|-----|-----|-----|-----|
| % | % | 28% | 69% | 69% | 90% |
|---|---|-----|-----|-----|-----|

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## EXECUÇÃO DA OBRA DE AUMENTO DE CAPACIDADE E MELHORAMENTOS NA RODOVIA DF- 047 (EPAR) – EXECUTADA PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES

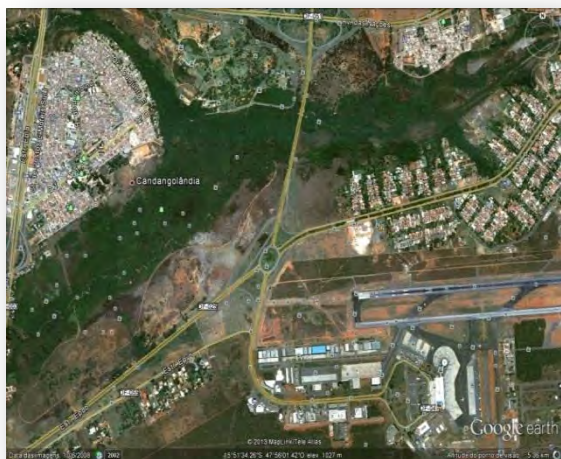

### Programas de Trabalho:

26.782.6216.3207.0001 (2012)

28.782.6216.3207.0004 (2013)

Nº do Processo: 113.005.351/2011

Nº do Contrato: 062/2012

Empresa: Consórcio EPAR (Trier/Geosonda/IQS)

Data de Início: 26/11/2012

Data prevista de conclusão: 28/09/2014

(Quinto Aditivo)

Valor: R\$ 48.510.171,17 + R\$ 5.713.219,60 = R\$

54.223.390,77 (Quarto aditivo)

Recurso: Fontes 100, 148, 348

Executores: Engº Fábio Cardoso da Silva, Engº

Geraldo Jacinto da Silva Filho, Engº Willkerson

Victor da Silva (Instrução nº 190 de 04/12/12)

(Instrução nº 186 de 22/10/14)

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Execução da obra de aumento de capacidade e melhoramento na Rodovia DF-047 (EPAR). As obras englobam os serviços de terraplanagem, pavimentação rígida e flexível, drenagem, sinalização, contenção de taludes, obras de arte especiais, obras complementares e de recuperação do meio ambiente. Extensão de 3,9 km.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2014:

Executado 13% no bimestre. Acumulado 98%. Foram feitos os seguintes serviços:

- Conclusão dos serviços de impermeabilização e cobertura da trincheira;
- Continuidade nos serviços de pavimentação e placas cimentícias da trincheira;
- Início do plantio de grama, colocação de calçadas e meios fios.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2014:

Executado 2% no bimestre. Acumulado 100%. Obra concluída.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 15%   | 13%   | 2%    | %     | %     | %     |

**Avanço Físico Bimestral**

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 85%   | 98%   | 100%  | %     | %     | %     |

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída



## ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO TRECHO DA DF-355



Programa de Trabalho:  
26.782.6216.3711.6161  
Etapa 51 SAG 2014  
Nº do Processo: 113.008.887/2012  
Nº do Contrato: 009/2013  
Empresa: Ecotech Tecnologia Ambiental e Consultoria Ltda.  
Data de início: 25/03/2013  
Data prevista de conclusão: 31/12/2014 (Oitavo Aditivo)  
Valor: R\$ 124.937,18  
Recurso: Fonte 100  
Executor: Engº Carlos Angelim

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Elaboração dos Planos de Controle Ambiental relativos à obra de pavimentação da rodovia DF-355, no trecho compreendido entre a DF-120 e a DF-320 e a obra de pavimentação da Via de Ligação entre a DF-001 (EPCT) e a Vila Basevi, conforme especificações nos anexos do Edital.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2014:


Executado 5% no bimestre. Acumulado 95%. Os produtos 1 e 2 (versões preliminares dos estudos ambientais) já foram entregues pela empresa contratada. Os dois produtos foram remetido ao IBRAM para análise, e com isso, foram solicitadas correções e complementações aos mesmos. Estas correções e complementações já foram protocoladas no órgão ambiental para análise e aprovação. Sendo que o PCA para a BASEVI foi aprovado, restando apenas o da DF-355. A elaboração do produto final do PCA/PRAD da DF-355 pela empresa somente é possível após a manifestação do órgão ambiental (IBRAM).

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2014:

Executado 3% no bimestre. Acumulado 98%. Os produtos 1 e 2 (versões preliminares dos estudos ambientais) foram aprovados pelo órgão ambiental (IBRAM), atingindo assim seu objetivo, restando agora, apenas o pagamento por parte do DER-DF dos produtos 1 e 2 versões finais.


### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Contrato concluído.

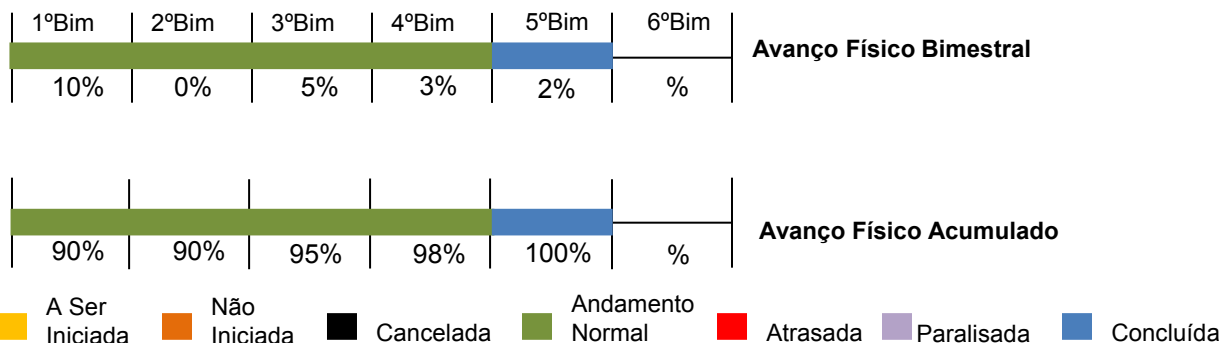



## ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF

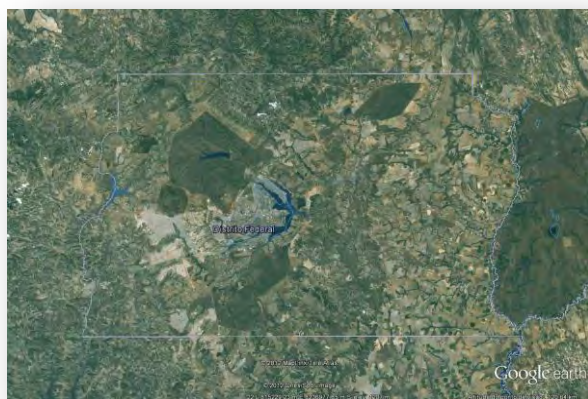

Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.3711.6162 (2013)  
 Etapa 52 SAG 2014  
 N° do Processo: 113.005.428/2006  
 N° do Contrato: 002/2010  
 Empresa: Geo-Lógica Consultoria Ambiental  
 Data de início: 19/02/2010  
 Data prevista de conclusão: 31/03/2015  
 (Oitavo Aditivo)  
 Valor: R\$ 1.303.632,37  
 Recurso: Fonte 237  
 Executor: Engº Paulo Roberto da Silva

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central ( DF e Goiás).

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:**  
 Executado 10% no bimestre. Acumulado 80%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 80%. Permanece o mesmo patamar do 5º bimestre.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0%    | 0%    | 0%    | 0%    | 10%   | 0%    |

**Avanço Físico Bimestral**

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 70% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO



Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.4195.0001  
 Etapa 55 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.000.727/2012  
 Nº do Contrato: 024/2012  
 Empresa: Centro Oeste Asfalto Ltda.  
 Data de início: 31/07/2012  
 Data prevista de conclusão: 31/08/2014  
 (Segundo Aditivo)  
 Valor Inicial: R\$ 77.899,80 + R\$ 19.475,95 =  
 R\$ 97.374,75 (Segundo Aditivo)  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Engº Luiz Geraldo Rangel Vilela


**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2014:

Fornecimento de 12,95% de emulsão asfáltica RR-2C no bimestre.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2014:

Fornecimento de 47,94% de emulsão asfáltica RR-2C no bimestre. Contrato concluído.

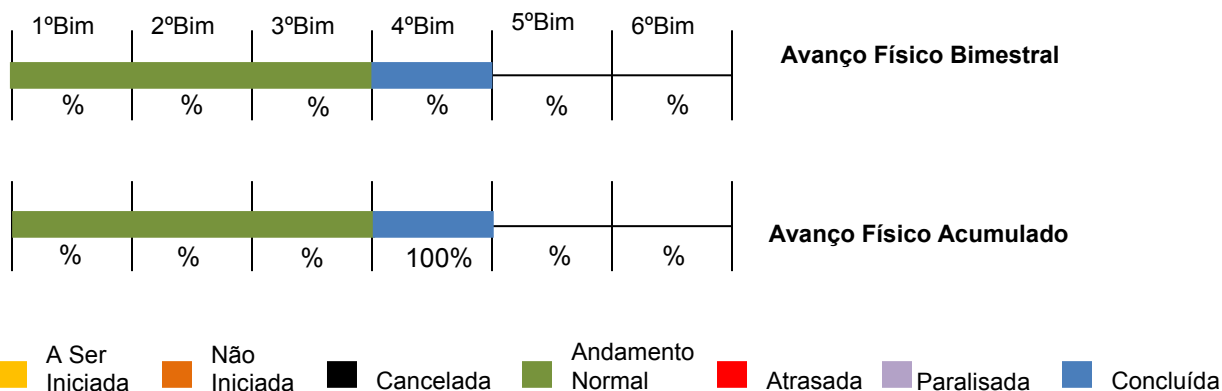

## AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO



Programa de Trabalho:

26.782.6216.4195.0001

Etapa 55 SAG 2014

Nº do Processo: 113.000.727/2012

Nº do Contrato: 025/2012

Empresa: Distribuidora Brasileira de Asfaltos S/A

Data de Início: 31/07/2012

Data prevista de conclusão: 31/07/2014

(Primeiro Aditivo)

Valor Inicial: R\$ 192.000,00

Recurso: Fonte 100

Executor: Engº Luiz Geraldo Rangel Vilela



**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2014:**

Fornecimento de 15,18% de asfalto diluído RM-1C no bimestre.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2014:**

Fornecimento de 14,58% de asfalto diluído RM-1C no bimestre. Contrato concluído.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
Andamento Normal
 Atrasada
Paralisada
Concluída

## AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO



Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.4195.0001  
 Etapa 55 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.007.966/2012  
 Nº do Contrato: 005/2013  
 Empresa: Petroenge Engenharia S/A  
 Data de Início: 19/03/2013  
 Data prevista de conclusão: 18/03/2014  
 Valor: R\$ 951.500,00 + R\$ 237.875,00  
 (Primeiro Aditivo)  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Engº Lauro de Oliveira

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Fornecimento parcelado de 5.298 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:**  
 Foi consumido 42,19% do termo aditivo de R\$ 237.875,00.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:**  
 O fornecimento do material foi 100% concluído.

| 1ºBim   | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim | Avanço Físico Bimestral |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| 42,19 % | %     | %     | %     | %     | %     |                         |

|      |   |   |   |   |   | Avanço Físico Acumulado |
|------|---|---|---|---|---|-------------------------|
| 100% | % | % | % | % | % |                         |

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA



Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.4195.0001  
 26.782.6216.1475.1199 (Primeiro Aditivo)  
 Nº do Processo: 113.002.690/2014  
 Nº do Contrato: 028/2014  
 Empresa: Ultrapav Ltda - ME  
 Data da Assinatura do Contrato: 09/05/2014  
 Data prevista de conclusão: 09/05/2015  
 Valor inicial: R\$ 2.079.989,34  
 Recurso: Fonte 100, 300, 220 e/ou 420  
 Executor: Engº Lauro de Oliveira

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de 11.622 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ para atender às demandas de tapa buracos, recapeamento asfáltico e pavimentação.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:**  
 O contrato já teve cumprido 2%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:**  
 Executado 11,7% no bimestre. Acumulado 36%.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim | Avanço Físico Bimestral |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| %     | %     | 6,3%  | 16%   | 2%    | 11,7% |                         |

|   |   |      |       |       |     | Avanço Físico Acumulado |
|---|---|------|-------|-------|-----|-------------------------|
| % | % | 6,3% | 22,3% | 24,3% | 36% |                         |

A Ser Iniciada
  Não Iniciada
  Cancelada
  Andamento Normal
  Atrasada
  Paralisada
  Concluída



## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E ENCARREGADO



Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.4195.0001  
 Etapa 55 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.000.098/2013  
 Nº do Contrato: 045/2014  
 Empresa: Interativa Dedetização, Higienização e Conservação Ltda  
 Data de Início: 22/07/2014  
 Data prevista de conclusão: 21/01/2015  
 Valor inicial: R\$ 2.751.894,00  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Engº Lauro de Oliveira

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Prestação dos serviços especializados de conservação, limpeza e manutenção simples das rodovias do Distrito Federal, nos Distritos Rodoviários, unidades Administrativas e nas Regiões de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, sob a supervisão do DER/DF.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:**  
 Executado 33% no bimestre. Acumulado 49%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:**  
 Executado 41% no bimestre. Acumulado 90%.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim | Avanço Físico Bimestral |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| %     | %     | %     | 16%   | 33%   | 41%   |                         |

|   |   |   |     |     |     | Avanço Físico Acumulado |
|---|---|---|-----|-----|-----|-------------------------|
| % | % | % | 16% | 49% | 90% |                         |

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DO DER/DF



Programa de Trabalho:  
 26.451.6010.3903.9710  
 Etapa 18 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.008.058/2012  
 Nº do Contrato: 030/2013  
 Empresa: Engix Construções e Serviços Ltda.  
 Data de Início: 18/07/2013  
 Data prevista de conclusão: 12/02/2014  
 Valor: R\$ 300.000,00  
 Recurso: Fonte 237  
 Executor: Engº Luiz Geraldo Rangel Vilela

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Serviços de engenharia para reformas e ampliação da infraestrutura instalada dos imóveis de responsabilidade do DER-DF.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2013:

Executado 70% no bimestre. Acumulado 80%. Foram feitos os seguintes serviços: Instalação da caixa de incêndio, execução da rampa de acesso, pintura nas paredes externas, requadrção da alvenaria, assentamento das pastilhas na alvenaria posterior (nos fundos), limpeza interna, instalação do piso vinílico tipo paviflex, instalação do Dry Wall, rede de lógica e elétrica, instalação das esquadrias.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Executado 20% no bimestre. Acumulado 100%. Serviço concluído. Foram executados os seguintes serviços: Pintura, instalação dos vidros, forros mineral e luminárias.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim | Avanço Físico Bimestral |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| 20%   | %     | %     | %     | %     | %     |                         |

| 100% | % | % | % | % | % | Avanço Físico Acumulado |
|------|---|---|---|---|---|-------------------------|
| 100% | % | % | % | % | % |                         |

A Ser Iniciada
  Não Iniciada
  Cancelada
  Andamento Normal
  Atrasada
  Paralisada
  Concluída

## CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ALAMBRADO E MURO DE DIVISA DO 5º DISTRITO RODOVIÁRIO DO DER-DF



Programa de Trabalho:  
 26.451.6216.3197.0001 (2013)  
 26.451.6010.1984.9792 (Primeiro Aditivo)  
 Etapa 16 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.010.563/2011  
 Nº do Contrato: 042/2013  
 Empresa: Mendonça Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP  
 Data de Início: 11/12/2013  
 Data prevista de conclusão: 30/04/2015  
 (Quinto Aditivo)  
 Valor: R\$ 309.242,70  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Engº Sérgio Henrique Rezende Valle


**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Execução das obras de reforma e acabamento da Nova Sede do 5º Distrito Rodoviário do DER-DF, localizado na Vila são José DF-180, Km 19 – Brazlândia-DF.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Executado 15,49% no bimestre. Acumulado 58,54%. Foram realizados os seguintes serviços: 3.600 m² de raspagem e limpeza manual do terreno; 64,27 m³ de escavação manual de vala; 39,20 m³ de aterro manual de vala; 69,23 m² de apiloamento de fundo de vala; 577,71 m² de alvenaria com blocos de concreto; 1.046,15 m de chapisco para parede interna ou externa.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Executado 14,66% no bimestre. Acumulado 73,2%. Foram realizados os seguintes serviços: 1 abrigo provisório metálico tipo contêiner; 1 ligação provisória (água e sanitária); 1 ligação provisória de luz; 8,4 m de impermeabilização de alicerce; 3,71 m² de regularização sarrafeada; 15,57 m² de piso cerâmico; 22,29 m² de cerâmica comum em placa 33x45 cm; 1,68 m² de porta de ferro com uma folha; 2 un. de porta de madeira interna 0,70x2,10 m; 9 un. de porta de madeira interna 0,80x2,10m; 1 un. de porta de madeira interna 1,0x2,10m; 7,68 m² de janela de alumínio tipo basculante; 38,88 m² de janela de alumínio tipo de correr; 43,14 m² de vidro temperado com graxete de neoprene e=8mm; 1 un. de porta de vidro temperado, 10 mm, 1,8x2,10 m, 2 folhas; 53m de tubo de PVC Ø 100 mm; 1 un. de caixa sifonada de PVC, 150x185x75mm; 1 un. de caixa de gordura 50x100mm; 4 un. de lavatório de louça de embutir (cuba); 1 un. de lavatório de louça sem coluna; 1 un. de cuba de aço inoxidável, 400x340x125mm; 5 un. de bacia de louça com caixa acoplada; 114,53m de impermeabilização de alicerce 186,39 m² de chapisco para parede interna ou externa.

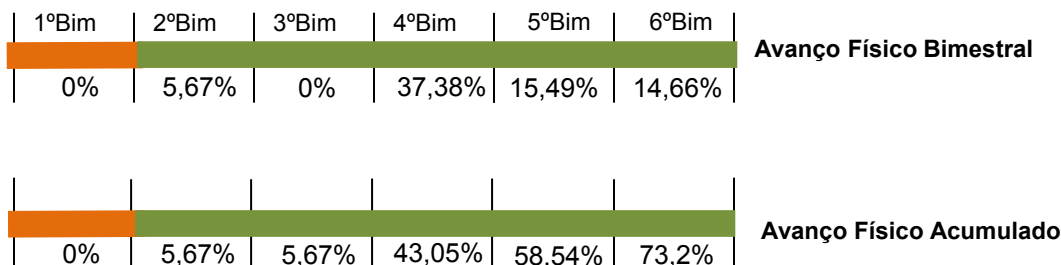

A Ser Iniciada
  Não Iniciada
  Cancelada
  Andamento Normal
  Atrasada
  Paralisada
  Concluída

## CONSTRUÇÃO DA SEDE E ILUMINAÇÃO EXTERNA DO 4º DISTRITO RODOVIÁRIO DO DER/DF





Programas de Trabalho:  
 26.451.6216.3197.0001 (2013)  
 26.451.6010.1984.9792 (Primeiro Aditivo)  
 Etapa 16 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.002.641/2010  
 Nº do Contrato: 043/2013  
 Empresa: Mendonça Construtora e Incorporadora Ltda. – EPP  
 Data de Início: 11/12/2013  
 Data prevista de conclusão: 31/01/2015  
 (Quarto Aditivo)  
 Valor: R\$ 408.254,65  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Engº José Ricardo Almeida de Brito

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Execução de reforma e acabamento na nova Sede do 4º Distrito Rodoviário do DER/DF localizado no Setor de Área Especial nº 02, rodovia DF-130, km 53 – Paranoá.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:**  
 Executado 10% no bimestre. Acumulado 55%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 55%.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA GERÊNCIA DE CONTROLE OPERACIONAL (GECOP) – SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO DER



Programa de Trabalho:  
 26.451.6010.1984.9792  
 Etapa 16 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.003.265/2011  
 Nº do Contrato: 008/2014  
 Empresa: Titan Construções e Investimentos Imobiliários Ltda.  
 Data de Início: 27/02/2014  
 Data prevista de conclusão: Suspenso até 21/03/2015 (Segundo Aditivo)  
 Valor: R\$ 934.540,32  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Engº Darione José Maria Cavalcanti de Oliveira


**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Execução das obras de construção do Edifício Sede da Gerência de Controle Operacional – GECOP da Superintendência de Trânsito.

### **AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:**

Executado 20% no bimestre. Acumulado 50%. A alvenaria foi toda levantada. Iniciou-se o chapisco e a laje está 80% concretada.

### **AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:**

Executado 0% no bimestre. Acumulado 50%. Suspensão dos serviços.

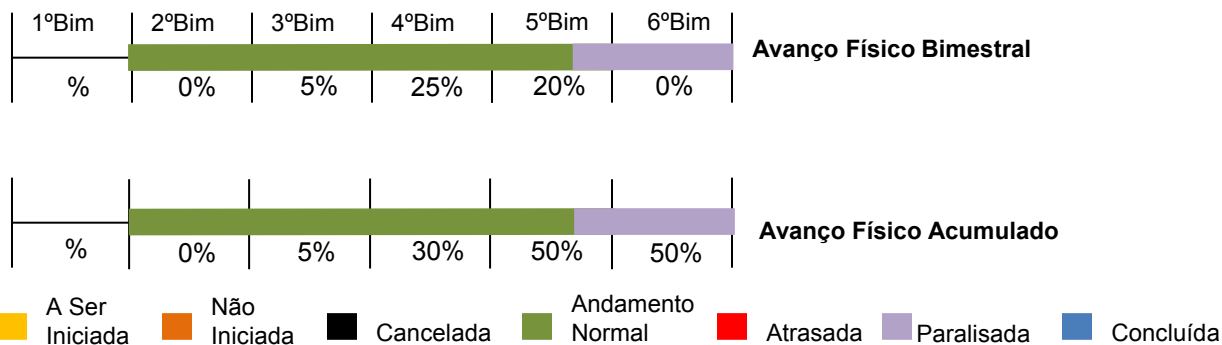



## REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 01



Programa de Trabalho:  
 26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)  
 Etapa 79 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.007.877/2012  
 Nº do Contrato: 018/2014  
 Empresa: Trier Engenharia Ltda  
 Data de Início: 13/05/2014  
 Data prevista de conclusão: 21/06/2016  
 Valor: R\$ 32.679.197,28 + R\$ 655.000,00 (Quarto Aditivo)  
 Recurso: Fonte 135, 100 (Segundo Aditivo) e 231 (Terceiro Aditivo)  
 Executores: Fábio Cardoso da Silva, Bruno Sousa Almeida e Willkerson Victor da Silva (Instrução nº 65, 19/05/14)

**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 1%. Nenhum avanço físico relevante, face que os Projetos Executivos da obra encontram-se em ajustes, devido à delimitação do Parque Nacional de Brasília (PNB), juntamente com o traçado geométrico da rodovia.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 1%. Os projetos executivos da obra ainda encontram-se em ajustes na SUTEC, uma vez que o traçado geométrico da rodovia está sobrepondo a delimitação do Parque Nacional de Brasília (PNB).

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim | Avanço Físico Bimestral |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| %     | %     | 1%    | 0%    | 0%    | 0%    |                         |

|   |   |    |    |    |    | Avanço Físico Acumulado |
|---|---|----|----|----|----|-------------------------|
| % | % | 1% | 1% | 1% | 1% |                         |

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

# REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 02



Programa de Trabalho:  
 26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)  
 Etapa 80 SAG 2014  
 Nº do Processo: 113.004.262/2014  
 Nº do Contrato: 021/2014  
 Empresa: Consórcio JM/Cidade  
 Data de Início: 14/05/2014  
 Data prevista de conclusão: 21/06/2016  
 Valor: R\$ 39.829.963,10  
 Recurso: Fonte 135, 100 (Segundo Aditivo) e 231 (Quarto Aditivo)  
 Executores: Fábio Cardoso da Silva, Jarbas Alessandro Martins da Silva e Willkerson Victor da Silva (Instrução nº 66, 19/05/14)

**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

## AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Executado 0,3% no bimestre. Acumulado 11%. Foram executados os seguintes serviços:  
 Serviços preliminares: 25%; Terraplenagem: 69%; Drenagem e obras de arte correntes: 3%; Sinalização: 3%; OAE-02 (Ponte sobre o Ribeirão do Torto): 3,5% (projeto/execução); OAE-03 (viaduto 01-Retorno 01): 0,6% (projeto); OAE-04 (viaduto 02-Retorno 01): 0,5% (projeto).

## AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Executado 8,7% no bimestre. Acumulado 19,7%. Foram executados os seguintes serviços:  
 Serviços preliminares: 30%; Terraplenagem: 70%; Drenagem e obras de arte correntes: 3,7%; sinalização: 10%; OAE-02: 13,5%, OAE-03: 0,6%; OAE-04: 0,5%.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim | Avanço Físico Bimestral |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| %     | %     | 3%    | 7,7%  | 0,3%  | 8,7%  |                         |

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim | Avanço Físico Acumulado |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| %     | %     | 3%    | 10,7% | 11%   | 19,7% |                         |

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

# DESCENTRALIZAÇÃO PARA O DER: IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE, REMODELAÇÃO DA PONTE DO BRAGHETTO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DF-002 (ERN) E DF-007 (EPTT)



Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.3056.0003  
 26.782.6216.1475.1199 (Primeiro Aditivo)  
 Nº do Processo: 113.007.878/2012  
 Nº do Contrato: 025/2014  
 Empresa: Consórcio Via Engenharia/Conterc – Construção, Terraplenagem e Consultoria Ltda.  
 Data da Assinatura do Contrato: 26/05/2014  
 Data prevista de conclusão: 04/01/2017  
 Valor inicial: R\$ 79.632.741,77  
 Recurso: Fonte 135 e 231 (Primeiro Aditivo)  
 Executores: Fábio Cardoso da Silva, Samuel Dias Júnior e Geraldo Jacinto da Silva Filho (Instrução nº 72, 29/05/14)

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Execução de obras para Implantação do Trevo de Triagem Norte (TTN), remodelação da Ponte do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego em 2,1 km da rodovia DF-007 (EPTT), no trecho compreendido entre a DF-002 e o entroncamento com a DF-003/BR-450 (Balão do Torto), e em 0,4 km da rodovia DF-002 (ERN), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-007 (ponte do Braghetto) até o acesso às vias W1/W3, execução de estrutura cicloviária, bem como a elaboração dos projetos executivos decorrentes das obras de artes especiais a serem implantadas e remodeladas. Cc nº 002/2013.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 0,3%.


**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 0,3%.

| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim | Avanço Físico Bimestral |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| %     | %     | 0,1%  | 0,2%  | 0%    | 0%    |                         |

|   |   |      |      |      |      | Avanço Físico Acumulado |
|---|---|------|------|------|------|-------------------------|
| % | % | 0,1% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |                         |

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

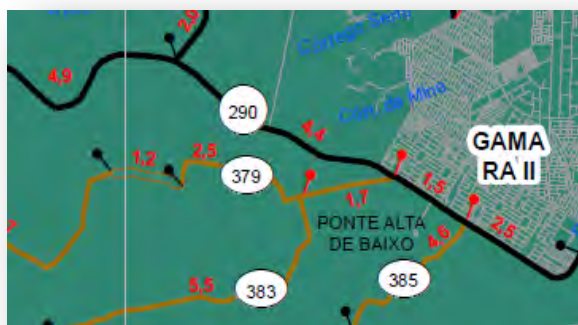

Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.3361.4359  
 Nº do Processo: 112.002.730/2013  
 Nº do Contrato: 078/13 - SO  
 Prazo de Execução: 31/01/2014  
 Prazo de Vigência: 30/04/2014  
 Valor: R\$ 143.303,41  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Engº Aires Cerchi Soares

### Portaria Conjunta nº 02, de 13 de fevereiro de 2014 (DODF nº 35, 14/02/2014)

De: UO: 26.205 – Departamento de Estradas de Rodagem – DER  
 UG: 200.202 - Departamento de Estradas de Rodagem – DER  
 Para: UO: 22.101 – Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal  
 UG: 190.101 - Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal

**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Descentralização de créditos orçamentários destinados a custear despesas com a contratação das obras de construção de Ponte em concreto pré-moldado protendido, localizada na DF-290 entre o km 18 e o km 20 – Ponte Alta do Gama (Ponte Recanto das Garças), no Gama/DF.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2014:

Obra 100% concluída. Executada a estrutura e encabeçamento da ponte.


| 1ºBim | 2ºBim | 3ºBim | 4ºBim | 5ºBim | 6ºBim | Avanço Físico Bimestral |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| %     | %     | %     | %     | %     | %     |                         |

|      |   |   |   |   |   | Avanço Físico Acumulado |
|------|---|---|---|---|---|-------------------------|
| 100% | % | % | % | % | % |                         |

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída



## DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

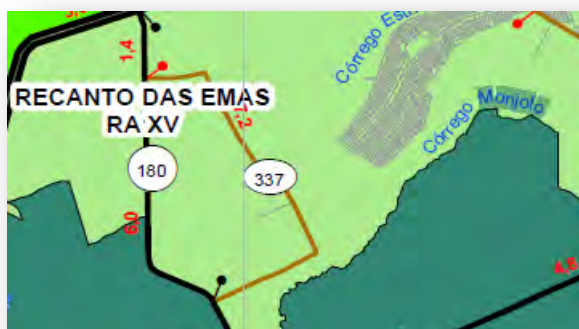

Programa de Trabalho:  
26.782.6216.3361.4359  
Nº do Processo: 112.004.068/2011  
Nº do Contrato: 005/2014- SO  
Prazo de Execução: 21/07/2014  
Prazo de Vigência: 21/10/2014  
Valor: R\$ 494.038,57  
Recurso: Fonte 100  
Executoras: Alessandra Guimarães de Oliveira Santos e Sílvia Cristina Sardinha Maia

### Portaria Conjunta nº 03, de 13 de fevereiro de 2014 (DODF nº 37, 18/02/2014)

De: UO: 26.205 – Departamento de Estradas de Rodagem – DER  
UG: 200.202 - Departamento de Estradas de Rodagem – DER  
Para: UO: 22.101 – Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal  
UG: 190.101 - Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal

**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Descentralização de créditos orçamentários destinados a custear despesas com a contratação das obras de construção de Ponte sobre o Córrego Monjolo, localizada no Núcleo Rural Monjolo, Recanto das Emas/DF, cuja meta é a construção de 101 m<sup>2</sup>.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2014:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 5%. Obra paralisada pela NOVACAP para análise dos projetos de estrutura.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 5%. Obra paralisada pela NOVACAP para aguardar Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA) do projeto de reforço da estrutura.

