




Relatório de Acompanhamento Governamental – 1º Bimestre/2015

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO

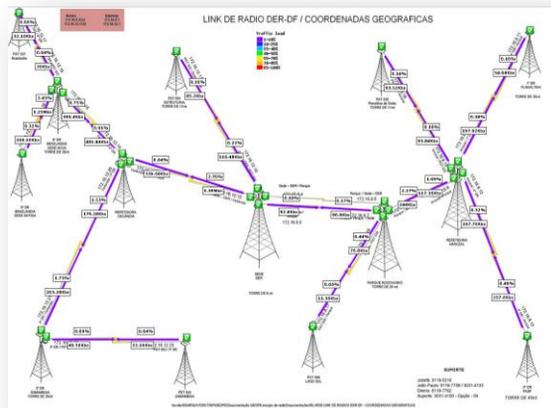

Programas de Trabalho:

26.122.2800.8517.0014 (2011)

26.122.6010.2557.2569 (2013/2014)

Etapa 6 SAG 2015

Nº do Processo: 113.000.559/2011

Nº do Contrato: 025/2011

Empresa: Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda.

Data de início: 21/11/2011

Data prevista de conclusão: 20/11/2015
(Quarto Aditivo)

Valor: R\$ 306.175,68 (Quarto Aditivo)

Recurso: Fontes 100

Executor: Thiago Vinícius de Melo Almeida

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços especializados de engenharia, contemplando a manutenção de sistema de comunicação de dados com todos os equipamentos de infraestrutura e serviços necessários para interligação das Unidades que compõem o complexo administrativo do DER/DF e BPRv (Batalhão de Policiamento Rodoviário). Farão parte da prestação dos serviços a manutenção, inspeção periódica dos rádios e switches e manutenção das torres de comunicação de micro-ondas que interligam os 5 Distritos Rodoviários e os postos do BPRv com a sede do Órgão.


AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Ordens de serviço do Mês de Janeiro:

- 1428- Repetidora Ceilândia; 1429-Antena repetidora de Ceilândia; 1434-Antena 5º DR; 1439-Antena 5º DR (sede nova); 1447- Antena arrozal; 1448- 5º DR; 1450- 3º DR.

Ordens de serviço do Mês de Fevereiro:

- 1455-Link de rádio do 1º e 4º DR com problema; 1456- Arrozal; 1457-4º DR; 1458-Repetidora da Ceilândia com problema; 1459-Antenas sede/3º e 5º DR com problema; 1460-Antenas repetidora de Ceilândia com falhas; 1461-Link de rádio do parque arrozal.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO




Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2460.0001(2012)
 Etapa 23 SAG 2014/ Etapa 10 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.008.698/2011
 Contrato: 027/2011
 Empresa: Gráfica e Editora Movimento
 Data de Início: 19/12/2011
 Data prevista de conclusão: 18/12/2015
 (Terceiro aditivo)
 Valor Inicial: R\$ 4.482.722,70
 Recurso: Fonte 237
 Executora: Eliane Cavalcante Santos

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços gráficos e diagramação de campanhas educativas de trânsito e meio ambiente, por meio de confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços gráficos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Neste bimestre foram gastos com material educativo (material infantil e campanha para motociclista) R\$ 79.605,16. Foram feitas 3.000 abordagens a adultos e 1.000 a crianças, totalizando 4.000 abordagens. Concluída a etapa de 2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Neste bimestre foram gastos com material educativo R\$ 116.731,30. A Campanha de Carnaval alcançou 91.000 motoristas e 4.500 ciclistas, totalizando 95.500 abordagens.

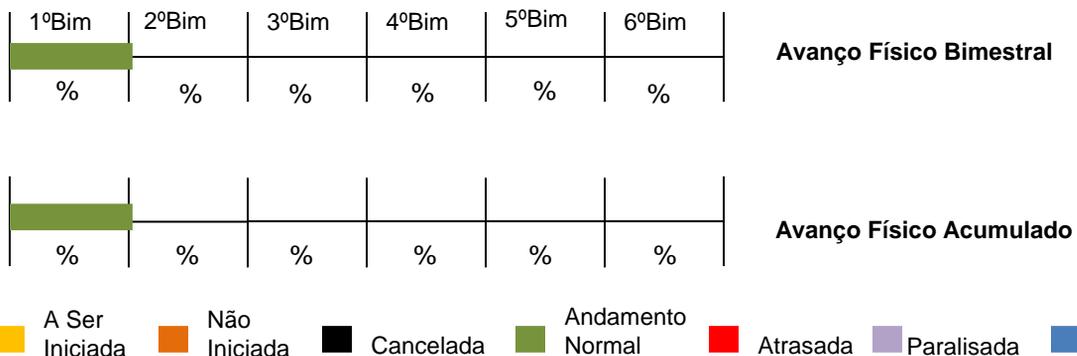




Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001
 Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.001.225/2008
 Nº do Contrato: 028/2011
 Empresa: Engebrás S/A Indústria, Comércio e
 Tecnologia de Informática
 Data de Início: 23/12/2011
 Data prevista de conclusão: 23/12/2016
 (Quinto Aditivo)
 Valor: R\$ 21.979.430,01 (Quinto Aditivo)
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Eng.º Murilo de Melo Santos

DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO: Monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Executado 16,6 % no bimestre. Acumulado 100% no ano. Concluída a etapa de 2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 16,6 % no bimestre. Acumulado 16,6%. Contrato em ritmo normal.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001
 Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.003.563/2014
 Nº do Contrato: 060/2014
 Empresa: Lig Móbile Telecomunicações Ltda
 Data da Assinatura do Contrato: 29/09/2014
 Data prevista de conclusão: 28/09/2015
 Valor dos Serviços: R\$ 1.146.696,00
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Leandro Freitas Silva


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de serviço móvel especializado (SME) do tipo sistema troncalizado digital tecnologia tetra para locação de equipamentos para Gerência de Controle Operacional da Diretoria de Fiscalização de Trânsito da Superintendência de Trânsito do DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Até hoje, já foi pago R\$ 29.664,00 (out/14 – habilitação dos rádios) + R\$ 93.086,00 (locação nov./14) + R\$ 93.086,00 (dez/14). Total Geral= R\$ 215.836,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Foi pago R\$ 93.086,00 (locação Jan/15). Total Geral pago = R\$ 308.922,00.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS



DETRAN-DF
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO DISTRITO FEDERAL




Programa de Trabalho:
26.782.6215.2541.0001
Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015
Nº do Processo: 113.007.132/2008
Nº do Convênio: 001/2010
Conveniado: Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF
Data de Início: 03/12/2010
Data prevista de conclusão: 23/05/2015 (Quinto Aditivo)
Recurso: Fontes 100, 237
Executor: Engº Murilo de Melo Santos

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: O presente Convênio tem por objetivo reduzir os níveis de acidentes nas vias urbanas e rurais do DF, tendo por objeto a delegação entre os convenientes da competência para lavratura do auto de infração de trânsito, nos limites das condições e circunstâncias fixadas neste instrumento, bem assim a cooperação mútua para a execução das seguintes atividades: Processamento de Dados, Engenharia de Tráfego, Educação no Trânsito, estatística, Monitoramento Aéreo.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
Executado 16,6 % no bimestre. Acumulado 100%. Concluída a etapa de 2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 16,6%. Contrato em ritmo normal.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF





Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001
 Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015
 Nº do Processo: 054.001.403/2011
 Nº do Convênio: 001/2012
 Conveniado: Polícia Militar do Distrito Federal
 Data de Início: 11/05/2012
 Data prevista de conclusão: 21/05/2017
 Recurso: Fontes 237, 437
 Executor: Engº Murilo de Melo Santos

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Executado 17% no bimestre. Acumulado 100%. Concluída a etapa de 2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 16,6%. Contrato em ritmo normal.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SERVIÇO INTEGRADO MÓVEL PARA GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001
 Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.011.356/2013
 Nº do Contrato: 014/2014
 Empresa: TNL PCS S/A
 Data da Assinatura do Contrato: 28/03/2014
 Data prevista de conclusão: 28/03/2015
 Valor inicial: R\$ 976.440,00
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Graziela de Sousa Portela



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Serviço Integrado Móvel para Gestão de Trânsito e Mobilidade – SIMGTM, incluindo serviços de instalação, suporte técnico e repasse de conhecimentos para atender a necessidade do DER/DF. Equipamento do tipo celular que utiliza rede de telefonia e de internet para comunicação interna, consulta de veículo e habilitação, registro de infrações de trânsito (on line), registro de ocorrência de acidente de trânsito, emissão de ficha de missão e relatórios voltados para a fiscalização de trânsito e demais funções afins à autarquia.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Novembro – Prestação dos serviços dentro da normalidade.
 Dezembro – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Janeiro – Prestação dos serviços dentro da normalidade.
 Fevereiro – Prestação dos serviços dentro da normalidade.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MONITORAMENTO E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO




Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001
Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015
Nº do Processo: 113.001.811/2009
Nº do Contrato: 041/2014
Empresa: Eliseu Kopp & Cia Ltda.
Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2014
Data prevista de conclusão: 24/12/2016
Valor inicial: R\$ 6.445.569,64
Recurso: Fonte 237
Executor: Engº Darione José Maria Cavalcanti de Oliveira

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços de monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos instalados em pontos definidos no Edital da Concorrência nº 008/2010. Complementarmente, deverão ser elaborados inventários, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos, com expedição concomitante de relatório individual para emissão de autos de infração e notificação, utilizando medidores eletrônicos de velocidade fixos de operação autônoma.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Os trinta equipamentos instalados estão em operação.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Os trinta equipamentos instalados estão em operação.

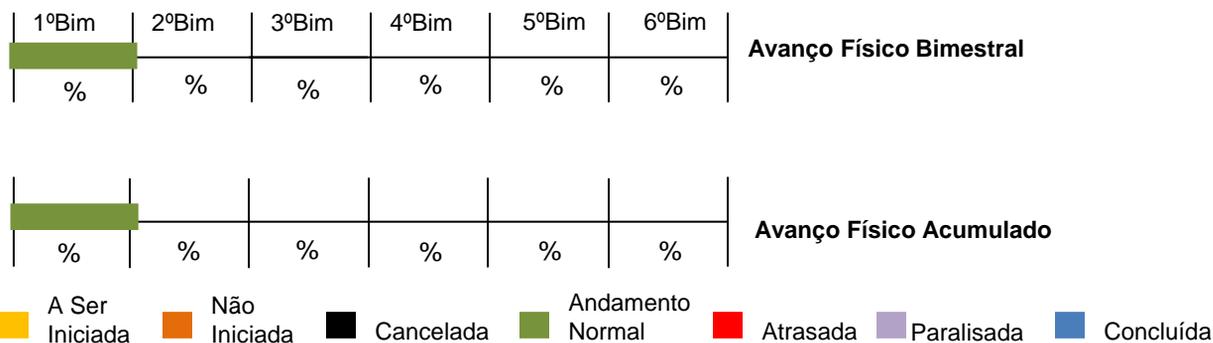

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programas de Trabalho:
 26.782.2800.2904.0001 (2011) e
 26.782.6215.2904.0001 (2012),
Etapa 27 SAG 2014/ Etapa 14 SAG 2015
Nº do Processo: 113.005.681/2010
Nº do Contrato: 011/2011
Empresa: Hot Cozinha Industrial
Data de Início: Março/ 2011
Data prevista de conclusão: 31/05/2015
 (Quarto Aditivo)
Valor: R\$ 166.658,02 (Quarto Aditivo)
Recursos : Fonte 237
Executora: Eliane Cavalcante Santos


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Lanche para as crianças das Escolas Públicas, que são levadas nos períodos matutino e vespertino, no Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o Trânsito, para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:


Neste bimestre não houve solicitação de lanche para a Transitolândia. A última fatura paga em novembro, referente ao mês de outubro foi no valor de R\$ 2.862,83.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Não houve aula nas dependências devido às férias escolares.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF





Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2904.0001
 Etapa 27 SAG 2014/ Etapa 14 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.012.201/2013
 Nº do Contrato: 012/2014
 Empresa: Travel Bus Ltda-Me
 Data de Início: 24/03/2014
 Data prevista de conclusão: 24/03/2015
 Valor: R\$ 816.480,00
 Recurso: Fonte 237
 Executora: Eliane Cavalcante dos Santos

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviço de transporte de crianças a serem atendidas pela Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia) do DER-DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Neste bimestre foram gastos com o serviço de transporte R\$ 6.507,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Neste bimestre não houve utilização do serviço com transporte de crianças à Transitolândia.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO DO DER-DF




Programa de Trabalho:
 26.782.6515.4198.0001
 Etapa 31 SAG 2014/ Etapa 13 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.006.446/2014
 Nº do Contrato Emergencial: 053/2014
 Empresa: Sitran - Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
 Data de Início: 02/08/2014
 Data prevista de conclusão: 02/02/2015
 Valor: R\$ 616.088,04
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Engº Carlos Alberto Mundim Pena

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico do DER-DF, instalados em diversos pontos do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Executado 30% no bimestre. Acumulado 80%. Serviço de natureza contínua.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 20%. Acumulado 100%. Conclusão dos serviços.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE PAINÉIS DE MENSAGENS MÓVEIS



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.3209.0001
 Nº do Processo: 113.009.643/2013
 Nº do Contrato: 066/2014
 Empresa: Talentech-Tecnologia Ltda.
 Data de Início: 15/12/2014
 Data prevista de conclusão: 15/12/2015
 Valor: R\$ 3.081.600,00
 Recurso: Fonte 237
 Executora: Tainá de Aguiar Botelho

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento, implantação, manutenção e suporte técnico de painéis de mensagens variáveis e sistema de informação e orientação aos usuários, em tempo real e repasse de conhecimento para atender às necessidades do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 0%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

0%	%	%	%	%	%
----	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída


FORNECIMENTO, ATERRAMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO NO-BREAK



Programa de Trabalho:
 26.782.6515.4198.0001 - Etapa 31 SAG 2014
 26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 12 SAG 2015
Nº do Processo: 113.007.053/2013
Nº do Contrato: 067/2014
Empresa: Sitran - Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
Data de Início: 06/02/2015
Data prevista de conclusão: 09/04/2015
Valor: R\$ 160.000,00
Recurso: Fonte 237/437
Executora: Tainá de Aguiar Botelho

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento, aterramento e instalação de 20 equipamentos do tipo no-break, destinados a atender os cruzamentos semaforicos em vias urbanas do DF, incluindo o fornecimento de mão-de-obra e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 0%.

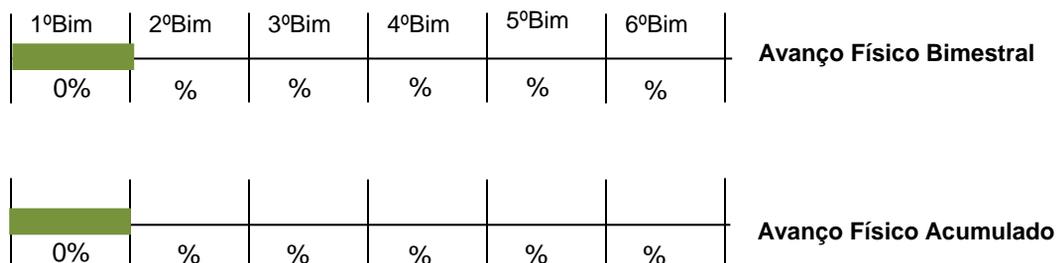

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

PAVIMENTAÇÃO VC-533, LIGAÇÃO DE BRAZLÂNDIA A PADRE LÚCIO



Programa de Trabalho:

28.782.6216.1475.1199

Etapa 86 SAG 2014/ Etapa 30 SAG 2015

Nº do Processo: 113.005.439/2012

Nº do Contrato: 039/2013

Empresa: NG Engenharia e Construções Ltda.

Data da assinatura do contrato: 22/11/2013

Data prevista de conclusão: Paralisada até 24/03/2015 (Primeiro Aditivo)

Valor: R\$ 5.405.070,40

Recurso: Fonte 100

Executor: Engº Antônio Gomes da Silva Filho


DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de obras para pavimentação de toda a extensão da rodovia vicinal VC-533, além de implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre o seu entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF/180 e a divisa com estado do Goiás (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio). Extensão de 3,852 km. Cc nº 005/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:


Executado 5% no bimestre. Acumulado 20%. Início da drenagem e continuação da terraplenagem e do subleito.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 20%.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

DUPLICAÇÃO DA DF-463




Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1475.1199
 Etapa 82 SAG 2014/ Etapa 28 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.005.051/2010
 Nº do Contrato: 043/2014
 Empresa: Serterra Transportes Escavações
 Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
 Data do Início: 10/07/2014
 Data prevista de conclusão: 31/07/2015
 (Terceiro Aditivo)
 Valor: R\$ 6.785.814,41
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº Guilherme José da Fonseca
 Berniz

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução das obras de duplicação da rodovia DF-463, adequação da rodovia e acessos aos Setores Habitacionais Mangueiral e Jardim Botânico. Extensão de 3,9 km. Cc nº 001/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 17,35%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 17,35%.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

IMPLANTAÇÃO DA MARGINAL DA DF-480




Programa de Trabalho: 26.782.6216.1475.1199
 Etapa 83 SAG 2014/ Etapa 29 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.001.927/2014
 Nº do Contrato: 046/2014
 Empresa: GW Construções e Incorporações Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 22/07/2014
 Data prevista de conclusão: Paralisada até 01/04/2015 (Segundo Aditivo)
 Valor inicial: R\$ 4.459.511,78
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº Eli Câmara

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução das obras de implantação da marginal da rodovia DF-480, trecho entre a DF-001 e a UNB, com extensão de 6.0001,24 m, compreendendo eixo principal e acessos. Cc nº 003/2014.


AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 25%. Aguardando empenho para continuar a execução dos serviços.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 25%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE EIA/RIMA, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS ENTRE AS CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E PLANO PILOTO – CORREDOR EIXO NORTE.

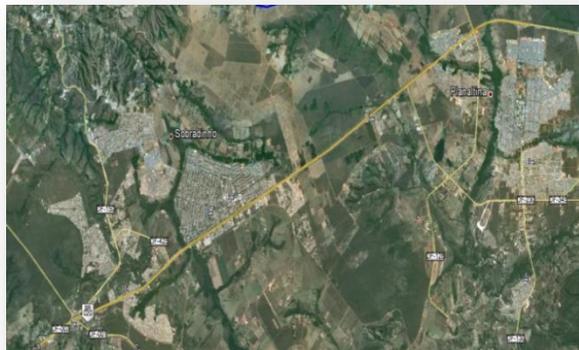

Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1968.0013 (2012)
 Etapa 42 SAG 2014/ Etapa 31 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.009.340/2011
 Nº do Contrato: 063/2012
 Empresa: Consórcio DF Interligado
 Data de Início: 26/11/2012
 Data prevista de conclusão: 30/04/2015
 (Terceiro Aditivo)
 Valor: R\$ 12.251.695,70 + R\$ 233.714,04
 (Terceiro Aditivo)
 Recurso: Fonte 100
 Executora: Eng.º Samuel Dias Júnior
 (Instrução de Serviço de 24/12/14)

DESCRIÇÃO DA OBRA: Projeto Executivo de Engenharia e de EIA/RIMA, destinados à implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto – Corredor Eixo Norte.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Executado 9,35% no bimestre. Acumulado 83,24%.

As etapas realizadas foram: Projeto Básico de Drenagem: 0,54%; Projeto Executivo Geométrico: 1,00%; Projeto Executivo de Terraplenagem:0,40%; Projeto Executivo de Pavimentação:0,44%; Projeto Executivo de Obras de Arte Especiais: 0,81%; Projeto Executivo de Sinalização: 0,48%; Projeto Executivo de Obras Complementares: 0,31%; Projeto Executivo de Sistemas ITS: 2,42%; Projeto Executivo de Terminais, Estações e Garagens: 0,09%; Projeto Executivo de Desapropriações: 0,47%; Projeto Executivo de Interferências: 0,81%; Projeto Executivo de Paisagismo: 0,30%; Detalhamento de Informações das Licenças Ambientais: 0,81%; Veículos e Equipamentos: 0,47%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 83,24%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

83,24%	%	%	%	%	%
--------	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EIA/RIMA, DESTINADO AO CORREDOR EIXO SUDOESTE.



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1968.0013
Etapa 72 SAG 2014/ Etapa 32 SAG 2015
Nº do Processo: 113.001.608/2013
Nº do Contrato: 036/2013
Empresa: ITEC Infra Tech Engenharia e Consultoria S.A
Data de início: 17/10/2013
Data prevista de conclusão: Paralisada até 26/04/2015 (Quarto Aditivo)
Valor: R\$ 9.681.024,81
Recurso: Fontes 100, 235 (Primeiro Aditivo), 135 (Segundo Aditivo)
Executores: Paula Ferri Paixão, Wilson Eulálio Porto, Samuel Dias Júnior, Luciano dos Santos (Instrução de Serviço de 19/08/2014)


DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração de projeto executivo de engenharia e EIA/RIMA, destinado a implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Taguatinga, Núcleo Bandeirantes e o Plano Piloto – Corredor Eixo Sudoeste.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Executado 13,66% no bimestre. Acumulado 58,48%. Etapas realizadas:
 Relatório de Coordenação:1,95%; Elaboração do Modelo Operacional: 1,81%; Estudo de Traçado: 0,67%; Estudo Topográfico: 1,30%; Estudo Geológico-geotécnico: 2,60%; Projeto Básico Geométrico:0,13%; Projeto Básico de Terraplenagem:0,01%; Projeto de Drenagem:0,22%; Projeto de Pavimentação:0,42%; Projeto Básico de OAE:0,84%; Projeto Básico de Sinalização:0,25%; Projeto Básico dos Sistemas ITS:1,61%; Projeto Básico de Interferências:0,14%; Projeto Básico de Paisagismo:0,36%; Projeto Básico de Estações e Terminais:0,45%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 58,48%.




Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA DF-206 E DA DF-170

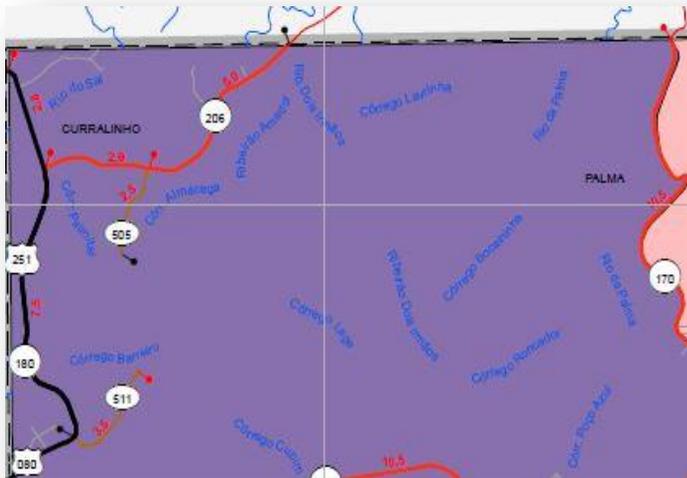


Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1968.0013
Etapa 81 SAG 2014/ Etapa 33 SAG 2015
Nº do Processo: 113.003.206/2012
Nº do Contrato: 013/2014
Empresa: Skill Engenharia Ltda.
Data de início: 26/03/2014
Data prevista de conclusão: 31/03/2015
Valor: R\$ 2.231.470,28
Recurso: Fonte 100
Executor: Engº Roberto Léda Saldanha
 (Instrução de Serviço de 02/09/2014)

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração do Projeto Básico de Engenharia para Pavimentação das Rodovias: DF-206 – no trecho compreendido do entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF-180 ao entroncamento com a rodovia DF-170, incluindo-se o segmento no Estado de Goiás, numa extensão total aproximada de 19,5 km e na DF-170 – no trecho compreendido do entroncamento com a rodovia DF-206 ao entroncamento com a rodovia DF-001 (EPCT), numa extensão de 10,5 km.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 70%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 70%.




Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DA DF-250

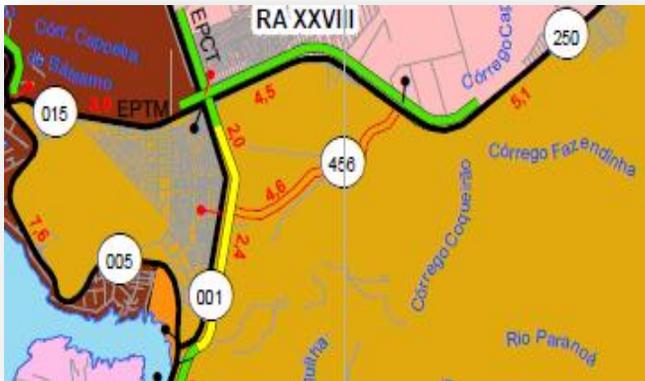

Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1968.0013
 Etapa 85 SAG 2014/ Etapa 34 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.013.987/2013
 Nº do Contrato: 023/2014
 Empresa: STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A
 Data de Início: 20/05/2014
 Data prevista de conclusão: 30/01/2015 (Terceiro Aditivo)
 Valor: R\$ 492.214,41 + R\$ 112.645,13 = R\$ 604.859,54 (Segundo Aditivo)
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº Willkerson Victor da Silva

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração de projeto executivo de engenharia para duplicação da DF-250, no seguimento compreendido do entroncamento com a DF- 001 (EPCT) e DF- 015 (EPTM) até o acesso a Sobradinho dos Melos, com extensão aproximada de 5,3 km.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Executado 21% no bimestre. Acumulado 90%. A Empresa entregou os produtos referentes ao contrato, foram analisados e foram devolvidos com as ponderações do executor para que possam ser feitos os ajustes e complementos necessários.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Obra 100% concluída no 6º bimestre. Último pagamento inserido em Reconhecimento de Dívida.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%


Avanço Físico Bimestral

100%	%	%	%	%	%
------	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF

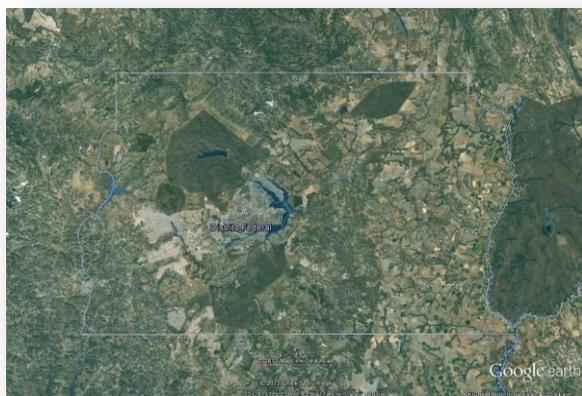


Programa de Trabalho:
 26.782.6216.3711.6162 (2013)
 Etapa 52 SAG 2014/ Etapa 35 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.005.428/2006
 Nº do Contrato: 002/2010
 Empresa: Geo-Lógica Consultoria Ambiental
 Data de início: 19/02/2010
 Data prevista de conclusão: Paralisada até 19/04/2015 (Nono Aditivo)
 Valor: R\$ 1.303.632,37
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Engº Paulo Roberto da Silva


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central (DF e Goiás).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 80%. Permanece o mesmo patamar do 5º bimestre.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 80%.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA




Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001 Etapa 55 SAG 2014
 26.782.6216.1475.1199 (Primeiro Aditivo)
 Nº do Processo: 113.002.690/2014
 Nº do Contrato: 028/2014
 Empresa: Ultrapav Ltda. - ME
 Data da Assinatura do Contrato: 09/05/2014
 Data prevista de conclusão: 09/05/2015
 Valor inicial: R\$ 2.079.989,34
 Recurso: Fontes 100, 300, 220 e/ou 420
 Executor: Engº Jarbas Alessandro Martins da Silva

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de 11.622 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ para atender às demandas de tapa buracos, recapeamento asfáltico e pavimentação.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Executado 11,7% no bimestre. Acumulado 36%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 36%. Não houve fornecimento de CBUQ neste bimestre por parte da Contratada.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E ENCARREGADO





Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001
 Etapa 55 SAG 2014/ Etapa 17 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.000.098/2013
 Nº do Contrato: 045/2014
 Empresa: Interativa Dedetização, Higienização e Conservação Ltda.
 Data de Início: 22/07/2014
 Data prevista de conclusão: 21/07/2015
 (Primeiro Aditivo)
 Valor estimado: R\$ 3.139.298,16
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº Jarbas Alessandro Martins da Silva

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação dos serviços especializados de conservação, limpeza e manutenção simples das rodovias do Distrito Federal, nos Distritos Rodoviários, unidades Administrativas e nas Regiões de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, sob a supervisão do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Executado 41% no bimestre. Acumulado 90%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 29% no bimestre. Acumulado 29%. Foi concluída a prestação de serviços da vigência passada. O novo período do serviços será de janeiro a julho de 2015.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ALAMBRADO E MURO DE DIVISA DO 5º DISTRITO RODOVIÁRIO DO DER-DF



Programa de Trabalho:
 26.451.6216.3197.0001 (2013)
 26.451.6010.1984.9792 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 76 SAG 2014/ Etapa 24 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.010.563/2011
 Nº do Contrato: 042/2013
 Empresa: Mendonça Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP
 Data de Início: 11/12/2013
 Data prevista de conclusão: 30/04/2015 (Quinto Aditivo)
 Valor: R\$ 309.242,70
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº Sérgio Henrique Rezende Valle



DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução das obras de reforma e acabamento da Nova Sede do 5º Distrito Rodoviário do DER-DF, localizado na Vila são José DF-180, Km 19 – Brazlândia-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Executado 14,66% no bimestre. Acumulado 73,2%. Foram realizados os seguintes serviços: 1 abrigo provisório metálico tipo contêiner; 1 ligação provisória (água e sanitária); 1 ligação provisória de luz; 8,4 m de impermeabilização de alicerce; 3,71 m² de regularização sarrafeada; 15,57 m² de piso cerâmico; 22,29 m² de cerâmica comum em placa 33x45 cm; 1,68 m² de porta de ferro com uma folha; 2 un. de porta de madeira interna 0,70x2,10 m; 9 un. de porta de madeira interna 0,80x2,10m; 1 un. de porta de madeira interna 1,0x2,10m; 7,68 m² de janela de alumínio tipo basculante; 38,88 m² de janela de alumínio tipo de correr; 43,14 m² de vidro temperado com graxete de neoprene e=8mm; 1 un. de porta de vidro temperado, 10 mm, 1,8x2,10 m, 2 folhas; 53m de tubo de PVC Ø 100 mm; 1 un. de caixa sifonada de PVC, 150x185x75mm; 1 un. de caixa de gordura 50x100mm; 4 un. de lavatório de louça de embutir (cuba); 1 un. de lavatório de louça sem coluna; 1 un. de cuba de aço inoxidável, 400x340x125mm; 5 un. de bacia de louça com caixa acoplada; 114,53m de impermeabilização de alicerce 186,39 m² de chapisco para parede interna ou externa.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 73,2%.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

CONSTRUÇÃO DA SEDE E ILUMINAÇÃO EXTERNA DO 4º DISTRITO RODOVIÁRIO DO DER/DF




Programas de Trabalho:
 26.451.6216.3197.0001 (2013)
 26.451.6010.1984.9792 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 77 SAG 2014/ Etapa 25 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.002.641/2010
 Nº do Contrato: 043/2013
 Empresa: Mendonça Construtora e Incorporadora Ltda. – EPP
 Data de Início: 11/12/2013
 Data prevista de conclusão: 30/04/2015
 (Quinto Aditivo)
 Valor: R\$ 408.254,65
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº Cyrino Flávio Ferreira Silva
 (Instrução de Serviço, 19/01/2015)

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de reforma e acabamento na nova Sede do 4º Distrito Rodoviário do DER/DF localizado no Setor de Área Especial nº 02, rodovia DF-130, km 53 – Paranoá.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 55%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0%. Acumulado 55%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA GERÊNCIA DE CONTROLE OPERACIONAL (GECOP) – SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO DER





Programa de Trabalho:
 26.451.6010.1984.9792
 Etapa 16 SAG 2014/ Etapa 23 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.003.265/2011
 Nº do Contrato: 008/2014
 Empresa: Titan Construções e Investimentos Imobiliários Ltda.
 Data de Início: 27/02/2014
 Data prevista de conclusão: Suspenso até 21/03/2015 (Segundo Aditivo)
 Valor: R\$ 934.540,32
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº Darione José Maria Cavalcanti de Oliveira

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução das obras de construção do Edifício Sede da Gerência de Controle Operacional – GECOP da Superintendência de Trânsito.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 50%. Suspensão dos serviços.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 50%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 01




Programa de Trabalho:
 26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 79 SAG 2014/ Etapa 26 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.007.877/2012
 Nº do Contrato: 018/2014
 Empresa: Trier Engenharia Ltda.
 Data de Início: 13/05/2014
 Data prevista de conclusão: Paralisada até 15/03/2015 (Quinto Aditivo)
 Valor: R\$ 32.679.197,28 + R\$ 655.000,00 (Quarto Aditivo)
 Recurso: Fontes 135, 100 (Segundo Aditivo), 231 (Terceiro Aditivo)
 Executores: Fábio Cardoso da Silva, Bruno Sousa Almeida e Willkerson Victor da Silva (Instrução nº 65, 19/05/14, DODF nº 100, 21/05/14).

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 0,0 ao km 2,5, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 1%. Os projetos executivos da obra ainda encontram-se em ajustes na SUTEC, uma vez que o traçado geométrico da rodovia está sobrepondo a delimitação do Parque Nacional de Brasília (PNB).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 1%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 02



Programa de Trabalho:
 26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 80 SAG 2014/ Etapa 27 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.004.262/2014
 Nº do Contrato: 021/2014
 Empresa: Consórcio JM/Cidade
 Data de Início: 14/05/2014
 Data prevista de conclusão: Paralisada até 04/04/2015 (Quinto Aditivo)
 Valor: R\$ 39.829.963,10
 Recurso: Fontes 135, 100 (Segundo Aditivo), 231 (Quarto Aditivo)
 Executores: Fábio Cardoso da Silva, Jarbas Alessandro Martins da Silva e Willkerson Victor da Silva (Instrução nº 66, 19/05/14, DODF nº 100, 21/05/14).



DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 2,5 ao km 5,2, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Executado 8,7% no bimestre. Acumulado 19,7%. Foram executados os seguintes serviços:
 Serviços preliminares: 30%; Terraplenagem: 70%; Drenagem e obras de arte correntes: 3,7%; sinalização: 10%; OAE-02: 13,5%, OAE-03: 0,6%; OAE-04: 0,5%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 19,7%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

DESCENTRALIZAÇÃO PARA O DER: IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE, REMODELAÇÃO DA PONTE DO BRAGHETTO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DF-002 (ERN) E DF-007 (EPTT)





Programa de Trabalho:
 26.782.6216.3056.0003
 26.782.6216.1475.1199 (Primeiro Aditivo)
 Nº do Processo: 113.007.878/2012
 Nº do Contrato: 025/2014
 Empresa: Consórcio Via Engenharia/Conterc –
 Construção, Terraplenagem e Consultoria Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 26/05/2014
 Data prevista de conclusão: Paralisada até
 14/03/2015 (Segundo Aditivo)
 Valor inicial: R\$ 79.632.741,77
 Recurso: Fontes 135, 231 (Primeiro Aditivo)
 Executores: Fábio Cardoso da Silva, Samuel
 Dias Júnior e Geraldo Jacinto da Silva Filho
 (Instrução nº 72, 29/05/14)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução de obras para Implantação do Trevo de Triagem Norte (TTN), remodelação da Ponte do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego em 2,1 km da rodovia DF-007 (EPTT), no trecho compreendido entre a DF-002 e o entroncamento com a DF-003/BR-450 (Balão do Torto), e em 0,4 km da rodovia DF-002 (ERN), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-007 (ponte do Braghetto) até o acesso às vias W1/W3, execução de estrutura cicloviária, bem como a elaboração dos projetos executivos decorrentes das obras de artes especiais a serem implantadas e remodeladas. Cc nº 002/2013.


AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 0,3%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 0,3%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL

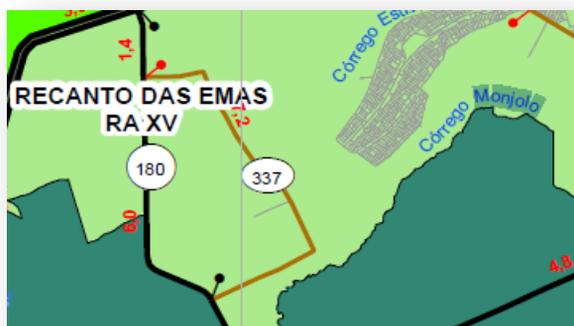

Programa de Trabalho:
 26.782.6216.3361.4359
Etapa 40 SAG 2015 (UO 22.101)
Nº do Processo: 112.004.068/2011
Nº do Contrato: 005/2014- SO
Prazo de Execução: 21/07/2014
Prazo de Vigência: 21/10/2014
Valor: R\$ 494.038,57
Recurso: Fonte 100
Executoras: Alessandra Guimarães de Oliveira Santos e Silvia Cristina Sardinha Maia



Portaria Conjunta nº 03, de 13 de fevereiro de 2014 (DODF nº 37, 18/02/2014)

De: UO: 26.205 – Departamento de Estradas de Rodagem – DER
 UG: 200.202 - Departamento de Estradas de Rodagem – DER
Para: UO: 22.101 – Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal
 UG: 190.101 - Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Descentralização de créditos orçamentários destinados a custear despesas com a contratação das obras de construção de Ponte sobre o Córrego Monjolo, localizada no Núcleo Rural Monjolo, Recanto das Emas/DF, cuja meta é a construção de 101 m².

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 5%. Obra paralisada pela NOVACAP para aguardar Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA) do projeto de reforço da estrutura.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 5%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída
