




## Relatório de Acompanhamento Governamental – 3º Bimestre/2015

## SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO

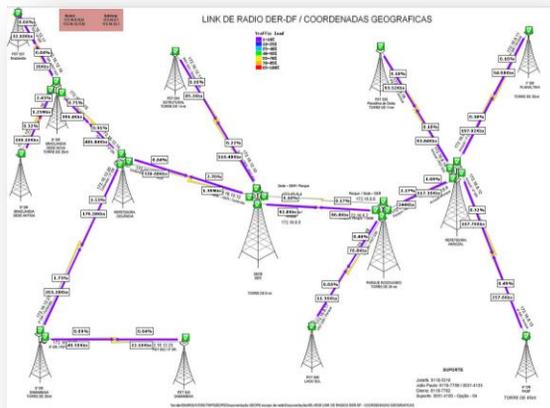

Programas de Trabalho:

26.122.2800.8517.0014 (2011)

26.122.6010.2557.2569 (2013/2014)

Etapa 6 SAG 2015

Nº do Processo: 113.000.559/2011

Nº do Contrato: 025/2011

Empresa: Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda.

Data de início: 21/11/2011

Data prevista de conclusão: 20/11/2015  
(Quarto Aditivo)

Valor: R\$ 306.175,68 (Quarto Aditivo)

Recurso: Fonte 100

Executor: Thiago Vinícius de Melo Almeida

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Serviços especializados de engenharia, contemplando a manutenção de sistema de comunicação de dados com todos os equipamentos de infraestrutura e serviços necessários para interligação das Unidades que compõem o complexo administrativo do DER/DF e BPRv (Batalhão de Policiamento Rodoviário). Farão parte da prestação dos serviços a manutenção, inspeção periódica dos rádios e switches e manutenção das torres de comunicação de micro-ondas que interligam os 5 Distritos Rodoviários e os postos do BPRv com a sede do Órgão.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

Prestação de serviços dentro da normalidade.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:

Em maio, o tempo (em porcentagem) em que os equipamentos estavam em funcionamento foi maior que 94%, com exceção do aparelho no 5º DR, que representou 39,5%.

Em junho não teve abertura de chamados.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO



Programa de Trabalho:  
 26.782.6215.2460.0001(2012)  
 Etapa 23 SAG 2014/ Etapa 10 SAG 2015  
 26.782.6215.2541.0004 (Quinto Aditivo)  
 Nº do Processo: 113.008.698/2011  
 Contrato: 027/2011  
 Empresa: Gráfica e Editora Movimento  
 Data de Início: 19/12/2011  
 Data prevista de conclusão: 18/12/2015  
 (Terceiro aditivo)  
 Valor Anual: R\$ 1.700.000,00 (Quinto Aditivo)  
 Recurso: Fonte 237, 220 e/ou 100  
 (Quinto Aditivo)  
 Executora: Eliane Cavalcante Santos


**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Prestação de serviços gráficos e diagramação de campanhas educativas de trânsito e meio ambiente, por meio de confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços gráficos.

### **AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**

Neste bimestre foram gastos com material educativo R\$ 32.583,40 nas Campanhas “Volta às Aulas”, “Aniversário da Faixa de Pedestres” e “Aniversário de Brasília”. Foram alcançadas o total de 37.278 pessoas, entre crianças e adultos.

### **AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**

Neste bimestre foram gastos com material educativo R\$ 203.147,03 nas Campanhas do Maio Amarelo, Lei Seca e 16ª Semana Educativa de Trânsito - Velocidade e alcançadas 43.332 pessoas entre crianças e adultos.

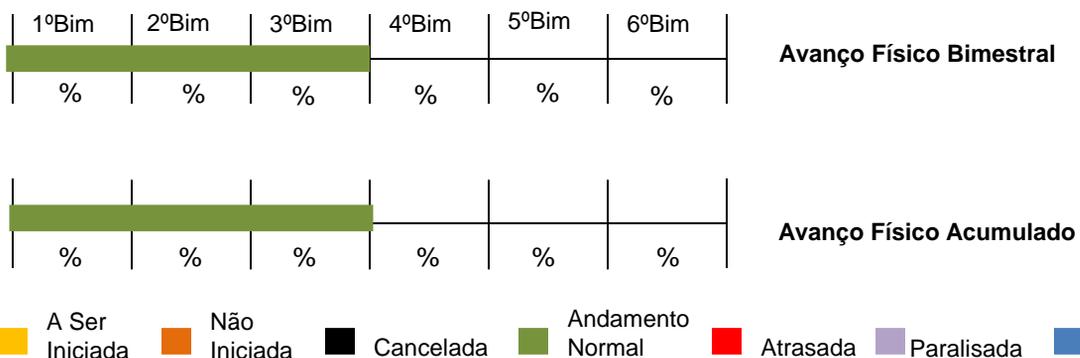



Programa de Trabalho:  
 26.782.6215.2541.0001  
 Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015  
 Nº do Processo: 113.001.225/2008  
 Nº do Contrato: 028/2011  
 Empresa: Engebrás S/A Indústria, Comércio e  
 Tecnologia de Informática  
 Data de Início: 23/12/2011  
 Data prevista de conclusão: 23/12/2016  
 (Quinto Aditivo)  
 Valor: R\$ 21.979.430,01 (Quinto Aditivo)  
 Recurso: Fonte 237  
 Executor: Eng.º Murilo de Melo Santos

**DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO:** Monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N).

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**  
 Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 33,2%. Contrato em ritmo normal.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**  
 Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 49,8%. Contrato em ritmo normal.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	16,6%	16,6%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	33,2%	49,8%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP



**Programa de Trabalho:**  
 26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo)  
 Etapa 25 SAG 2014/ Etapa 12 SAG 2015  
 Nº do Processo: 113.003.563/2014  
 Nº do Contrato: 060/2014  
 Empresa: Lig MóBILE Telecomunicações Ltda.  
 Data da Assinatura do Contrato: 29/09/2014  
 Data prevista de conclusão: 28/09/2015  
 Valor dos Serviços: R\$ 1.146.696,00  
 Recurso: Fonte 237  
 Executor: Daniel dos Santos Sampaio  
 (IS, 27/05/2015)


**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Contratação de serviço móvel especializado (SME) do tipo sistema troncalizado digital tecnologia tetra para locação de equipamentos para Gerência de Controle Operacional da Diretoria de Fiscalização de Trânsito da Superintendência de Trânsito do DER-DF.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**

Prestação de serviços dentro da normalidade.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**

Prestação de serviços dentro da normalidade. O total geral pago foi o valor de R\$ 586.757,00.



**Avanço Físico Bimestral**



**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada    
  Não Iniciada    
  Cancelada    
  Andamento Normal    
  Atrasada    
  Paralisada    
  Concluída

## LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 1º Bimestre de 2015:
  - Prestação de serviços dentro da normalidade.
  - Não foi pago a fatura do mês 02/2015, tendo em vista negociação do disposto no Decreto nº 36.246, de 02 de janeiro de 2015 (DODF Edição extra nº 3, 02/01/2015).
- 2º Bimestre de 2015:
  - Foi solicitado empenho referente ao período de Fevereiro à Abril de 2015, no valor de R\$ 277.835,00.
  - Aguarda-se o empenho dos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2015, para realizar os pagamentos.
- 3º Bimestre de 2015:
  - Aguarda-se o empenho do mês de Junho de 2015 para realiza o pagamento.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

**PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS**



**DETRAN-DF**  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO  
DO DISTRITO FEDERAL



Programa de Trabalho:  
26.782.6215.2541.0001  
Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015  
Nº do Processo: 113.007.132/2008  
Nº do Convênio: 001/2010  
Conveniado: Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF  
Data de Início: 03/12/2010  
Data prevista de conclusão: 23/11/2015 (Sexto Aditivo)  
Recurso: Fontes 100, 237  
Executor: Engº Murilo de Melo Santos


**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** O presente Convênio tem por objetivo reduzir os níveis de acidentes nas vias urbanas e rurais do DF, tendo por objeto a delegação entre os convenientes da competência para lavratura do auto de infração de trânsito, nos limites das condições e circunstâncias fixadas neste instrumento, bem assim a cooperação mútua para a execução das seguintes atividades: Processamento de Dados, Engenharia de Tráfego, Educação no Trânsito, estatística, Monitoramento Aéreo.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 33,2%. Contrato em ritmo normal.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 49,8%. Contrato em ritmo normal.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF





Programa de Trabalho:  
 26.782.6215.2541.0001  
 Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015  
 Nº do Processo: 054.001.403/2011  
 Nº do Convênio: 001/2012  
 Conveniado: Polícia Militar do Distrito Federal  
 Data de Início: 11/05/2012  
 Data prevista de conclusão: 21/05/2017  
 Recurso: Fontes 237, 437  
 Executor: Engº Murilo de Melo Santos

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**  
 Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 33,2%. Contrato em ritmo normal.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**  
 Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 49,8%. Contrato em ritmo normal.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## SERVIÇO INTEGRADO MÓVEL PARA GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE



Programa de Trabalho:

26.782.6215.2541.0004 (Segundo Aditivo)

Etapa 25 SAG 2014/ Etapa 12 SAG 2015

Nº do Processo: 113.011.356/2013

Nº do Contrato: 014/2014

Empresa: OI Móvel S.A (Primeiro Aditivo)

Data da Assinatura do Contrato: 28/03/2014

Data prevista de conclusão: 10/06/2016

(Segundo Aditivo)

Valor anual: R\$ 1.024.620,00 (Segundo Aditivo)

Recurso: Fonte 237/437

Executor: Graziela de Sousa Portela

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Serviço Integrado Móvel para Gestão de Trânsito e Mobilidade – SIMGTM, incluindo serviços de instalação, suporte técnico e repasse de conhecimentos para atender a necessidade do DER/DF. Equipamento do tipo celular que utiliza rede de telefonia e de internet para comunicação interna, consulta de veículo e habilitação, registro de infrações de trânsito (on line), registro de ocorrência de acidente de trânsito, emissão de ficha de missão e relatórios voltados para a fiscalização de trânsito e demais funções afins à autarquia.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:



Março – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

Abril – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:

Maió – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

Junho – Prestação dos serviços dentro da normalidade.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## MONITORAMENTO E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO



Programa de Trabalho:

26.782.6215.2541.0001

Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015

Nº do Processo: 113.001.811/2009

Nº do Contrato: 041/2014

Empresa: Eliseu Kopp & Cia. Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2014

Data prevista de conclusão: 24/12/2016

Valor inicial: R\$ 6.445.569,64

Recurso: Fonte 237

Executor: Engº Darione José Maria Cavalcanti de Oliveira


**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Prestação de serviços de monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos instalados em pontos definidos no Edital da Concorrência nº 008/2010. Complementarmente, deverão ser elaborados inventários, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos, com expedição concomitante de relatório individual para emissão de autos de infração e notificação, utilizando medidores eletrônicos de velocidade fixos de operação autônoma.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

Andamento normal.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:

Andamento Normal.

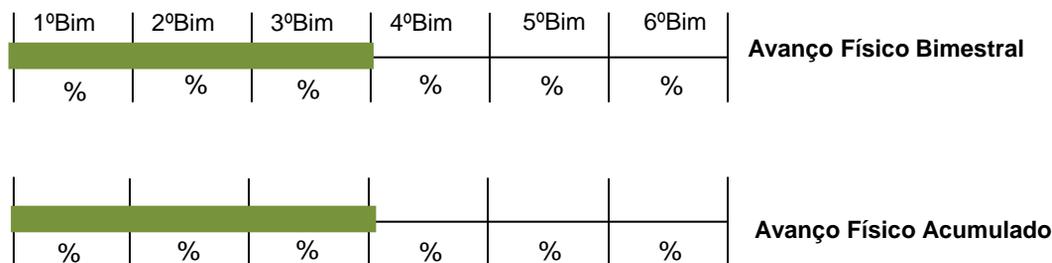

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



**Programas de Trabalho:**  
 26.782.2800.2904.0001 (2011) e  
 26.782.6215.2904.0001 (2012),  
**Etapa 27 SAG 2014/ Etapa 14 SAG 2015**  
**Nº do Processo:** 113.005.681/2010  
**Nº do Contrato:** 011/2011  
**Empresa:** Hot Cozinha Industrial  
**Data de Início:** Março/ 2011  
**Data prevista de conclusão:** 31/05/2016  
 (Quinto Aditivo)  
**Valor:** R\$ 166.658,02 (Quinto Aditivo)  
**Recursos:** Fonte 237  
**Executora:** Eliane Cavalcante Santos

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Lanche para as crianças das Escolas Públicas, que são levadas nos períodos matutino e vespertino, no Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o Trânsito, para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

Neste bimestre houve o pagamento no valor de R\$ 384,77 à empresa contratada.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:

Neste bimestre houve o pagamento no valor de R\$ 5.591,52 à empresa contratada com despesa de lanche e transporte para as crianças que visitam a escola..

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

## MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programa de Trabalho:  
 26.782.6215.2904.0001  
 Etapa 27 SAG 2014/ Etapa 14 SAG 2015  
 Nº do Processo: 113.012.201/2013  
 Nº do Contrato: 012/2014  
 Empresa: Travel Bus Ltda - Me  
 Data de Início: 24/03/2014  
 Data prevista de conclusão: 23/03/2016  
 (Primeiro Aditivo)  
 Valor: R\$ 626.740,35 (Primeiro Aditivo)  
 Recurso: Fonte 237  
 Executora: Eliane Cavalcante dos Santos


**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Prestação de serviço de transporte de crianças a serem atendidas pela Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia) do DER-DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2014.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**


Neste 2º bimestre não houve pagamento para empresa contratada.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**

Neste 3º bimestre foi pago à empresa contratada o valor de R\$ 30.969,00.



**Avanço Físico Bimestral**



**Avanço Físico Acumulado**

█ A Ser Iniciada   
 █ Não Iniciada   
 █ Cancelada   
 █ Andamento Normal   
 █ Atrasada   
 █ Paralisada   
 █ Concluída

## MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO DO DER-DF




Programa de Trabalho:  
 26.782.6515.4198.0001  
 Etapa 31 SAG 2014/ Etapa 13 SAG 2015  
 Nº do Processo: 113.006.446/2014  
 Nº do Contrato Emergencial: 053/2014  
 Empresa: Sitran - Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.  
 Data de Início: 02/08/2014  
 Data prevista de conclusão: 02/02/2015  
 Valor: R\$ 616.088,04  
 Recurso: Fonte 237  
 Executor: Engº Carlos Alberto Mundim Pena

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico do DER-DF, instalados em diversos pontos do Distrito Federal.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:**  
 Executado 30% no bimestre. Acumulado 80%. Serviço de natureza contínua.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:**  
 Executado 20%. Acumulado 100%. Conclusão dos serviços.



**Avanço Físico Bimestral**



**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO DO DER-DF




Programa de Trabalho:  
 26.782.6515.4198.0001  
 Etapa 13 SAG 2015  
 Nº do Processo: 113.000.631/2015  
 Nº do Contrato Emergencial: 001/2015  
 Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.  
 Data da Assinatura do contrato: 02/03/2015  
 Data prevista de conclusão: 28/08/2015  
 Valor: R\$ 616.088,04  
 Recurso: Fonte 237  
 Executor: Engº Carlos Alberto Mundim Pena

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico do DER-DF, instalados em diversos pontos do Distrito Federal.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**  
 Executado 33,3% no bimestre. Acumulado 33,3%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**  
 Executado 33,3% no bimestre. Acumulado 66,6%.

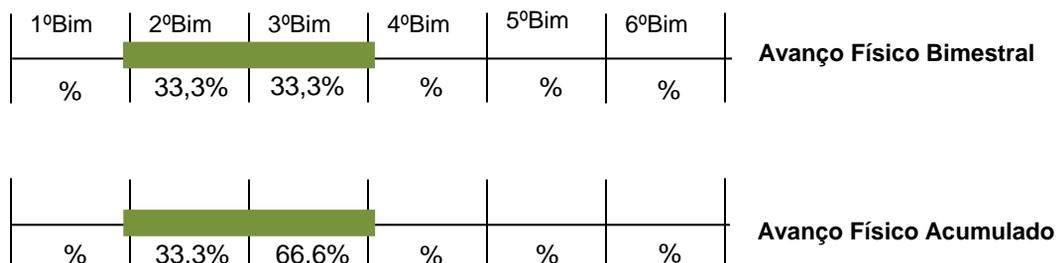

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE PAINÉIS DE MENSAGENS MÓVEIS




**Programa de Trabalho:**  
 26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo)  
 Etapa 25 SAG 2014/ Etapa 12 SAG 2015  
 Nº do Processo: 113.009.643/2013  
 Nº do Contrato: 066/2014  
 Empresa: Talentech-Tecnologia Ltda.  
 Data de Início: 15/12/2014  
 Data prevista de conclusão: 15/12/2015  
 Valor: R\$ 3.081.600,00  
 Recurso: Fonte 237 e/ou 437 (Primeiro Aditivo)  
 Executora: Tainá de Aguiar Botelho

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Fornecimento, implantação, manutenção e suporte técnico de painéis de mensagens variáveis e sistema de informação e orientação aos usuários, em tempo real e repasse de conhecimento para atender às necessidades do DER/DF.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**  
 O início da operação foi em 23/03/2015. Quantidade de equipamentos operando: 10 painéis.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**  
 Quantidade de equipamentos operando: 12 painéis. O gasto em maio foi R\$ 91.122,58 e em junho foi R\$ 102.720,00.



**Avanço Físico Bimestral**



**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## FORNECIMENTO, ATERRAMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO NO-BREAK




**Programa de Trabalho:**  
 26.782.6515.4198.0001 - Etapa 31 SAG 2014  
 26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo)  
 Etapa 12 SAG 2015  
**Nº do Processo:** 113.007.053/2013  
**Nº do Contrato:** 067/2014  
**Empresa:** Sitran - Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.  
**Data de Início:** 06/02/2015  
**Data prevista de conclusão:** Paralisado até 16/05/2015 (Segundo Aditivo)  
**Valor:** R\$ 160.000,00  
**Recurso:** Fonte 237/437  
**Executora:** Tainá de Aguiar Botelho

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Fornecimento, aterramento e instalação de 20 equipamentos do tipo no-break, destinados a atender os cruzamentos semaforicos em vias urbanas do DF, incluindo o fornecimento de mão-de-obra e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 0%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 0%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**  
 Em fase de implantação. O contrato foi reiniciado.

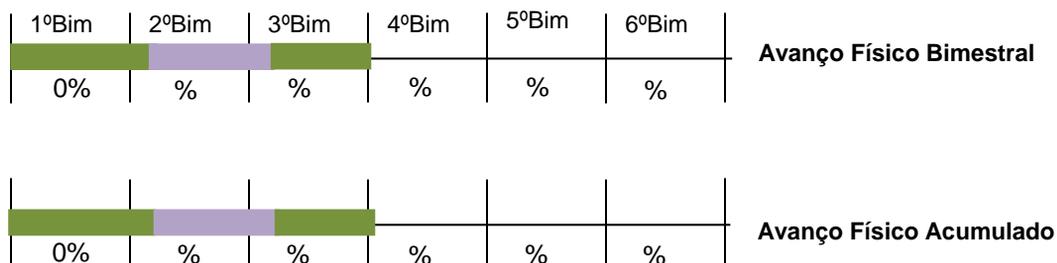

A Ser Iniciada    
  Não Iniciada    
  Cancelada    
  Andamento Normal    
  Atrasada    
  Paralisada    
  Concluída

## PAVIMENTAÇÃO VC-533, LIGAÇÃO DE BRAZLÂNDIA A PADRE LÚCIO



Programa de Trabalho:

28.782.6216.1475.1199

Etapa 86 SAG 2014/ Etapa 30 SAG 2015

Nº do Processo: 113.005.439/2012

Nº do Contrato: 039/2013

Empresa: NG Engenharia e Construções Ltda.

Data da assinatura do contrato: 22/11/2013

Data prevista de conclusão: 28/10/2015

(Quinto Aditivo)

Valor: R\$ 5.405.070,40 + R\$ 1.299.126,98= R\$

6.704.197,38 (Quarto Aditivo)

Recurso: Fonte 100, 135 (Terceiro Aditivo)

Executor: Engº Antônio Gomes da Silva Filho


**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Execução de obras para pavimentação de toda a extensão da rodovia vicinal VC-533, além de implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre o seu entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF/180 e a divisa com estado do Goiás (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio). Extensão de 3,852 km. Cc nº 005/2013.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 20%.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:

Executado 25% no bimestre. Acumulado 45%. Foi executado a base e imprimação da estaca 0+400 à 3+000.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## DUPLICAÇÃO DA DF-463




**Programa de Trabalho:**  
 26.782.6216.1475.1199  
**Etapa 82 SAG 2014/ Etapa 28 SAG 2015**  
**Nº do Processo:** 113.005.051/2010  
**Nº do Contrato:** 043/2014  
**Empresa:** Serterra Transportes Escavações  
 Terraplenagem e Pavimentação Ltda.  
**Data do Início:** 10/07/2014  
**Data prevista de conclusão:** 29/09/2015  
 (Quinto Aditivo)  
**Valor:** R\$ 6.552.350,76 (Sexto Aditivo)  
**Recurso:** Fonte 100  
**Executor:** Engº Guilherme José da Fonseca  
 Berniz

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Execução das obras de duplicação da rodovia DF-463, adequação da rodovia e acessos aos Setores Habitacionais Mangueiral e Jardim Botânico. Extensão de 3,9 km. Cc nº 001/2014.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 17,35%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**  
 Executado 12,65% no bimestre. Acumulado 30%. Continuam os serviços preliminares, terraplenagem e pavimentação.



**Avanço Físico Bimestral**



**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída





## SERVIÇOS DE SONDAGEM NAS RODOVIAS DF-001, DF-095, VC-533 E DF-047



Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.1475.1199 (2014)  
 26.782.6216.4195.0001 (Primeiro Aditivo)  
 Nº do Processo: 113.006.645/2014  
 Nº do Contrato: 065/2014  
 Empresa: Evolução Engenharia, Construção e Administração Ltda. - EPP  
 Data da Assinatura do Contrato: 04/12/2014  
 Data prevista de conclusão: 17/07/2015  
 Valor inicial: R\$ 20.495,90  
 Recurso: Fonte 100, 220, 420 (Primeiro Aditivo)  
 Executor: Willkerson Victor da Silva

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Execução de sondagem na Rodovia DF-001, DF-095 e VC -533, no trecho: nas proximidades da Escola Fazendária(ESAF), Posto BPRv e Ponte Córrego Monjolo, respectivamente, e DF-047, no trecho: entre a intersecção das rodovias DF-025 (EPDB) com a DF-047 (EPAR) e a ponte no córrego Riacho Fundo (sentido Brasília/Aeroporto/Brasília) tudo conforme especificações nos anexos do Convite nº 01/2014.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**  
 Executado 100% no bimestre.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## EXECUÇÃO DE CICLOVIA NA VILA BASEVI





Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.1475.1199  
 Nº do Processo: 113.005.569/2014  
 Nº do Contrato: 002/2015  
 Empresa: NG Engenharia e Construções Ltda  
 Data da Assinatura do Contrato: 20/04/2015  
 Data prevista de conclusão: 21/07/2015  
 Valor inicial: R\$ 330.539,54  
 Recurso: Fonte 135  
 Executor: Bruno Sousa Almeida  
 Substituta: Valéria Gonçalves Regis

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Execução da obra de revestimento da ciclovia, trecho entre a DF-001 e a Vila Basevi com extensão de 1.462 m e largura de 3,00 m, conforme o Edital de Tomada de Preço nº 003/2014.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:

Executado 95% no bimestre. Acumulado 95%. Foram feitos os seguintes serviços:

- ✓ Execução de sub-base e base do pavimento;
- ✓ Execução de pavimento rígido em concreto usinado;
- ✓ Fornecimento e assentamento de cordão de concreto;
- ✓ Paisagismo concluído com fornecimento, adubação e plantio de brama batatais em placas.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## RESTAURAÇÃO DA DF-035 (EPCV)



Programa de Trabalho:

26.782.6216.1475.1199

Nº do Processo: 113.003.227/2014

Nº do Contrato: 005/2015

Empresa: JM Terraplenagem e Construções Ltda

Data da Assinatura do Contrato: 28/04/2015

Data prevista de conclusão: 01/12/2015

Valor inicial: R\$ 3.679.562,85

Recurso: Fonte 135

Executor: Mozer Teixeira de Castro

Substituto: Geraldo Jacinto da Silva Filho

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Execução das obras de restauração da rodovia DF-035 (EPCV), no trecho compreendido entre a DF-025 (EPDB) e o entroncamento com a DF-001 (EPCT) com extensão aproximada de 4,0 Km, incluindo serviços de sinalização horizontal, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 008/2014.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:

Executado 35% no bimestre. Acumulado 35%. Foram feitos os seguintes serviços:

- ✓ Fresagem do revestimento asfáltico na pista sentido DF-001;
- ✓ Execução de revestimento asfáltico na pista sentido DF-001;
- ✓ Execução de reparos localizados no trecho entre a DF-001 e o Balão do Big Box.
- ✓ Execução de revestimento asfáltico no trecho entre a DF-001 e o Balão do Big Box.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	35%	%	%	%


Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	35%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

**PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE EIA/RIMA, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS ENTRE AS CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E PLANO PILOTO – CORREDOR EIXO NORTE.**

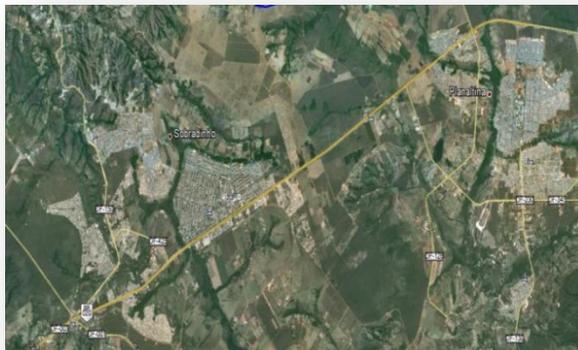

Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.1968.0013 (2012)  
 Etapa 42 SAG 2014/ Etapa 31 SAG 2015  
 Nº do Processo: 113.009.340/2011  
 Nº do Contrato: 063/2012  
 Empresa: Consórcio DF Interligado  
 Data de Início: 26/11/2012  
 Data prevista de conclusão: 30/06/2015  
 (Quarto Aditivo)  
 Valor: R\$ 12.251.695,70 + R\$ 233.714,04  
 (Terceiro Aditivo)= R\$ 12.485.409,74  
 Recurso: Fonte 100, 135 (Quarto Aditivo)  
 Executora: Eng.<sup>a</sup> Ery do Nascimento Brandi de Oliveira (Instrução de Serviço de 18/03/2015)

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Projeto Executivo de Engenharia e de EIA/RIMA, destinados à implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto – Corredor Eixo Norte.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 83,24%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**  
 Executado 3,11% no bimestre. Acumulado 86,35%. Com as correções do aditivo, o acumulado passa a ser 89,94%. As etapas realizadas foram:

- ✓ Aditivo dos Estudo Geológico-Geotécnico (Sondagem Rotativa): 0,37%
- ✓ Projeto Básico de Drenagem e OAC: 1,23%
- ✓ Projeto Executivo Geométrico: 0,23%
- ✓ Projeto Executivo de Terraplenagem: 0,09%
- ✓ Projeto Executivo de Drenagem e OAC: 0,47%
- ✓ Projeto Executivo de Obras de Arte Especiais: 0,31%
- ✓ Projeto Executivo de Sinalização: 0,08%
- ✓ Projeto Executivo de Estações, Terminais e Garagens: 0,13%
- ✓ Quantitativos, Custos, Orçamentos e Cronograma de Implantação: 0,20%

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	3,11%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

83,24%	83,24%	89,94%	%	%	%
--------	--------	--------	---	---	---

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EIA/RIMA, DESTINADO AO CORREDOR EIXO SUDOESTE.




**Programa de Trabalho:**  
 26.782.6216.1968.0013  
**Etapa 72 SAG 2014/ Etapa 32 SAG 2015**  
**Nº do Processo:** 113.001.608/2013  
**Nº do Contrato:** 036/2013  
**Empresa:** ITEC Infra Tech Engenharia e Consultoria S.A  
**Data da assinatura:** 17/10/2013  
**Data prevista de conclusão:** 29/10/2015  
**(Quinto Aditivo)**  
**Valor:** R\$ 9.681.024,81  
**Recurso:** Fontes 100, 235 (Primeiro Aditivo), 135 (Segundo Aditivo)  
**Executores:** Fabrício Ferreira Faiad, Elcy Ozório dos Santos, Wilson Eulálio Porto, Luciano dos Santos (Instrução de Serviço de 15/06/2014)

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Elaboração de projeto executivo de engenharia e EIA/RIMA, destinado a implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Taguatinga, Núcleo Bandeirantes e o Plano Piloto – Corredor Eixo Sudoeste.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 58,48%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**  
 Executado 4,10% no bimestre. Acumulado 62,58%. As etapas realizadas foram:

- ✓ Relatório de Coordenação:0,65%;
- ✓ Projeto Básico Geométrico:0,11%;
- ✓ Projeto Básico de Terraplenagem:0,06%;
- ✓ Projeto Básico de Sinalização:0,10%;
- ✓ Projeto Básico dos Sistemas ITS:1,76%;
- ✓ Projeto Básico de Interferências:0,23%;
- ✓ Projeto Básico de Estações e Terminais:1,19%.



**Avanço Físico Bimestral**




**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída



## ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DA DF-250

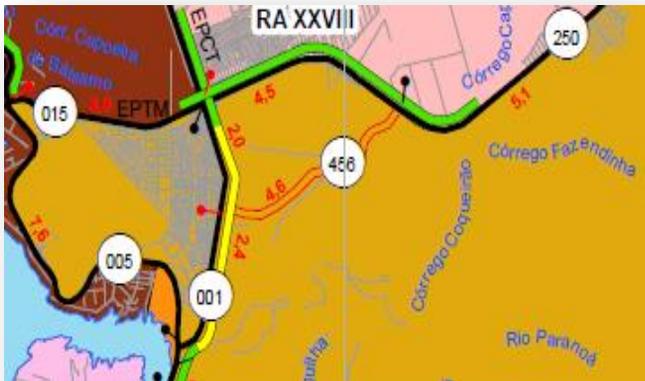

**Programa de Trabalho:**  
 26.782.6216.1968.0013  
**Etapa 85 SAG 2014/ Etapa 34 SAG 2015**  
**Nº do Processo:** 113.013.987/2013  
**Nº do Contrato:** 023/2014  
**Empresa:** STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A.  
**Data de Início:** 20/05/2014  
**Data prevista de conclusão:** 30/01/2015 (Terceiro Aditivo)  
**Valor:** R\$ 492.214,41 + R\$ 112.645,13 = R\$ 604.859,54 (Segundo Aditivo)  
**Recurso:** Fonte 100  
**Executor:** Engº Willkerson Victor da Silva

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Elaboração de projeto executivo de engenharia para duplicação da DF-250, no seguimento compreendido do entroncamento com a DF- 001 (EPCT) e DF- 015 (EPTM) até o acesso a Sobradinho dos Melos, com extensão aproximada de 5,3 km.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:**  
 Executado 21% no bimestre. Acumulado 90%. A Empresa entregou os produtos referentes ao contrato, foram analisados e foram devolvidos com as ponderações do executor para que possam ser feitos os ajustes e complementos necessários.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:**  
 Obra 100% concluída no 6º bimestre. Último pagamento inserido em Reconhecimento de Dívida.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%


**Avanço Físico Bimestral**

100%	%	%	%	%	%
------	---	---	---	---	---

**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada   
  Não Iniciada   
  Cancelada   
  Andamento Normal   
  Atrasada   
  Paralisada   
  Concluída

## ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF




**Programa de Trabalho:**  
 26.782.6216.3711.6162 (2013)  
 Etapa 52 SAG 2014/ Etapa 35 SAG 2015  
 Nº do Processo: 113.005.428/2006  
 Nº do Contrato: 002/2010  
 Empresa: Geo-Lógica Consultoria Ambiental  
 Data de início: 19/02/2010  
 Data prevista de conclusão: Paralisada até 19/04/2015 (Nono Aditivo)  
 Valor: R\$ 1.303.632,37  
 Recurso: Fonte 237  
 Executor: Engº Paulo Roberto da Silva

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central ( DF e Goiás).

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 80%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**  
 Executado 20% no bimestre. Acumulado 100%. Serviço concluído.

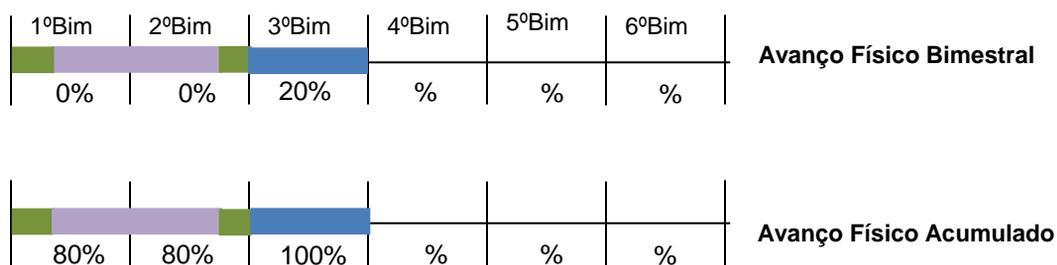

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA




**Programa de Trabalho:**  
 26.782.6216.4195.0001 Etapa 55 SAG 2014  
 26.782.6216.1475.1199 (Primeiro Aditivo)  
 Nº do Processo: 113.002.690/2014  
 Nº do Contrato: 028/2014  
 Empresa: Ultrapav Ltda. - ME  
 Data da Assinatura do Contrato: 09/05/2014  
 Data prevista de conclusão: 09/05/2015  
 Valor inicial: R\$ 2.079.989,34  
 Recurso: Fontes 100, 300, 220 e/ou 420  
 Executor: Engº Jarbas Alessandro Martins da Silva

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de 11.622 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ para atender às demandas de tapa buracos, recapeamento asfáltico e pavimentação.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**  
 Executado 5% no bimestre. Acumulado 41%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**  
 Executado aproximadamente 2,4% no bimestre. Acumulado 43,4%. Contrato concluído.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E ENCARREGADO





Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.4195.0001  
 Etapa 55 SAG 2014/ Etapa 17 SAG 2015  
 Nº do Processo: 113.000.098/2013  
 Nº do Contrato: 045/2014  
 Empresa: Interativa Dedetização, Higienização e Conservação Ltda.  
 Data de Início: 22/07/2014  
 Data prevista de conclusão: 21/07/2015  
 (Primeiro Aditivo)  
 Valor estimado: R\$ 3.139.298,16  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Engº Jarbas Alessandro Martins da Silva

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Prestação dos serviços especializados de conservação, limpeza e manutenção simples das rodovias do Distrito Federal, nos Distritos Rodoviários, unidades Administrativas e nas Regiões de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, sob a supervisão do DER/DF.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**  
 Executado 30% no bimestre. Acumulado 59%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**  
 Executado 26% no bimestre. Acumulado 85%.



A Ser Iniciada   
  Não Iniciada   
  Cancelada   
  Andamento Normal   
  Atrasada   
  Paralisada   
  Concluída

## CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ALAMBRADO E MURO DE DIVISA DO 5º DISTRITO RODOVIÁRIO DO DER-DF





**Programa de Trabalho:**  
 26.451.6216.3197.0001 (2013)  
 26.451.6010.1984.9792 (Primeiro Aditivo)  
 Etapa 76 SAG 2014/ Etapa 24 SAG 2015  
 Nº do Processo: 113.010.563/2011  
 Nº do Contrato: 042/2013  
 Empresa: Mendonça Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP  
 Data de Início: 11/12/2013  
 Data prevista de conclusão: Paralisado até 03/07/2015 (Sétimo Aditivo)  
 Valor: R\$ 309.242,70  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Engº Sérgio Henrique Rezende Valle

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Execução das obras de reforma e acabamento da Nova Sede do 5º Distrito Rodoviário do DER-DF, localizado na Vila São José DF-180, Km 19 – Brazlândia-DF.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 73,2%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 73,2%.



A Ser Iniciada   
  Não Iniciada   
  Cancelada   
  Andamento Normal   
  Atrasada   
  Paralisada   
  Concluída

## CONSTRUÇÃO DA SEDE E ILUMINAÇÃO EXTERNA DO 4º DISTRITO RODOVIÁRIO DO DER/DF




Programas de Trabalho:  
 26.451.6216.3197.0001 (2013)  
 26.451.6010.1984.9792 (Primeiro Aditivo)  
 Etapa 77 SAG 2014/ Etapa 25 SAG 2015  
 Nº do Processo: 113.002.641/2010  
 Nº do Contrato: 043/2013  
 Empresa: Mendonça Construtora e Incorporadora Ltda. – EPP  
 Data de Início: 11/12/2013  
 Data prevista de conclusão: Paralisado até 13/07/2015 (Sétimo Aditivo)  
 Valor: R\$ 408.254,65  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Engº Cyrino Flávio Ferreira Silva (Instrução de Serviço, 19/01/2015)

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Execução de reforma e acabamento na nova Sede do 4º Distrito Rodoviário do DER/DF localizado no Setor de Área Especial nº 02, rodovia DF-130, km 53 – Paranoá.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**  
 Executado 0%. Acumulado 55%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**  
 Executado 0%. Acumulado 55%.

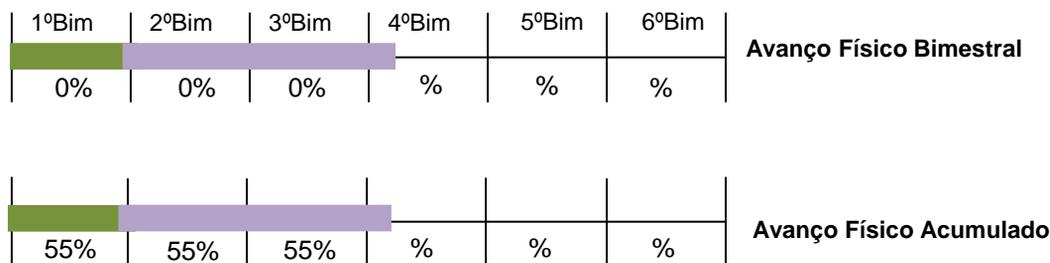

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA GERÊNCIA DE CONTROLE OPERACIONAL (GECOP) – SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO DER





Programa de Trabalho:  
 26.451.6010.1984.9792  
 Etapa 16 SAG 2014/ Etapa 23 SAG 2015  
 Nº do Processo: 113.003.265/2011  
 Nº do Contrato: 008/2014  
 Empresa: Titan Construções e Investimentos Imobiliários Ltda.  
 Data de Início: 27/02/2014  
 Data prevista de conclusão: Paralisado até 21/03/2015 (Segundo Aditivo)  
 Valor: R\$ 934.540,32  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Engº Darione José Maria Cavalcanti de Oliveira

**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Execução das obras de construção do Edifício Sede da Gerência de Controle Operacional – GECOP da Superintendência de Trânsito.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 50%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 50%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**  
 Rescindido unilateralmente.



A Ser Iniciada    
  Não Iniciada    
  Cancelada    
  Andamento Normal    
  Atrasada    
  Paralisada    
  Concluída

## REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 01




**Programa de Trabalho:**  
 26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)  
 Etapa 79 SAG 2014/ Etapa 26 SAG 2015  
 Nº do Processo: 113.007.877/2012  
 Nº do Contrato: 018/2014  
 Empresa: Trier Engenharia Ltda.  
 Data de Início: 13/05/2014  
 Data prevista de conclusão: Paralisado até 30/07/2015 (Sétimo Aditivo)  
 Valor: R\$ 32.679.197,28 + R\$ 655.000,00 (Quarto Aditivo)  
 Recurso: Fontes 135, 100 (Segundo Aditivo), 231 (Terceiro Aditivo)  
 Executores: Fábio Cardoso da Silva, Bruno Sousa Almeida e Willkerson Victor da Silva (Instrução nº 65, 19/05/14, DODF nº 100, 21/05/14).

**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 0,0 ao km 2,5, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 1%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 1%.

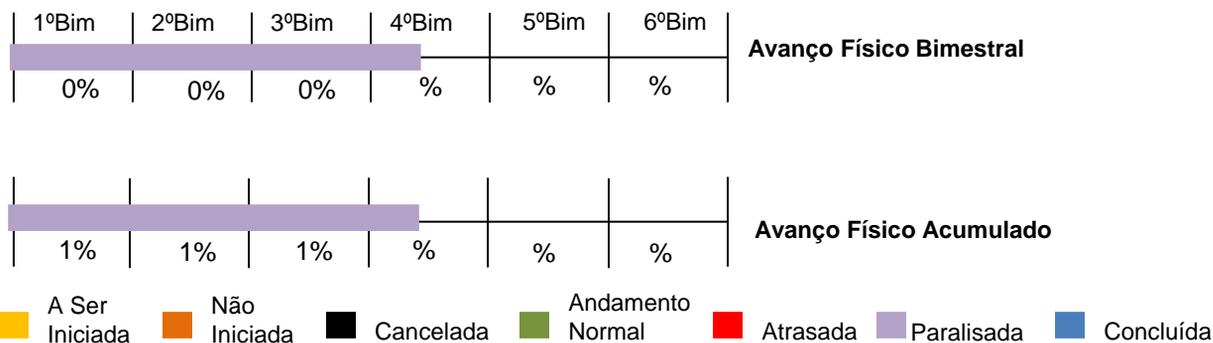

**REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 02**



Programa de Trabalho:  
 26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)  
 Etapa 80 SAG 2014/ Etapa 27 SAG 2015  
 Nº do Processo: 113.004.262/2014  
 Nº do Contrato: 021/2014  
 Empresa: Consórcio JM/Cidade  
 Data de Início: 14/05/2014  
 Data prevista de conclusão: Paralisado até 03/08/2015 (Sétimo Aditivo)  
 Valor: R\$ 39.829.963,10  
 Recurso: Fontes 135, 100 (Segundo Aditivo), 231 (Quarto Aditivo)  
 Executores: Fábio Cardoso da Silva, Jarbas Alessandro Martins da Silva e Willkerson Victor da Silva (Instrução nº 66, 19/05/14, DODF nº 100, 21/05/14).


**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 2,5 ao km 5,2, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**

Executado 0% no bimestre. Acumulado 19,7%. Obra Paralisada

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**

Executado 0% no bimestre. Acumulado 19,7%. Obra Paralisada

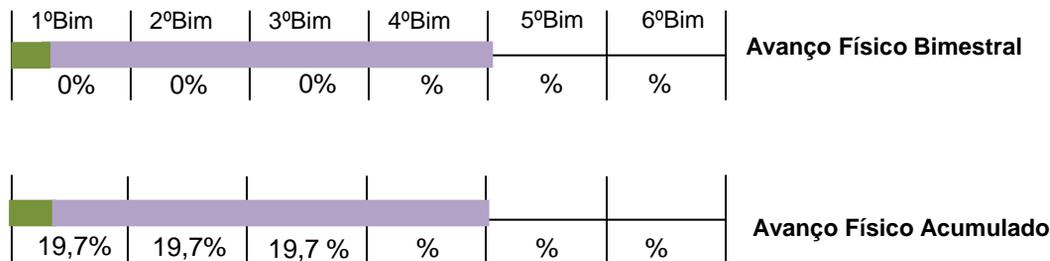

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

**DESCENTRALIZAÇÃO PARA O DER: IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE, REMODELAÇÃO DA PONTE DO BRAGHETTO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DF-002 (ERN) E DF-007 (EPTT)**




Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.3056.0003  
 26.782.6216.1475.1199 (Primeiro Aditivo)  
 Nº do Processo: 113.007.878/2012  
 Nº do Contrato: 025/2014  
 Empresa: Consórcio Via Engenharia/Conterc –  
 Construção, Terraplenagem e Consultoria Ltda.  
 Data da Assinatura do Contrato: 26/05/2014  
 Data prevista de conclusão: Paralisado até  
 28/09/2015 (Quinto Aditivo)  
 Valor inicial: R\$ 79.632.741,77  
 Recurso: Fontes 135, 231 (Primeiro Aditivo)  
 Executores: Fábio Cardoso da Silva, Samuel  
 Dias Júnior e Geraldo Jacinto da Silva Filho  
 (Instrução nº 72, 29/05/14)

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Execução de obras para Implantação do Trevo de Triagem Norte (TTN), remodelação da Ponte do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego em 2,1 km da rodovia DF-007 (EPTT), no trecho compreendido entre a DF-002 e o entroncamento com a DF-003/BR-450 (Balão do Torto), e em 0,4 km da rodovia DF-002 (ERN), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-007 (ponte do Braghetto) até o acesso às vias W1/W3, execução de estrutura cicloviária, bem como a elaboração dos projetos executivos decorrentes das obras de artes especiais a serem implantadas e remodeladas. Cc nº 002/2013.


**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 0,3%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 0,3%.

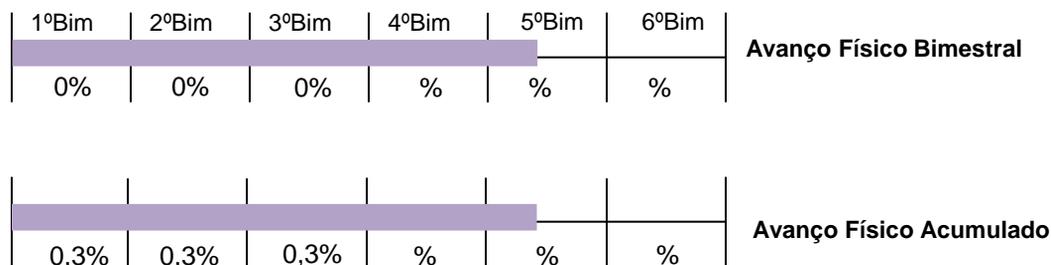

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL

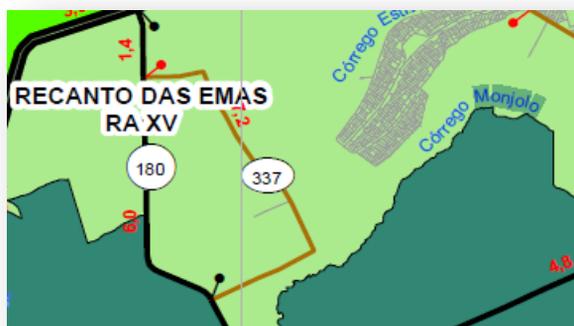

Programa de Trabalho: 26.782.6216.3361.4359  
 Etapa 40 SAG 2015 (UO 22.101)  
 Nº do Processo: 112.004.068/2011  
 Nº do Contrato: 005/2014- SO  
 Prazo de Execução: 21/07/2014  
 Prazo de Vigência: 21/10/2014  
 Valor: R\$ 494.038,57  
 Recurso: Fonte 100  
 Executoras: Alessandra Guimarães de Oliveira Santos e Silvia Cristina Sardinha Maia


### Portaria Conjunta nº 03, de 13 de fevereiro de 2014 (DODF nº 37, 18/02/2014)

De: UO: 26.205 – Departamento de Estradas de Rodagem – DER  
 UG: 200.202 - Departamento de Estradas de Rodagem – DER  
 Para: UO: 22.101 – Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal  
 UG: 190.101 - Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal

**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Descentralização de créditos orçamentários destinados a custear despesas com a contratação das obras de construção de Ponte sobre o Córrego Monjolo, localizada no Núcleo Rural Monjolo, Recanto das Emas/DF, cuja meta é a construção de 101 m<sup>2</sup>.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 5%. Obra paralisada pela NOVACAP para aguardar Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA) do projeto de reforço da estrutura.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 5%.

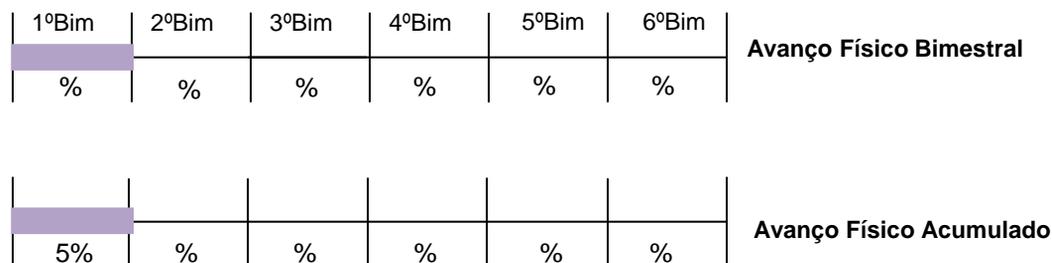

A Ser Iniciada    
  Não Iniciada    
  Cancelada    
  Andamento Normal    
  Atrasada    
  Paralisada    
  Concluída
