




Relatório de Acompanhamento Governamental 5º Bimestre/2015

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO

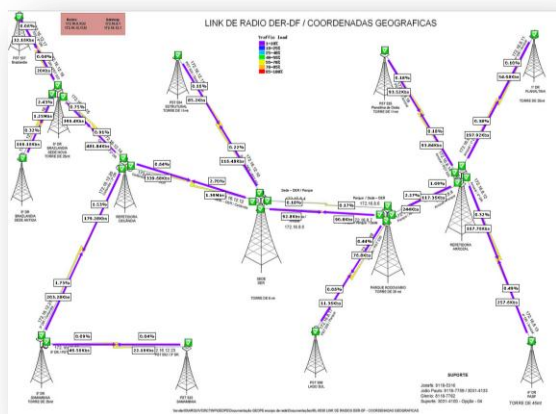

Programas de Trabalho:

26.122.2800.8517.0014 (2011)

26.122.6010.2557.2569 (2013/2014/2015)

Etapa 6 SAG 2015

Nº do Processo: 113.000.559/2011

Nº do Contrato: 025/2011

Empresa: Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda.

Data de início: 21/11/2011

Data prevista de conclusão: 20/11/2015

(Quarto Aditivo)

Valor: R\$ 306.175,68 (Quarto Aditivo)

Recurso: Fonte 100

Executor: Thiago Vinícius de Melo Almeida

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços especializados de engenharia, contemplando a manutenção de sistema de comunicação de dados com todos os equipamentos de infraestrutura e serviços necessários para interligação das Unidades que compõem o complexo administrativo do DER/DF e BPRv (Batalhão de Policiamento Rodoviário). Farão parte da prestação dos serviços a manutenção, inspeção periódica dos rádios e switches e manutenção das torres de comunicação de micro-ondas que interligam os 5 Distritos Rodoviários e os postos do BPRv com a sede do Órgão.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:

Ordens de serviço do mês de julho: Atualização de dados dos equipamentos; atendimento ao 5º DR, antena PST 534.

Ordens de serviço do mês de agosto: Link apresentando lentidão; instalação de ponto de redes no 3º DR; sinal do PST 537; retirada de equipamentos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

As ordens de serviço do mês de setembro foram: repetidora arrozal sem conexão, problema na repetidora Ceilândia, antenas do 3º, 4º e 5º DR's com problema, sinal da antena do 3º DR, link de rádio fora do ar.

As ordens de serviço do mês de outubro foram: link de rádio com erro, link do parque arrozal com problema, oscilação nos rádios de Samambaia, rádios de Ceilândia sem conexão.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%
---	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO



Programa de Trabalho:
26.782.6215.2460.0001(2012)
Etapa 23 SAG 2014/ Etapa 10 SAG 2015
26.782.6215.2541.0004 (Quinto Aditivo)
Nº do Processo: 113.008.698/2011
Contrato: 027/2011
Empresa: Gráfica e Editora Movimento
Data de Início: 19/12/2011
Data prevista de conclusão: 18/12/2015
(Terceiro aditivo)
Valor Anual: R\$ 1.700.000,00 (Quinto Aditivo)
Recurso: Fonte 237, 220 e/ou 100
(Quinto Aditivo)
Executor: Fábio Vargas Mendes (IS de 07/08/2015)


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços gráficos e diagramação de campanhas educativas de trânsito e meio ambiente, por meio de confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços gráficos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:

Durante o período de julho e agosto o DER/DF, por meio da Diretoria de Educação, realizou-se campanhas de educação, dentre elas a campanha “volta as aulas”, que atingiram cerca de 8.947 pessoas.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

Durante o período de setembro e outubro, o DER/DF utilizou o contrato no valor de R\$ 35.531,57. A Diretoria de Educação, por meio de suas Gerências, realizou campanhas de educação, como “Paz e Cidadania no Trânsito”, “Palestras”, além de realizar a Semana Nacional do Trânsito, que ocorre anualmente de 18 a 25 de setembro, que atingiram cerca de 104.470 pessoas.





Programa de Trabalho:
26.782.6215.2541.0001
Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015
Nº do Processo: 113.001.225/2008
Nº do Contrato: 028/2011
Empresa: Engebrás S/A Indústria, Comércio e
Tecnologia de Informática
Data de Início: 23/12/2011
Data prevista de conclusão: 23/12/2016
(Quinto Aditivo)
Valor: R\$ 21.979.430,01 (Quinto Aditivo)
Recurso: Fonte 237
Executor: Eng.º Murilo de Melo Santos

DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO: Monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:
Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 66,4%. Contrato em ritmo normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:
Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 83%. Contrato em ritmo normal.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	33,2%	49,8%	66,4%	83%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP



Programa de Trabalho:

26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo)

Etapa 25 SAG 2014/ Etapa 12 SAG 2015

Nº do Processo: 113.003.563/2014

Nº do Contrato: 060/2014

Empresa: Lig Móbile Telecomunicações Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 29/09/2014

Data prevista de conclusão: 28/09/2016

(Terceiro Aditivo)

Valor dos Serviços: R\$ 1.146.696,00

Recurso: Fonte 237

Executor: Daniel dos Santos Sampaio
(IS, 27/05/2015)


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de serviço móvel especializado (SME) do tipo sistema troncalizado digital tecnologia tetra para locação de equipamentos para Gerência de Controle Operacional da Diretoria de Fiscalização de Trânsito da Superintendência de Trânsito do DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:

Prestação de serviços dentro da normalidade. O total geral pago foi o valor de R\$ 772.071,00. Foi solicitado empenho referente aos meses de Julho e Agosto de 2015, no valor de R\$ 185.314,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

Prestação de serviços dentro da normalidade. O total geral pago até esse bimestre foi de R\$ 957.385,00.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS



DETRAN-DF
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO DISTRITO FEDERAL



Programa de Trabalho:

26.782.6215.2541.0001

Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015

Nº do Processo: 113.007.132/2008

Nº do Convênio: 001/2010

Conveniado: Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF

Data de Início: 03/12/2010

Data prevista de conclusão: 23/11/2015
(Sexto Aditivo)

Recurso: Fontes 100, 237

Executor: Engº Murilo de Melo Santos



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: O presente Convênio tem por objetivo reduzir os níveis de acidentes nas vias urbanas e rurais do DF, tendo por objeto a delegação entre os convenientes da competência para lavratura do auto de infração de trânsito, nos limites das condições e circunstâncias fixadas neste instrumento, bem assim a cooperação mútua para a execução das seguintes atividades: Processamento de Dados, Engenharia de Tráfego, Educação no Trânsito, estatística, Monitoramento Aéreo.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 66,4%. Contrato em ritmo normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 83%. Contrato em ritmo normal.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SITEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF





Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001
 Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015
 Nº do Processo: 054.001.403/2011
 Nº do Convênio: 001/2012
 Conveniado: Polícia Militar do Distrito Federal
 Data de Início: 11/05/2012
 Data prevista de conclusão: 21/05/2017
 Recurso: Fontes 237, 437
 Executor: Engº Murilo de Melo Santos

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF.


AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:
 Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 66,4%. Contrato em ritmo normal

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:
 Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 83%. Contrato em ritmo normal.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SERVIÇO INTEGRADO MÓVEL PARA GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

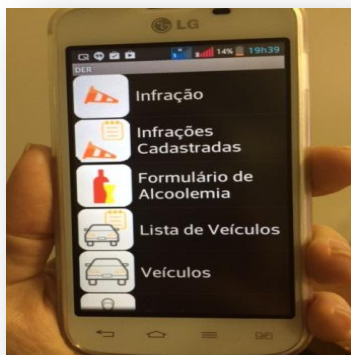

Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0004 (Segundo Aditivo)
 Etapa 25 SAG 2014/ Etapa 12 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.011.356/2013
 Nº do Contrato: 014/2014
 Empresa: OI Móvel S.A (Primeiro Aditivo)
 Data da Assinatura do Contrato: 28/03/2014
 Data prevista de conclusão: 10/06/2016
 (Segundo Aditivo)
 Valor anual: R\$ 1.024.620,00 (Segundo Aditivo)
 Recurso: Fonte 237/437
 Executor: Graziela de Sousa Portela
 Co-Executor: 2º Tenente QOPMA Clemilton de Moura Andrade (IS de 16/07/2015)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Serviço Integrado Móvel para Gestão de Trânsito e Mobilidade – SIMGTM, incluindo serviços de instalação, suporte técnico e repasse de conhecimentos para atender a necessidade do DER/DF. Equipamento do tipo celular que utiliza rede de telefonia e de internet para comunicação interna, consulta de veículo e habilitação, registro de infrações de trânsito (on line), registro de ocorrência de acidente de trânsito, emissão de ficha de missão e relatórios voltados para a fiscalização de trânsito e demais funções afins à autarquia.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:


Julho – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

Agosto – Prestação dos serviços dentro da normalidade. Início da efetiva prestação dos serviços das 70 licenças do BPRv.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

Setembro – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

Outubro – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

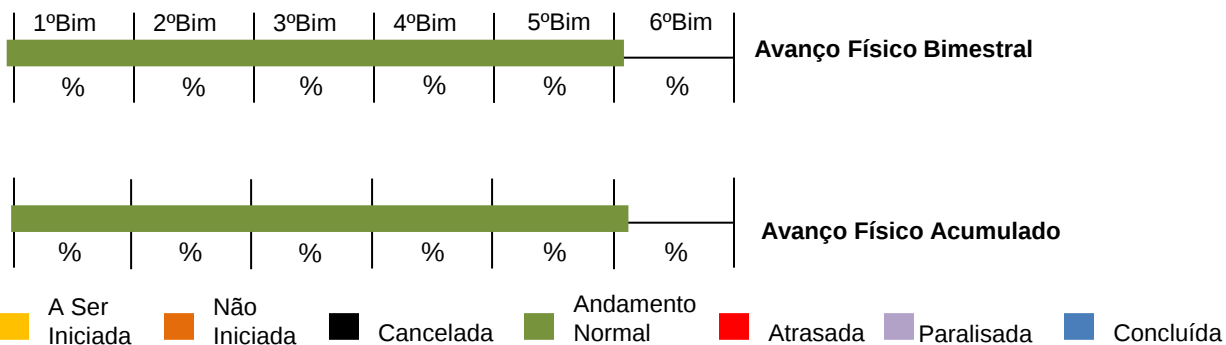

MONITORAMENTO E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO



Programa de Trabalho:

26.782.6215.2541.0001

Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015

Nº do Processo: 113.001.811/2009

Nº do Contrato: 041/2014

Empresa: Eliseu Kopp & Cia. Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2014

Data prevista de conclusão: 24/12/2016

Valor inicial: R\$ 6.445.569,64

Recurso: Fonte 237

Executor: Engº Darione José Maria Cavalcanti de Oliveira


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços de monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos instalados em pontos definidos no Edital da Concorrência nº 008/2010. Complementarmente, deverão ser elaborados inventários, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos, com expedição concomitante de relatório individual para emissão de autos de infração e notificação, utilizando medidores eletrônicos de velocidade fixos de operação autônoma.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:

Andamento normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

Andamento normal.

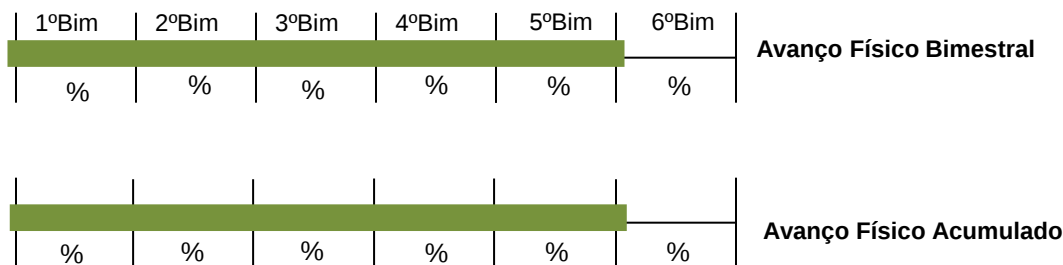

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programas de Trabalho:
 26.782.2800.2904.0001 (2011) e
 26.782.6215.2904.0001 (2012),
 Etapa 27 SAG 2014/ Etapa 14 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.005.681/2010
 Nº do Contrato: 011/2011
 Empresa: Hot Cozinha Industrial
 Data de Início: Março/ 2011
 Data prevista de conclusão: 31/05/2016
 (Quinto Aditivo)
 Valor: R\$ 166.658,02 (Quinto Aditivo)
 Recursos: Fonte 237
 Executor: Fábio Vargas Mendes (IS de
 05/08/2015)


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Lanche para as crianças das Escolas Públicas, que são levadas nos períodos matutino e vespertino, no Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o Trânsito, para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:


No 4º bimestre foram recebidas na Transitolândia 1.576 pessoas que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 100 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. A escola forneceu lanche a todos os visitantes.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

No 5º Bimestre, referente aos meses de setembro e outubro, foram recebidas na Transitolândia 1.919 crianças e 244 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de 16 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. A escola forneceu a todas as crianças um lanche, utilizando o contrato no valor de R\$ 7.014,11.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programa de Trabalho:
26.782.6215.2904.0001
Etapa 27 SAG 2014/ Etapa 14 SAG 2015
Nº do Processo: 113.012.201/2013
Nº do Contrato: 012/2014
Empresa: Travel Bus Ltda - Me
Data de Início: 24/03/2014
Data prevista de conclusão: 23/03/2016
(Primeiro Aditivo)
Valor: R\$ 626.740,35 (Primeiro Aditivo)
Recurso: Fonte 237
Executor: Hendrigo Samagaio de Abreu
(IS de 08/09/2015)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviço de transporte de crianças a serem atendidas pela Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia) do DER-DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:

No 4º bimestre foram recebidas na Transitolândia 1.576 pessoas que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 100 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo DER para viabilizar a chegada dessas crianças a Transitolândia.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

No 5º Bimestre, referente aos meses de setembro e outubro, foram recebidas na Transitolândia 1.919 crianças e 244 professores, que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de 16 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo DER para viabilizar a chegada dessas crianças à Transitolândia, utilizando o contrato no valor de R\$ 34.686,00.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%
---	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO DO DER-DF



Programa de Trabalho:
 26.782.6515.4198.0001
 Etapa 31 SAG 2014/ Etapa 13 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.006.446/2014
 Nº do Contrato Emergencial: 053/2014
 Empresa: Sitran - Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
 Data de Início: 02/08/2014
 Data prevista de conclusão: 02/02/2015
 Valor: R\$ 616.088,04
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Engº Carlos Alberto Mundim Pena

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico do DER-DF, instalados em diversos pontos do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Executado 30% no bimestre. Acumulado 80%. Serviço de natureza contínua.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 20%. Acumulado 100%. Conclusão dos serviços.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
20%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

100%	%	%	%	%	%
------	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO DO DER-DF




Programa de Trabalho:
 26.782.6515.4198.0001
 Etapa 13 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.000.631/2015
 Nº do Contrato Emergencial: 001/2015
 Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
 Data da Assinatura do contrato: 02/03/2015
 Data prevista de conclusão: 28/08/2015
 Valor: R\$ 616.088,04
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Eng.º Carlos Alberto Mundim Pena


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico do DER-DF, instalados em diversos pontos do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:
 Executado 33,3% no bimestre. Acumulado 66,6%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:
 Executado 33,4% no bimestre. Acumulado 100%. Contrato concluído.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída



MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO DO DER-DF



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.4198.0001
 Nº do Processo: 113.012.589/2015
 Nº do Contrato Emergencial: 017/2015
 Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 04/09/2015
 Data prevista de conclusão: 02/03/2016
 Valor inicial: R\$ 808.758,48
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Eng.º Carlos Alberto Mundim Pena

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e, assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico do DER-DF, instalados em diversos pontos do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:
 Executado 33% no bimestre. Acumulado 33%. Andamento normal.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE PAINÉIS DE MENSAGENS MÓVEIS



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 25 SAG 2014/ Etapa 12 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.009.643/2013
 Nº do Contrato: 066/2014
 Empresa: Talentech-Tecnologia Ltda.
 Data de Início: 15/12/2014
 Data prevista de conclusão: 15/12/2015
 Valor: R\$ 3.081.600,00
 Recurso: Fonte 237 e/ou 437 (Primeiro Aditivo)
 Executora: Tainá de Aguiar Botelho

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento, implantação, manutenção e suporte técnico de painéis de mensagens variáveis e sistema de informação e orientação aos usuários, em tempo real e repasse de conhecimento para atender às necessidades do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:
 Quantidade de equipamentos operando: 12 painéis. O gasto em julho foi R\$ 102.720,00 e em agosto R\$ 120.720,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:
 Quantidade de equipamentos operando: 18 painéis. O gasto em setembro foi de R\$ 120.981,32 e em outubro foi de R\$ 150.085,33.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%
---	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

FORNECIMENTO, ATERRAMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO NO-BREAK




Programa de Trabalho:
 26.782.6515.4198.0001 - Etapa 31 SAG 2014
 26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 12 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.007.053/2013
 Nº do Contrato: 067/2014
 Empresa: Sitran - Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
 Data de Início: 06/02/2015
 Data prevista de conclusão: Paralisado até 16/05/2015 (Segundo Aditivo)
 Valor: R\$ 160.000,00
 Recurso: Fonte 237/437
 Executora: Tainá de Aguiar Botelho


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento, aterramento e instalação de 20 equipamentos do tipo no-break, destinados a atender os cruzamentos semaforicos em vias urbanas do DF, incluindo o fornecimento de mão-de-obra e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:
 Em fase de implantação. O contrato foi reiniciado.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:
 Os serviços foram concluídos e pagos em 31 de julho.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO VC-533, LIGAÇÃO DE BRAZLÂNDIA A PADRE LÚCIO



Programa de Trabalho:

28.782.6216.1475.1199

Etapa 86 SAG 2014/ Etapa 30 SAG 2015

Nº do Processo: 113.005.439/2012

Nº do Contrato: 039/2013

Empresa: NG Engenharia e Construções Ltda.

Data da assinatura do contrato: 22/11/2013

Data prevista de conclusão: 28/10/2015

(Quinto Aditivo)

Valor: R\$ 5.405.070,40 + R\$ 1.299.126,98= R\$

6.704.197,38 (Quarto Aditivo)

Recurso: Fonte 100, 135 (Terceiro Aditivo)

Executor: Engº Antônio Gomes da Silva Filho

População da RA IV: 50.490


DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de obras para pavimentação de toda a extensão da rodovia vicinal VC-533, além de implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre o seu entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF/180 e a divisa com estado do Goiás (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio). Extensão de 3,852 km. Cc nº 005/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:


Executado 10% no bimestre. Acumulado 55%. Foi executado terraplenagem, sub-leito e sub-base da estaca 3+000 a 3+800.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

Executado 15% no bimestre. Acumulado 70%. Foi executado capa (CBUQ) da estaca 0+400 à estaca 2+600 e da estaca 3+000 à 3+800.




Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

DUPLICAÇÃO DA DF-463

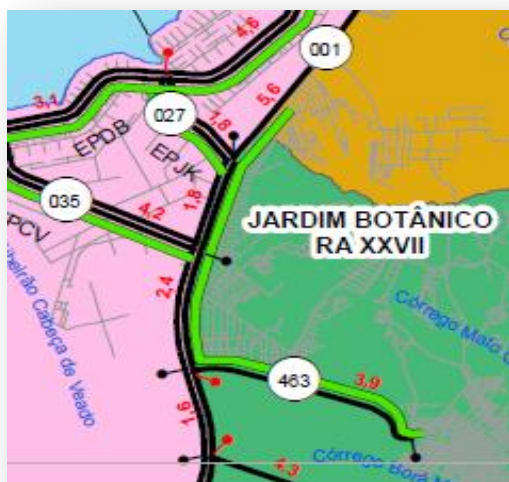

Programa de Trabalho:

26.782.6216.1475.1199

Etapa 82 SAG 2014/ Etapa 28 SAG 2015

Nº do Processo: 113.005.051/2010

Nº do Contrato: 043/2014

Empresa: Serterra Transportes Escavações
Terraplenagem e Pavimentação Ltda.

Data do Início: 10/07/2014

Data prevista de conclusão: 26/12/2015
(Sétimo Aditivo)

Valor: R\$ 6.552.350,76 (Sexto Aditivo)

Recurso: Fonte 100 e 135 (Quinto Aditivo)

Executor: Engº Guilherme José da Fonseca
Berniz

População das RA's XXVII e XIV: 123.455


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução das obras de duplicação da rodovia DF-463, adequação da rodovia e acessos aos Setores Habitacionais Mangueiral e Jardim Botânico. Extensão de 3,9 km. Cc nº 001/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:


Executado 10% no bimestre. Acumulado 40%. Continuam os serviços preliminares, terraplenagem e pavimentação.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

Executado 19% no bimestre. Acumulado 59%. Continuam os serviços de terraplenagem e pavimentação e iniciados os serviços de drenagem, obras de Arte Correntes e imprimação.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

IMPLANTAÇÃO DA MARGINAL DA DF-480



Programa de Trabalho:
26.782.6216.1475.1199
Etapa 83 SAG 2014/ Etapa 29 SAG 2015
Nº do Processo: 113.001.927/2014
Nº do Contrato: 046/2014
Empresa: GW Construções e Incorporações Ltda.
Data da Assinatura do Contrato: 22/07/2014
Data prevista de conclusão: 31/01/2016
(Sétimo Aditivo)
Valor inicial: R\$ 4.459.511,78
Recurso: Fonte 100 e 135 (Sexto Aditivo)
Executor: Engº Eli Câmara
População das RA's II e XIII: 256.851


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução das obras de implantação da marginal da rodovia DF-480, trecho entre a DF-001 e a UNB, com extensão de 6.001,24 m, compreendendo eixo principal e acessos. Cc nº 003/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:

Executado 23% no bimestre. Acumulado 48%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

Executado 43% no bimestre. Acumulado 91%. Foram concluídos os serviços de terraplenagem, sub-base, base em BGS e pavimentação.

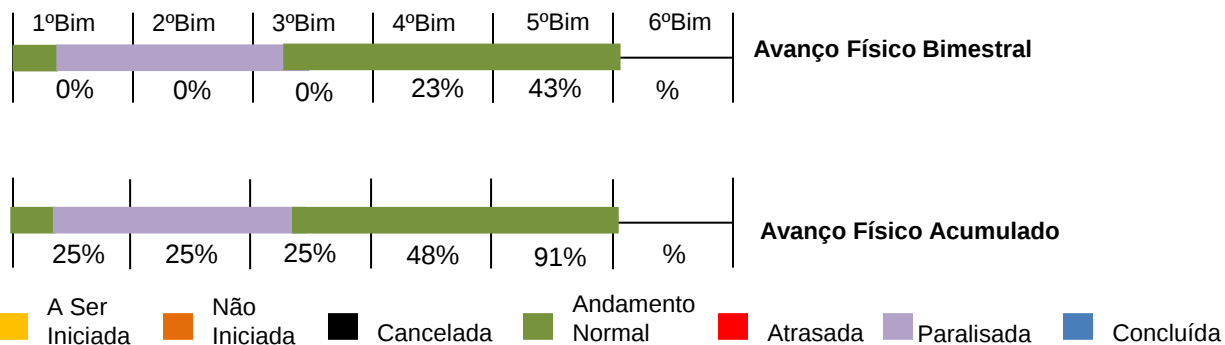

SERVIÇOS DE SONDAGEM NAS RODOVIAS DF-001, DF-095, VC-533 E DF-047



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1475.1199 (2014)
 26.782.6216.4195.0001 (Primeiro Aditivo)
 Nº do Processo: 113.006.645/2014
 Nº do Contrato: 065/2014
 Empresa: Evolução Engenharia, Construção e Administração Ltda. - EPP
 Data da Assinatura do Contrato: 04/12/2014
 Data prevista de conclusão: 17/07/2015
 Valor inicial: R\$ 20.495,90
 Recurso: Fonte 100, 220, 420 (Primeiro Aditivo)
 Executor: Willkerson Victor da Silva

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução de sondagem na Rodovia DF-001, DF-095 e VC -533, no trecho: nas proximidades da Escola Fazendária(ESAF), Posto BPRv e Ponte Córrego Monjolo, respectivamente, e DF-047, no trecho: entre a intersecção das rodovias DF-025 (EPDB) com a DF-047 (EPAR) e a ponte no córrego Riacho Fundo (sentido Brasília/Aeroporto/Brasília) tudo conforme especificações nos anexos do Convite nº 01/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:
 Executado 100% no bimestre.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	100%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	100%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

EXECUÇÃO DE CICLOVIA NA VILA BASEVI



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1475.1199
 Nº do Processo: 113.005.569/2014
 Nº do Contrato: 002/2015
 Empresa: NG Engenharia e Construções Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 20/04/2015
 Data prevista de conclusão: 21/07/2015
 Valor inicial: R\$ 330.539,54
 Recurso: Fonte 135
 Executor: Bruno Sousa Almeida
 Substituta: Valéria Gonçalves Regis
 População da RA XXVI: 98.700

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução da obra de revestimento da ciclovia, trecho entre a DF-001 e a Vila Basevi com extensão de 1.462 m e largura de 3,00 m, conforme o Edital de Tomada de Preço nº 003/2014.



AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:

Executado 95% no bimestre. Acumulado 95%. Foram feitos os seguintes serviços:

- ✓ Execução de sub-base e base do pavimento;
- ✓ Execução de pavimento rígido em concreto usinado;
- ✓ Fornecimento e assentamento de cordão de concreto;
- ✓ Paisagismo concluído com fornecimento, adubação e plantio de brama batatais em placas.


AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:

Executado 5% no bimestre. Acumulado 100%. A sinalização vertical e horizontal foram concluídas. A obra foi finalizada, o termo de recebimento provisório já foi emitido e aguardando o termo de recebimento definitivo.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

RESTAURAÇÃO DA DF-035 (EPCV)

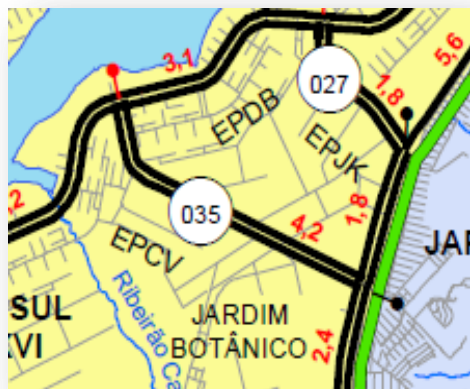

Programa de Trabalho:

26.782.6216.1475.1199

Nº do Processo: 113.003.227/2014

Nº do Contrato: 005/2015

Empresa: JM Terraplenagem e Construções Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 28/04/2015

Data prevista de conclusão: 01/12/2015

Valor inicial: R\$ 3.679.562,85 + R\$ 48.482,26 =

R\$ 3.728.045,11 (Segundo Aditivo)

Recurso: Fonte 135

Executor: Mozer Teixeira de Castro

Substituto: Geraldo Jacinto da Silva Filho

População da RA XXVII: 25.335

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução das obras de restauração da rodovia DF-035 (EPCV), no trecho compreendido entre a DF-025 (EPDB) e o entroncamento com a DF-001 (EPCT) com extensão aproximada de 4,0 Km, incluindo serviços de sinalização horizontal, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 008/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:

Execução de 45% no bimestre. Acumulado 80%. Foram executados os seguintes serviços:

- ✓ Execução de reparos localizados no trecho do Balão QI 23/Balão Big Box;
- ✓ Execução de revestimento asfáltico no trecho do Balão QI 23/Balão Big Box;
- ✓ Fresagem do revestimento asfáltico entre a DF-025/Balão QI 23 e aplicação de revestimento asfáltico;
- ✓ Restauração com adição de cimento no Balão da QI 23.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:


Executado 10% no bimestre. Acumulado 90%. Foi realizada a sinalização horizontal na pista de rolamento e ciclovia.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	35%	45%	10%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	35%	80%	90%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

RESTAURAÇÃO DA DF-440, TRECHO ENTRE A DF-263 E BR-020 – LOTE 01

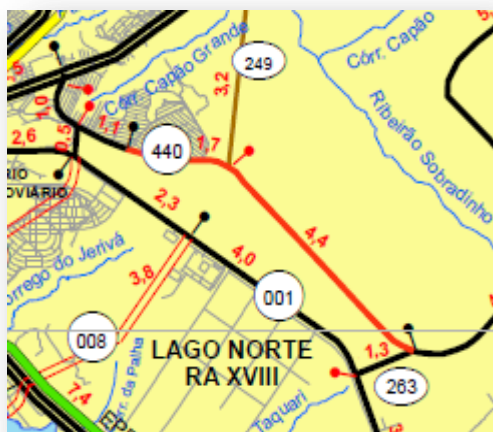

Programa de Trabalho:

26.782.6216.1475.1199

Nº do Processo: 113.007.456/2013

Nº do Contrato: 068/2014

Empresa: NG Engenharia e Construções Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 30/12/2014

Data prevista de conclusão: 03/12/2015

Valor: R\$ 1.242.554,42

Recurso: Fontes 100, 348

Executor: Eng.º Kênio Márcio Avelar

Substituto: Geraldo Jacinto da Silva Filho

População das RA's V, XXVI e XXVIII:
221.522

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução das obras de restauração da rodovia DF-440, no trecho compreendido entre a VC-263 e BR-020 (próximo a Sobradinho), do km 15,4 ao km 21,1, denominado Lote 01. Extensão de 5,7 km. Cc nº 011/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:

Executado 64% no bimestre. Acumulado 64%. Os serviços realizados foram:

- ✓ Fresagem contínua do revestimento betuminoso;
- ✓ Sub-base ou base de solo estabilizado;
- ✓ Sub-base ou base de brita graduada;
- ✓ Fornecimento de asfalto diluído CM-30.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:


Executado 26% no bimestre. Acumulado 90%. Foram executados os serviços de pavimentação asfáltica.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	64%	26%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	%	64%	90%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

**PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE EIA/RIMA, DESTINADOS À
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS ENTRE
AS CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E PLANO PILOTO – CORREDOR EIXO
NORTE.**

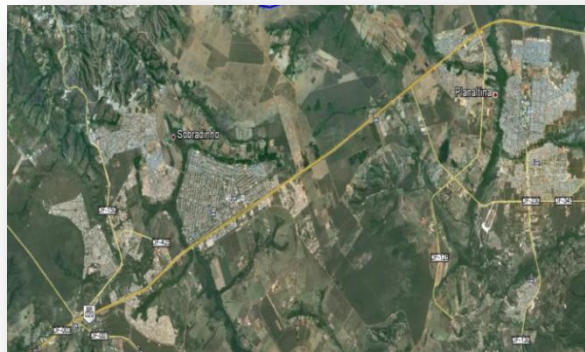

Programa de Trabalho:

26.782.6216.1968.0013 (2012)

Etapa 42 SAG 2014/ Etapa 31 SAG 2015

Nº do Processo: 113.009.340/2011

Nº do Contrato: 063/2012

Empresa: Consórcio DF Interligado

Data de Início: 26/11/2012

Data prevista de conclusão: 31/10/2015

(Quinto Aditivo)

Valor: R\$ 12.251.695,70 + R\$ 233.714,04

(Terceiro Aditivo)= R\$ 12.485.409,74

Recurso: Fonte 100, 135 (Quarto Aditivo)

Executora: Eng.^a Ery do Nascimento Brandi de
Oliveira (Instrução de Serviço de 18/03/2015)

População das RA's VI, V,XXVI e I: 563.648

DESCRIÇÃO DA OBRA: Projeto Executivo de Engenharia e de EIA/RIMA, destinados à implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto – Corredor Eixo Norte.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:

Executado 3,12% no bimestre. Acumulado 93,07%. As etapas realizadas foram: Aditivo dos Estudo Geológico-Geotécnico (Sondagem Rotativa): 0,75%; Projeto Executivo de Drenagem e OAC: 0,23%; Projeto Executivo de Obras de Arte Especiais: 0,41%; Projeto Executivo de Obras Complementares:0,16%; Projeto Executivo de Sistemas de ITS: 0,55%; Projeto Executivo de Estações, Terminais e Garagens: 0,09%; Projeto Executivo de Paisagismo: 0,74%; Quantitativos, Custos, Orçamentos e Cronograma de Implantação:0,20%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 93,07%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	3,11%	3,12%	0%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
83,24%	83,24%	89,94%	93,07%	93,07%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EIA/RIMA, DESTINADO AO CORREDOR EIXO SUDOESTE.



Programa de Trabalho:

26.782.6216.1968.0013

Etapa 72 SAG 2014/ Etapa 32 SAG 2015

Nº do Processo: 113.001.608/2013

Nº do Contrato: 036/2013

Empresa: ITEC Infra Tech Engenharia e Consultoria S.A

Data da assinatura: 17/10/2013

Data prevista de conclusão: 31/12/2015

(Sexto Aditivo)

Valor: R\$ 9.681.024,81

Recurso: Fontes 100, 235 (Primeiro Aditivo), 135 (Segundo Aditivo), 335 (Sexto Aditivo)

Executores: Fabrício Ferreira Faiad, Elcy Ozório dos Santos, Wilson Eulálio Porto, Luciano dos Santos (Instrução de Serviço de 15/06/2014)

População das RA's XV, XVII, XXI, XII, III, VIII e I: 896.378

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração de projeto executivo de engenharia e EIA/RIMA, destinado a implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Taguatinga, Núcleo Bandeirantes e o Plano Piloto – Corredor Eixo Sudoeste.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 62,58%. Não foi realizada nenhuma etapa.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 62,58%. Não foi realizada nenhuma etapa.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	4,10%	0%	0%	%


Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
58,48%	58,48%	62,58%	62,58%	62,58%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA DF-206 E DA DF-170

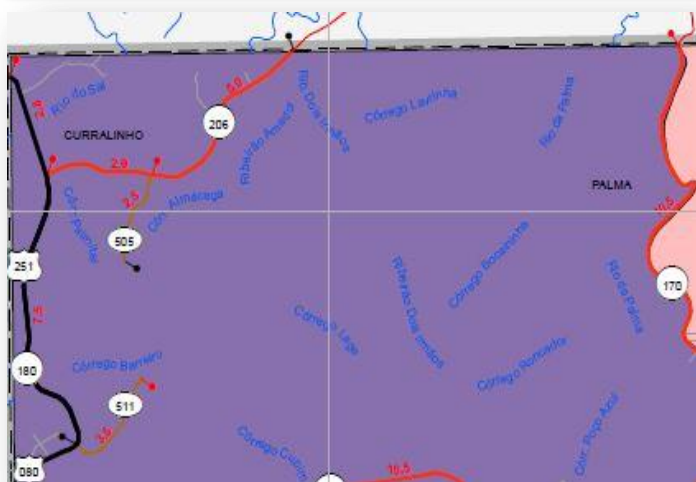


Programa de Trabalho:
26.782.6216.1968.0013
Etapa 81 SAG 2014/ Etapa 33 SAG 2015
Nº do Processo: 113.003.206/2012
Nº do Contrato: 013/2014
Empresa: Skill Engenharia Ltda.
Data de início: 26/03/2014
Data prevista de conclusão: 22/09/2015
(Segundo Aditivo)
Valor: R\$ 2.231.470,28
Recurso: Fonte 100
Executor: Engº Roberto Léda Saldanha
(Instrução de Serviço de 02/09/2014)
População da RA IV: 50.490

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração do Projeto Básico de Engenharia para Pavimentação das Rodovias: DF-206 – no trecho compreendido do entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF-180 ao entroncamento com a rodovia DF-170, incluindo-se o segmento no Estado de Goiás, numa extensão total aproximada de 19,5 km e na DF-170 – no trecho compreendido do entroncamento com a rodovia DF-206 ao entroncamento com a rodovia DF-001 (EPCT), numa extensão de 10,5 km.


AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:
Executado 0% no bimestre. Acumulado 70%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:
Executado 30% no bimestre. Acumulado 100%. Projeto concluído. Aguardando pagamento da última fatura e restos a pagar.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:
Projeto 100% concluído. Pagamento dos restos a pagar efetuado.




Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DA DF-250

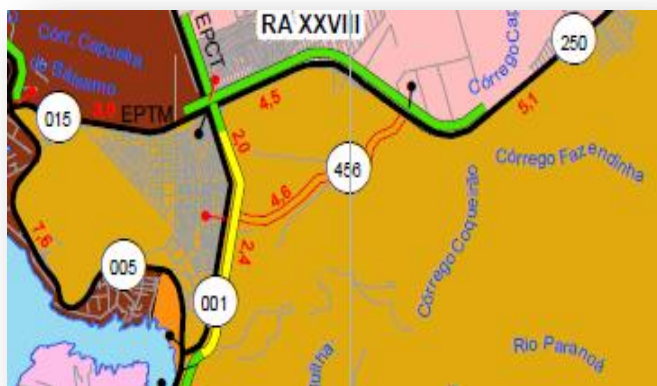

Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1968.0013
 Etapa 85 SAG 2014/ Etapa 34 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.013.987/2013
 Nº do Contrato: 023/2014
 Empresa: STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A.
 Data de Início: 20/05/2014
 Data prevista de conclusão: 30/01/2015 (Terceiro Aditivo)
 Valor: R\$ 492.214,41 + R\$ 112.645,13 = R\$ 604.859,54 (Segundo Aditivo)
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº Willkerson Victor da Silva
 População da RA XXVIII: 59.772

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração de projeto executivo de engenharia para duplicação da DF-250, no seguimento compreendido do entroncamento com a DF- 001 (EPCT) e DF- 015 (EPTM) até o acesso a Sobradinho dos Melos, com extensão aproximada de 5,3 km.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Executado 21% no bimestre. Acumulado 90%. A Empresa entregou os produtos referentes ao contrato, foram analisados e foram devolvidos com as ponderações do executor para que possam ser feitos os ajustes e complementos necessários.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Obra 100% concluída no 6º bimestre. Último pagamento inserido em Reconhecimento de Dívida.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%


Avanço Físico Bimestral

100%	%	%	%	%	%
------	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSULTORIA EM ENGENHARIA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

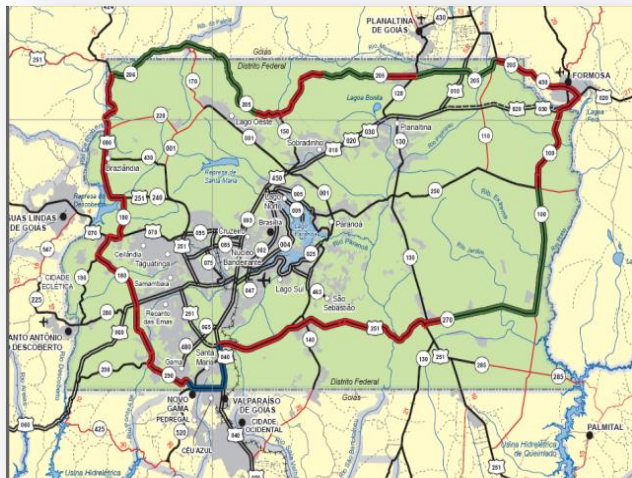

Programa de Trabalho:

26.782.6216.1968.0013

Nº do Processo: 113.000.942/2014

Nº do Contrato: 006/2015

Empresa: Strata Engenharia Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 15/06/2015

Data prevista de conclusão: 08/06/2016

Valor inicial: R\$ 7.151.845,29

Recurso: Fonte 135

Executores: Wellington Rodrigues dos Santos,
Stênio Fonseca da Costa e Willkerson Victor
da Silva (Instrução de Serviço nº 136,
22/07/2015)

População das RA's VI, VII, XIV, XIII, II, XV, XII,
IX, IV, V e XXVI: 1.620.965

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa de consultoria em engenharia para análise e adequações nos produtos oriundos do contrato 040/2008 e a elaboração dos projetos básico e executivo para implantação do Anel Viário do Distrito Federal conforme Edital de Concorrência nº 002/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 0%. Houve algumas reuniões com a empresa executora, mas não foi entregue nenhum produto. Está em andamento a revisão do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 0%. No dia 03/09/2015 os Executores realizaram a segunda reunião de acompanhamento, na qual a empresa contratada forneceu informações sobre o andamento dos serviços. A empresa contratada informou que está em desenvolvimento a análise e adequação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. No dia 06/10/2015 a empresa contratada entregou o “Relatório de EVTEA” (Produto Fase A).

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	0%	0%	%


Avanço Físico Bimestral

%	%	%	0%	0%	%
---	---	---	----	----	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF

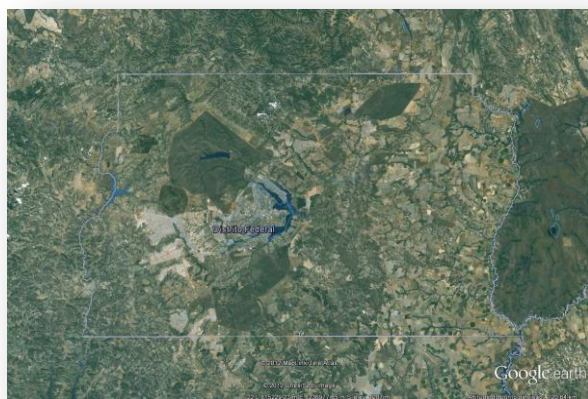


Programa de Trabalho:
 26.782.6216.3711.6162 (2013)
 Etapa 52 SAG 2014/ Etapa 35 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.005.428/2006
 Nº do Contrato: 002/2010
 Empresa: Geo-Lógica Consultoria Ambiental
 Data de início: 19/02/2010
 Data prevista de conclusão: Paralisada até
 19/04/2015 (Nono Aditivo)
 Valor: R\$ 1.303.632,37
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Engº Paulo Roberto da Silva


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central (DF e Goiás).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 80%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:
 Executado 20% no bimestre. Acumulado 100%. Serviço concluído.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA



Programa de Trabalho:

26.782.6216.4195.0001 Etapa 55 SAG 2014

26.782.6216.1475.1199 (Primeiro Aditivo)

Nº do Processo: 113.002.690/2014

Nº do Contrato: 028/2014

Empresa: Ultrapav Ltda. - ME

Data da Assinatura do Contrato: 09/05/2014

Data prevista de conclusão: 09/05/2015

Valor inicial: R\$ 2.079.989,34

Recurso: Fontes 100, 300, 220 e/ou 420

Executor: Engº Jarbas Alessandro Martins da Silva

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de 11.622 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ para atender às demandas de tapa buracos, recapeamento asfáltico e pavimentação.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

Executado 5% no bimestre. Acumulado 41%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:

Executado aproximadamente 2,4% no bimestre. Acumulado 43,4%. Contrato concluído.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
0%	5%	2,4%	%	%	%	Avanço Físico Bimestral

36%	41%	43,4%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E ENCARREGADO



Programa de Trabalho:

26.782.6216.4195.0001

Etapa 55 SAG 2014/ Etapa 17 SAG 2015

Nº do Processo: 113.000.098/2013

Nº do Contrato: 045/2014

Empresa: Interativa Dedetização, Higienização e Conservação Ltda.

Data de Início: 22/07/2014

Data prevista de conclusão: 21/01/2016
(Segundo Aditivo)

Valor estimado: R\$ 3.139.298,16

Recurso: Fonte 100

Executor: Engº Jarbas Alessandro Martins da Silva

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação dos serviços especializados de conservação, limpeza e manutenção simples das rodovias do Distrito Federal, nos Distritos Rodoviários, unidades Administrativas e nas Regiões de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, sob a supervisão do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:


Executado 26% no bimestre. Acumulado 85% em relação ao prazo inicial do contrato.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:

Andamento normal do contrato.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

Andamento normal do contrato.

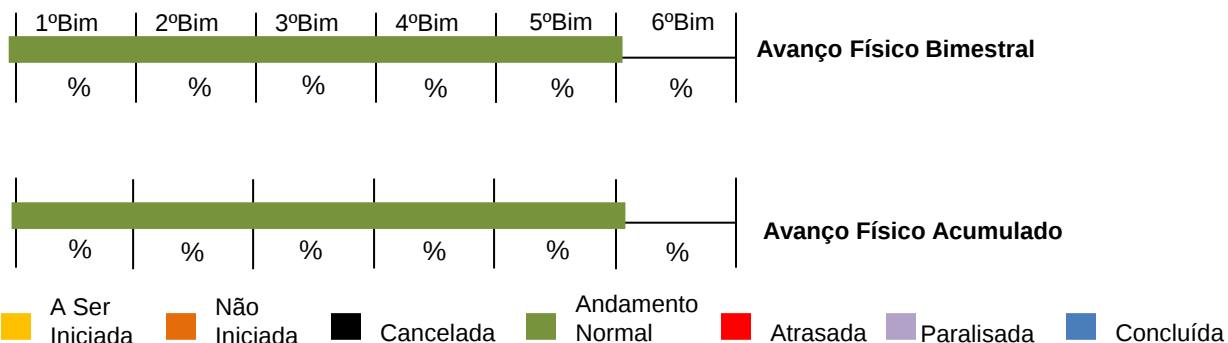

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA



Programa de Trabalho:

26.782.6216.4195.0001

Nº do Processo: 113.002.159/2014

Nº do Contrato: 004/2015

Empresa: Distribuidora Brasileira de Asfalto S/A-DISBRAL

Data da Assinatura do Contrato: 28/04/2015

Data prevista de conclusão: 30/04/2016

Valor Inicial: R\$ 158.869,00

Recurso: Fonte 100

Executor: Eng.º Luiz Geraldo Rangel Vilela



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento parcelado de 100 toneladas de emulsão asfáltica para imprimação, fabricação produto ecológico, diluição através de água. Não utilização de solventes e nem produtos químicos, tais como derivados de petróleo.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:

Não houve fornecimento de emulsão asfáltica esse bimestre.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

Não houve fornecimento de emulsão asfáltica esse bimestre.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001
 Nº do Processo: 113.004.578/2015
 Nº do Contrato: 007/2015
 Empresa: Petrobrás Distribuidora S/A
 Data de início: 22/07/2015
 Data prevista de conclusão: 22/07/2016
 Valor Inicial: R\$ 247.900,00
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Eng.º Luiz Geraldo Rangel Vilela



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento parcelado de 160 toneladas de Emulsão Asfáltica Catiônica de ruptura média, tipo RM-1C.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:

Não houve fornecimento de emulsão asfáltica esse bimestre.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

Não houve fornecimento de emulsão asfáltica esse bimestre.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001
 Nº do Processo: 113.004.578/2015
 Nº do Contrato: 009/2015
 Empresa: Centro Oeste Asfalto Ltda.
 Data de início: 16/07/2015
 Data prevista de conclusão: 16/07/2016
 Valor Inicial: R\$ 142.700,00
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Eng.º Luiz Geraldo Rangel Vilela

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento parcelado de 100 toneladas de Emulsão Asfáltica Catiônica de Ruptura Rápida, tipo RR-2C.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:
 Houve fornecimento de 3,8% de emulsão asfáltica.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:
 Houve fornecimento de 3,8% de emulsão asfáltica.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

REMOÇÃO DE ENGENHOS PUBLICITÁRIOS E OCUPAÇÕES IRREGULARES DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS DO DF E DA RIDE



Programa de Trabalho:

26.782.6216.4195.0001

Nº do Processo: 113.005.021/2013

Nº do Contrato: 012/2015

Empresa: GB da Silva – Esquadrias &

Equipamentos de Sinalização-EPP

Data da Assinatura do Contrato: 03/08/2015

Data prevista de conclusão: 28/07/2016

Valor inicial: R\$ 953.610,96

Recurso: Fonte 100

Executor: Hans Fernandes de Lemos

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços do tipo remoção de engenhos publicitários e ocupações irregulares das faixas de domínio das rodovias do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno-RIDE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Edital de Pregão nº 042/2015.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:

Executado no bimestre 0,54%. Acumulado 0,54%. Nesse início de contrato foram apreendidos/recolhidos 23 outdoors, 01 front-light, 270 faixas, 01 banner e 65 placas; Todos os serviços prestados até o momento estão dentro da normalidade.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

Executado 7,84% no bimestre. Acumulado 8,38%. Durante esse bimestre foram apreendidos/recolhidos 23 outdoors, 02 fronts-light, 4213 faixas, 194 banners, 840 placas, 05 barracas e 01 produtos comercializados à margem da rodovia; Todos os serviços prestados até o momento estão dentro da normalidade.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	0,54 %	7,84%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	%	0,54%	8,38%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ALAMBRADO E MURO DE DIVISA DO 5º DISTRITO RODOVIÁRIO DO DER-DF




Programa de Trabalho:
 26.451.6216.3197.0001 (2013)
 26.451.6010.1984.9792 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 76 SAG 2014/ Etapa 24 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.010.563/2011
 Nº do Contrato: 042/2013
 Empresa: Mendonça Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP
 Data de Início: 11/12/2013
 Data prevista de conclusão: 02/11/2015 (Oitavo Aditivo)
 Valor: R\$ 309.242,70
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº Sérgio Henrique Rezende Valle

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução das obras de reforma e acabamento da Nova Sede do 5º Distrito Rodoviário do DER-DF, localizado na Vila São José DF-180, Km 19 – Brazlândia-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 73,2%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 73,2%.

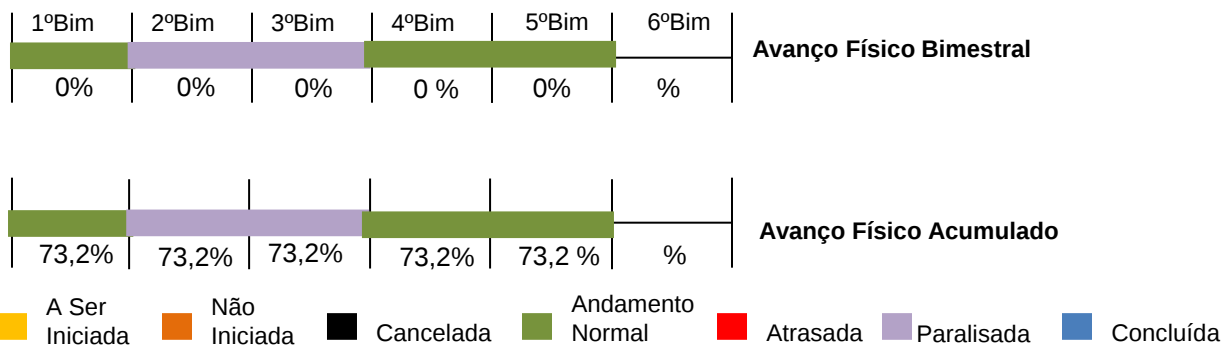

CONSTRUÇÃO DA SEDE E ILUMINAÇÃO EXTERNA DO 4º DISTRITO RODOVIÁRIO DO DER/DF



Programas de Trabalho:

26.451.6216.3197.0001 (2013)

26.451.6010.1984.9792 (Primeiro Aditivo)

Etapa 77 SAG 2014/ Etapa 25 SAG 2015

Nº do Processo: 113.002.641/2010

Nº do Contrato: 043/2013

Empresa: Mendonça Construtora e Incorporadora Ltda. – EPP

Data de Início: 11/12/2013

Data prevista de conclusão: 09/11/2015

(Oitavo Aditivo)

Valor: R\$ 408.254,65

Recurso: Fonte 100

Executor: Engº Cyrino Flávio Ferreira Silva
(Instrução de Serviço, 19/01/2015)



DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de reforma e acabamento na nova Sede do 4º Distrito Rodoviário do DER/DF localizado no Setor de Área Especial nº 02, rodovia DF-130, km 53 – Paranoá.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:

Executado 0%. Acumulado 55%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

Executado 0%. Acumulado 55%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA GERÊNCIA DE CONTROLE OPERACIONAL (GECOP) – SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO DER





Programa de Trabalho:
26.451.6010.1984.9792
Etapa 16 SAG 2014/ Etapa 23 SAG 2015
Nº do Processo: 113.003.265/2011
Nº do Contrato: 008/2014
Empresa: Titan Construções e Investimentos Imobiliários Ltda.
Data de Início: 27/02/2014
Data prevista de conclusão: Paralisado até 21/03/2015 (Segundo Aditivo)
Valor: R\$ 934.540,32
Recurso: Fonte 100
Executor: Engº Darione José Maria Cavalcanti de Oliveira

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução das obras de construção do Edifício Sede da Gerência de Controle Operacional – GECOP da Superintendência de Trânsito.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
Executado 0% no bimestre. Acumulado 50%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:
Executado 0% no bimestre. Acumulado 50%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:
Rescindido unilateralmente.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA GETEC/SUTEC



Programa de Trabalho:

26.451.6010.3903.9710

Nº do Processo: 113.008.694/2010

Nº do Contrato: 014/2015

Empresa: MULTICON Engenharia Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 24/08/2015

Data da Assinatura da Instrução de Serviço:
08/09/2015

Data prevista de conclusão: 07/03/2016

Valor: R\$ 486.939,00

Recurso: Fontes 100

Executor: Eng.º Elcy Ozório dos Santos

Substituto: Dan Imbroise Brant Teixeira

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução das obras de restauração de reforma do Edifício Sede da GETEC, localizado no Parque Rodoviário do DER-DF, Rodovia DF-001, km 0, Sobradinho-DF. TP nº 006/2011.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

Executado 0%. Acumulado 0%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	0%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	0%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 01




Programa de Trabalho:
 26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 79 SAG 2014/ Etapa 26 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.007.877/2012
 Nº do Contrato: 018/2014
 Empresa: Trier Engenharia Ltda.
 Data de Início: 13/05/2014
 Data prevista de conclusão: Paralisado até 27/11/2015 (Nono Aditivo)
 Valor: R\$ 32.679.197,28 + R\$ 655.000,00 (Quarto Aditivo)
 Recurso: Fontes 135, 100 (Segundo Aditivo), 231 (Terceiro Aditivo)
 Executores: Fábio Cardoso da Silva, Bruno Sousa Almeida e Elcy Ozório dos Santos (Instrução nº 65, 19/05/14, DODF nº 100, 21/05/14 e Instrução nº 165, 20/08/15, DODF nº 166, 27/08/2015)
 População da RA V: 63.050

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 0,0 ao km 2,5, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 1%. Obra paralisada.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 1%. Obra paralisada.

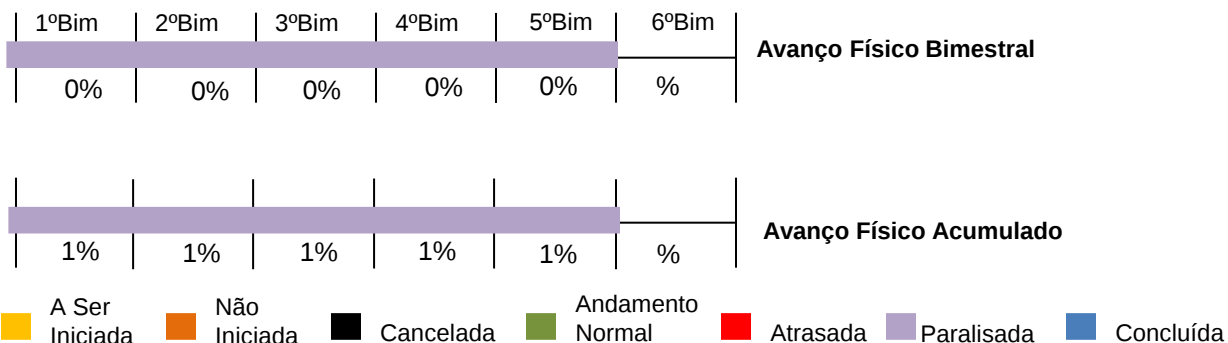

REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 02



Programa de Trabalho:

26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)

Etapa 80 SAG 2014/ Etapa 27 SAG 2015

Nº do Processo: 113.004.262/2014

Nº do Contrato: 021/2014

Empresa: Consórcio JM/Cidade

Data de Início: 14/05/2014

Data prevista de conclusão: Paralisado até 01/12/2015 (Nono Aditivo)

Valor: R\$ 39.829.963,10

Recurso: Fontes 135, 100 (Segundo Aditivo), 231 (Quarto Aditivo)

Executores: Fábio Cardoso da Silva, Jarbas Alessandro Martins da Silva e Elcy Ozório dos Santos (Instrução nº 66, 19/05/14, DODF nº 100, 21/05/14 e Instrução nº 166, 20/08/15, DODF nº 166, 27/08/15).

População da RA V: 63.050



DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 2,5 ao km 5,2, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 19,7%. Obra Paralisada.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 19,7%. Obra Paralisada.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

DESCENTRALIZAÇÃO PARA O DER: IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE, REMODELAÇÃO DA PONTE DO BRAGHETTO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DF-002 (ERN) E DF-007 (EPTT)



Programa de Trabalho:

26.782.6216.3056.0003

26.782.6216.1475.1199 (Primeiro Aditivo)

Nº do Processo: 113.007.878/2012

Nº do Contrato: 025/2014

Empresa: Consórcio Via Engenharia/Conterc – Construção, Terraplenagem e Consultoria Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 26/05/2014

Data prevista de conclusão: Paralisado até 27/11/2015 (Sexto Aditivo)

Valor inicial: R\$ 79.632.741,77

Recurso: Fontes 135, 231 (Primeiro Aditivo)

Executores: Fábio Cardoso da Silva, Samuel Dias Júnior e Geraldo Jacinto da Silva Filho (Instrução nº 72, 29/05/14)

População das RA's XVIII e I: 250.607


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução de obras para Implantação do Trevo de Triagem Norte (TTN), remodelação da Ponte do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego em 2,1 km da rodovia DF-007 (EPTT), no trecho compreendido entre a DF-002 e o entroncamento com a DF-003/BR-450 (Balão do Torto), e em 0,4 km da rodovia DF-002 (ERN), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-007 (ponte do Braghetto) até o acesso às vias W1/W3, execução de estrutura cicloviária, bem como a elaboração dos projetos executivos decorrentes das obras de artes especiais a serem implantadas e remodeladas. Cc nº 002/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2015:


Executado 0% no bimestre. Acumulado 0,3%. Obra paralisada.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 0,3%. Obra paralisada.

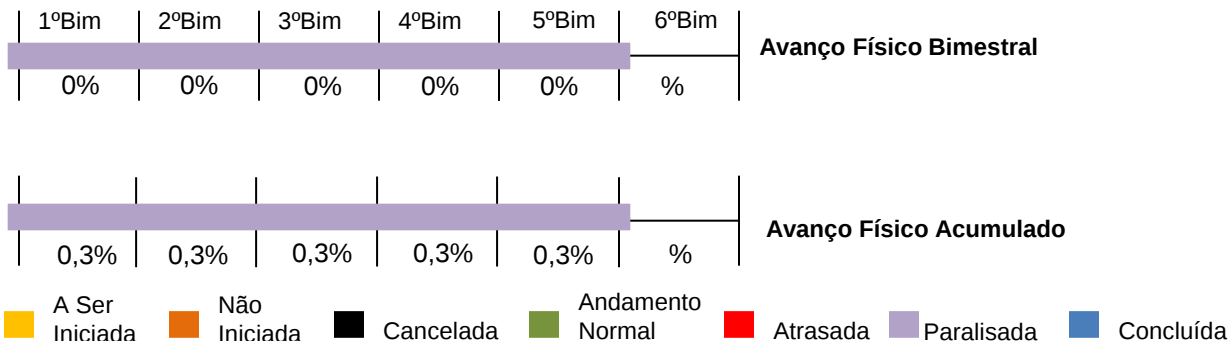

DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL

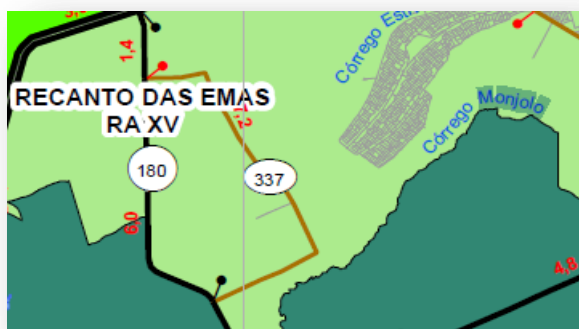

Programa de Trabalho:
 26.782.6216.3361.4359
 Etapa 40 SAG 2015 (UO 22.101)
 Nº do Processo: 112.004.068/2011
 Nº do Contrato: 005/2014- SO
 Prazo de Execução: 21/07/2014
 Prazo de Vigência: 21/10/2014
 Valor: R\$ 494.038,57
 Recurso: Fonte 100
 Executoras: Alessandra Guimarães de Oliveira Santos e Silvia Cristina Sardinha Maia

Portaria Conjunta nº 03, de 13 de fevereiro de 2014 (DODF nº 37, 18/02/2014)

De: UO: 26.205 – Departamento de Estradas de Rodagem – DER
 UG: 200.202 - Departamento de Estradas de Rodagem – DER
 Para: UO: 22.101 – Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal
 UG: 190.101 - Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Descentralização de créditos orçamentários destinados a custear despesas com a contratação das obras de construção de Ponte sobre o Córrego Monjolo, localizada no Núcleo Rural Monjolo, Recanto das Emas/DF, cuja meta é a construção de 101 m².

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 5%. Obra paralisada pela NOVACAP para aguardar Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA) do projeto de reforço da estrutura.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 5%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
5%	%	%	%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída
