

Relatório de Atividades 6º Bimestre/2017

CONSTRUÇÃO DAS VIAS MARGINAIS NA DF-047 (EPAR)



Programas de Trabalho: 26.782.6216.3005
 Nº do Processo: 113.007409/2016
 Nº do Contrato: 015/2017
 Empresa: JM Terraplenagem e Construções Ltda. E Iguatemi Consultoria e serviços de Engenharia Ltda
 Data de início: 21/07/2017
 Data prevista de conclusão: 360 dias
 Valor: R\$ 18.176.585,20
 Recurso: Fonte 135 - Caixa
 Comissão Executora: Geraldo Jacinto da Silva Filho, Eugênio Macarajá de Moraes e Maria de Fátima Mendonça Siqueira


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: construção das vias marginais na DF-047 (EPAR), no trecho compreendido entre as rodovias DF-051 (EPGU) até a DF-002 (ERS) - Trevo de Triagem Sul a implantação de novas faixas de rolamento e acostamento com ciclovia no trecho DF-025 (EPDP) até a DF-051 (EPGU) e adequação da geometria da rodovia (agulhas, mesas e taper).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:

Executado 7,01% no bimestre. Acumulado 7,01%. Foram realizados: terraplanagem e pavimentação das agulhas 01 e 02; terraplanagem do trecho 2 Eixo B, C e D; drenagem do Eixo A.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:

Executado 0,52% no bimestre. Acumulado 14,07%. Foram realizados: terraplanagem e pavimentação das agulhas 01 e 02; terraplanagem do trecho 2 Eixo B, C e D; drenagem do Eixo A.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DA CICLOVIA E CICLO FAIXA – DF-290

40



Programas de Trabalho: 26.451.6216.3090.0008
 Nº do Processo: 113.012.858/2015
 Nº do Contrato: 009/2017
 Empresa: SIGMA – Locação de Máquinas e Serviços de Terraplenagem EIRELI-ME.
 Data de início: 17/05/2017
 Data prevista de conclusão: 12/01/2018
 Valor: R\$ 2.251.927,81
 Recurso: Fonte 335 (Banco do Brasil)
 Executor: Eli Câmara


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução das Obras para construção e sinalização da ciclovia e ciclo faixa (= 8km) na DF-290, SRDF 290EDF0090 ao 290EDF0130, no subtrecho compreendido entre o entroncamento de acesso ao Gama e o entroncamento com a rodovia BR-040/BR-050. As intervenções têm como objetivo prover a rodovia de uma rota ciclável segura e confortável. As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, sinalização, drenagem, obras complementares e compensação florestal, conforme estabelecido nos projeto a serem fornecidos pelo DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:


Executado 21%. Acumulado 50%. Execução dos serviços de pavimentação, drenagem e plantio de grama.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:

Executado 40%. Acumulado 90%. Execução dos serviços de sinalização, plantio de gramas e alambrado de proteção.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado



EXECUÇÃO DE CICLOVIA NA DF-085 (EPTG)




Programas de Trabalho: 26.451.6216.3090.0008
 Nº do Processo: 113.003051/2014
 Nº do Contrato: 010/2017
 Empresa: SIGMA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
 Data de início: 17/05/2017
 Data prevista de conclusão: 12/01/2018
 Valor: R\$ 8.213.684,92
 Recurso: Fonte 335 (Banco do Brasil)
 Executor: Eli Câmara (Titular) e Antônio Gomes da Silva Filho (Suplente)


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução de ciclovia na rodovia DF-085 (EPTG) com extensão de 19.574,37m no trecho: entroncamento rodovia DF-003 (EPIA) ao entroncamento da rodovia DF-001- Pistão Nortel/Sul.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
 Executado 3%. Acumulado 5%. Execução dos serviços de terraplenagem nos ramos H, J, L, G e B.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:
 Executado 1%. Acumulado 6%. Execução dos serviços de drenagem. Obra em ritmo muito lento devido às chuvas.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ALAGADO DF-290



Programas de Trabalho: 26.782.6216.3361.4359 –
 Etapa SAG 63
 Nº do Processo: 113.005322/2016
 Nº do Contrato: 012/2017
 Empresa: MPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA
 Data de início: 14/06/2017
 Data prevista de conclusão: 120 dias
 Valor: R\$ 3.679.866,5 + R\$ 169.736,89
 (Primeiro Aditivo) = R\$ 3.849.603,39
 Recurso: 148 (CIDE)
 Executor: Eli Câmara e Maria Luzia Ferreira Borges

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: DF-290, Construção de ponte sobre o Rio Alagado e passagem de fauna. Trecho: acesso ao Gama/entroncamento Avenida Alagados (Santa Maria).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:

Executado 70% no bimestre. Acumulado 76%. Execução dos serviços de fundação, blocos e estrutura metálica.


AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:

Executado 24% no bimestre. Acumulado 100%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO

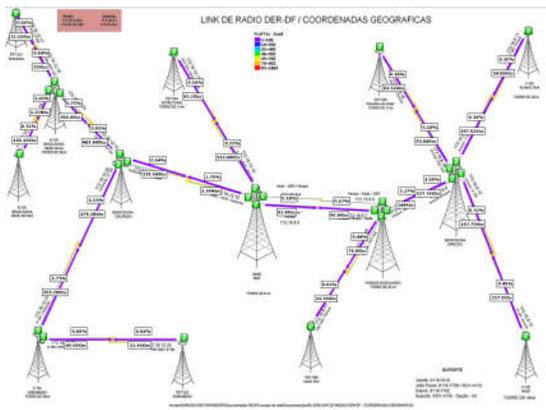

Programas de Trabalho:

26.122.2800.8517.0014 (2011)
 26.122.6010.2557.2569 (2013/2014/2015)
 26.126.6001.2557.2569 (2016)
 Etapa 7 SAG 2017
 Nº do Processo: 113.000.559/2011
 Nº do Contrato: 025/2011
 Empresa: Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda.
 Data de início: 21/11/2011
 Data prevista de conclusão: 20/11/2017
 (Oitavo Aditivo)
 Valor: R\$ 306.175,68 (Quarto Aditivo)
 Recurso: Fonte 100 e 237 (Sétimo Aditivo)
 Executor: Thiago Vinícius de Melo Almeida

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços especializados de engenharia, contemplando a manutenção de sistema de comunicação de dados com todos os equipamentos de infraestrutura e serviços necessários para interligação das Unidades que compõem o complexo administrativo do DER/DF e BPRv (Batalhão de Policiamento Rodoviário). Farão parte da prestação dos serviços a manutenção, inspeção periódica dos rádios e switches e manutenção das torres de comunicação de micro-ondas que interligam os 5 Distritos Rodoviários e os postos do BPRv com a sede do Órgão.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:



Foram realizados os seguintes serviços:

- Manutenção dos equipamentos de rádio transmissão do 5DR.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:


Foram realizados os seguintes serviços:

- Encerramento do contrato dia 20 de novembro.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO ÀS ESCOLAS RURAIS

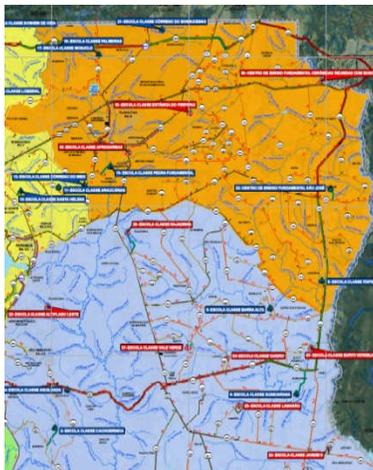

Programas de Trabalho: 26.782.6216.1968.0013
 Nº do Processo: 113.013.043/14
 Nº do Contrato: 028/2016
 Empresa: GEOSERV Serviços de Geotecnia e Construção LTDA
 Data de início: 14/12/2016
 Data prevista de conclusão: 11/01/2018 (Primeiro Aditivo)
 Valor: R\$ 3.264.008,36
 Recurso: Fonte: 335 (Primeira Apostila)
 Executor: Ery do Nascimento Brandi, José Ricardo Almeida, Dan Imbroise Brant.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para execução da pavimentação de vias de acesso às Escolas Rurais “ Caminho das Escolas” (várias Rodovias Distritais e Vicinais do SRDF) - Lote 1.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:

Entrega de relatórios parciais de estudos preliminares.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:

Fase inicial – Entrega de relatórios conclusivos dos estudos preliminares

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	1,82%	0%	3,5%	4,84%


Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	1,82%	1,82%	5,32%	16,79%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO ÀS ESCOLAS RURAIS

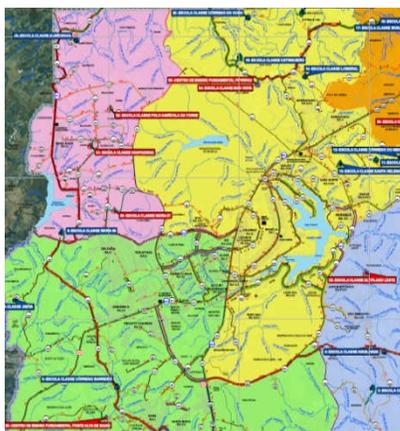


Programas de Trabalho: 26.782.6216.1968.0013
 Nº do Processo: 113.013.043/14
 Nº do Contrato: 029/2016
 Empresa: ASTEC Engenharia Ltda
 Data de início: 06/01/2017
 Data prevista de conclusão: 28/01/2018 (Primeiro Aditivo)
 Valor: R\$ 3.049.016,92
 Recurso: Fonte: 335 (Primeira Apostila)
 Executor: Ery do Nascimento Brandi, José Ricardo Almeida, Dan Imbroise Brant.


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para execução da pavimentação de vias de acesso às Escolas Rurais “ Caminho das Escolas” (várias Rodovias Distritais e Vicinais do SRDF) - Lote 2

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
Entrega de relatórios conclusivos dos estudos preliminares.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:
Fase inicial – Entrega de relatórios conclusivos dos estudos preliminares.




Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA BR-020

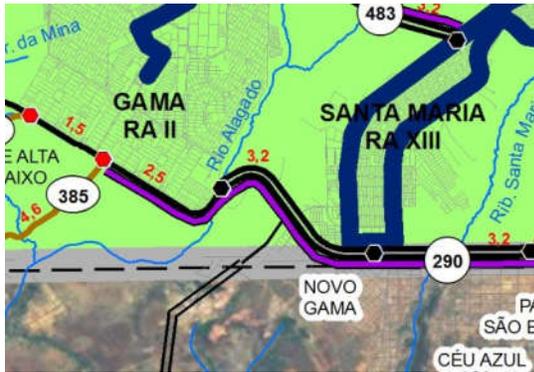


Programas de Trabalho: 26.782.6216.1347.9481
 26.782.6216.1347.0002 (EP)
 Nº do Processo: 113.008.665/2016
 Nº do Contrato: 005/2017
 Empresa: JJPP CONSTRUTORA LTDA
 Data de início: 31/03/2017
 Prazo de execução: 150 dias
 Data prevista de conclusão: 10/10/2017 (Segundo Aditivo)
 Valor: R\$ 2.275.877,00
 Recurso: Fonte: 100
 Executor: Fábio Cardoso da Silva, Kênio Avelar

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Construção da Passarela em estrutura mista, a ser implantada na Rodovia BR-020, próximo ao Setor Habitacional Nova Colina – Sobradinho/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:
 Executado 67% no bimestre. Acumulado 85%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
 Executado 15% no bimestre. Acumulado 100%.




Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO DESCOBERTO VC-533

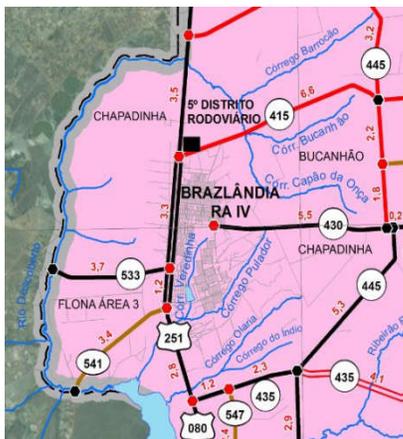


Programas de Trabalho: 26.782.6216.3361.4359
 Nº do Processo: 113.013.549/2016
 Nº do Contrato: 001/2017
 Empresa: LEO & BORBA ENGENHARIA
 Data de início: 01/03/2017
 Data prevista de conclusão: Reativado a partir de 22/11/2017 (Quarto Aditivo)
 Valor: R\$ 1.300.131,23 + 119.522,17 (Segundo Aditivo) = R\$ 1.419.653,40
 Recurso: Fonte: CIDE
 Executor: Sérgio Henrique (Titular) e Antonio Gomes (Suplente).


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: execução das obras para Construção de Ponte sobre o Rio Descoberto na VC-533 Brazlândia - Divisa DF/GO. Entroncamento BR-080/BR-251.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 58,32%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:
 Executado 41,68% no bimestre. Acumulado 100%.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

RESTAURAÇÃO DA DF-001(EPCT) "CAMINHO PARA BRAZLÂNDIA"



Programas de Trabalho: 26.782.6216.1475.1199
 Nº do Processo: 113.004.490/2017
 Nº do Contrato: 006/2017
 Empresa: HL Terraplenagem
 Data de início: 23/03/2017
 Data prevista de conclusão: 18/12/2017 (Primeiro Aditivo)
 Valor: R\$ 11.649.997,42 + R\$ 1.456.811,89 (Primeiro Aditivo) + R\$ 651.887,37 (Segundo Aditivo) = R\$ 13.758.696,68
 Recurso: CIDE
 Executor: Sérgio Henrique e Maria Luzia Ferreira (suplente)


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: execução das obras de restauração a rodovia distrital DF-001 (EPCT) - "Caminho de Brazlândia", no trecho compreendido entre o entroncamento BR-070/DF-095 (EPCL), até o entroncamento BR-080/BR-251 (B), com extensão aproximada de 9.070,00 m, sendo 540,00 m de trecho em pista dupla e 7.760,00 m em pista simples e, ainda 770,00 m de 03 (três) alças existentes: alça de ligação da DF-001 para a BR-070; alça de ligação da DF-095 para a DF-001 e alça de ligação da DF-001 para a DF-095 (operação de reversão da EPCL), incluindo acostamento em toda a extensão do trecho, em ambos os sentidos (exceto nas alças), abrangendo também os serviços de drenagem, baias de parada de ônibus e a sinalização horizontal e vertical.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:

Executado 20% no bimestre. Acumulado 75%. Execução de capa asfáltica e fresagem, parada de ônibus.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:

Executado 25% no bimestre. Acumulado 100%. Conclusão da obra.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída




Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001 – Etapa 11 SAG 2015
 26.782.6217.2541.0001 – Etapa 15 SAG 2016
 N° do Processo: 113.001.225/2008
 N° do Contrato: 028/2011
 Empresa: Engebrás S/A Indústria, Comércio e
 Tecnologia de Informática
 Data de Início: 23/12/2011
 Data prevista de conclusão: 23/12/2017 (Oitavo
 Aditivo)
 Valor: R\$ 21.979.430,01 (Quinto Aditivo) +
 R\$ 982.174,71 (Oitavo Aditivo).
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Eng.º Murilo de Melo Santos

DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO: Monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
 Andamento normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:
 Andamento normal. Contrato concluído



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP




Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo) - Etapa 12 SAG 2015
 26.782.6217.2541.0001 – Etapa 16 SAG 2016
 N° do Processo: 113.003.563/2014
 N° do Contrato: 060/2014
 Empresa: Lig Móvil Telecomunicações Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 29/09/2014
 Data prevista de conclusão: 28/09/2018
 (Sexto Aditivo)
 Valor estimado dos Serviços: R\$ 1.211.705,76
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Rafael Modé Luma e Daniel dos Santos Sampaio (substituto)
 IS, 03/03/2016


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de serviço móvel especializado (SME) do tipo sistema troncalizado digital tecnologia tetra para locação de equipamentos para Gerência de Controle Operacional da Diretoria de Fiscalização de Trânsito da Superintendência de Trânsito do DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
 Andamento normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:
 Andamento normal.
 - Pagamento de R\$ 100.975,48 em novembro de 2017;
 - Pagamento de R\$ 100.975,48 em dezembro de 2017.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF




Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001
 Etapa 11 SAG 2015/ Etapa 15 SAG 2016
 Nº do Processo: 054.001.403/2011-113.001.179/2011
 Nº do Convênio: 001/2012
 Conveniado: Polícia Militar do Distrito Federal
 Data de Início: 11/05/2012
 Vigência do Convênio: 13/05/2018 (Quinto Aditivo)
 Recurso: Fontes 237, 437, 331 (Primeira Apostila)
 Valor: R\$ 1.283.163,40
 Recurso: Fonte 237, 437 e 331
 Executor: Márcio Corrêa Soares

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
 Executado 17% no Bimestre. Acumulado 85%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:
 Executado 15% no Bimestre. Acumulado 100%. Concluída etapa de 2017.

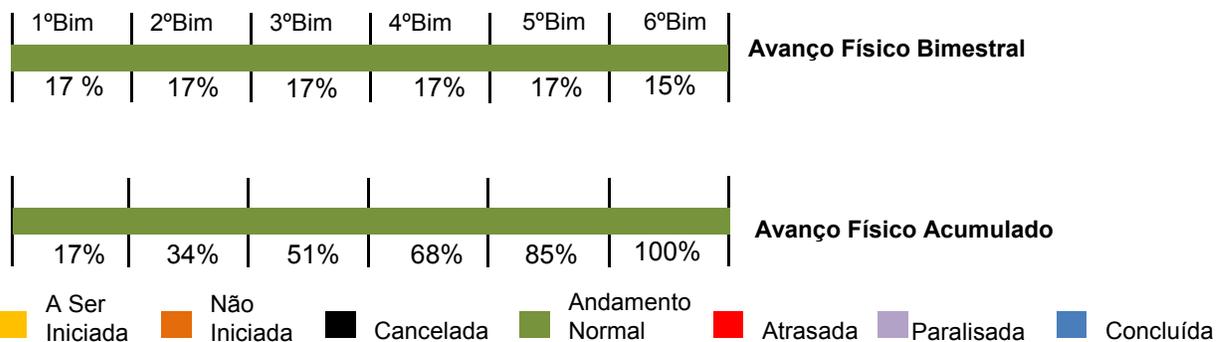

SERVIÇO INTEGRADO MÓVEL PARA GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0004 (Terceiro Aditivo)
 Etapa 12 SAG 2015
 26.782.6217.2541.0004 – Etapa 16 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.011.356/2013
 Nº do Contrato: 014/2014
 Empresa: OI Móvel S.A (Primeiro Aditivo)
 Data da Assinatura do Contrato: 28/03/2014
 Data prevista de conclusão: 10/06/2017
 (Terceiro Aditivo)
 Valor anual: R\$ 1.398.795,84 (Terceiro Aditivo)
 Recurso: Fonte 237/437
 Executor: Afonso Guilherme Dutra


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Serviço Integrado Móvel para Gestão de Trânsito e Mobilidade – SIMGTM, incluindo serviços de instalação, suporte técnico e repasse de conhecimentos para atender a necessidade do DER/DF. Equipamento do tipo celular que utiliza rede de telefonia e de internet para comunicação interna, consulta de veículo e habilitação, registro de infrações de trânsito (on line), registro de ocorrência de acidente de trânsito, emissão de ficha de missão e relatórios voltados para a fiscalização de trânsito e demais funções afins à autarquia.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:

Maio – Prestação dos serviços dentro da normalidade.
 Junho – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:

Contrato concluído.

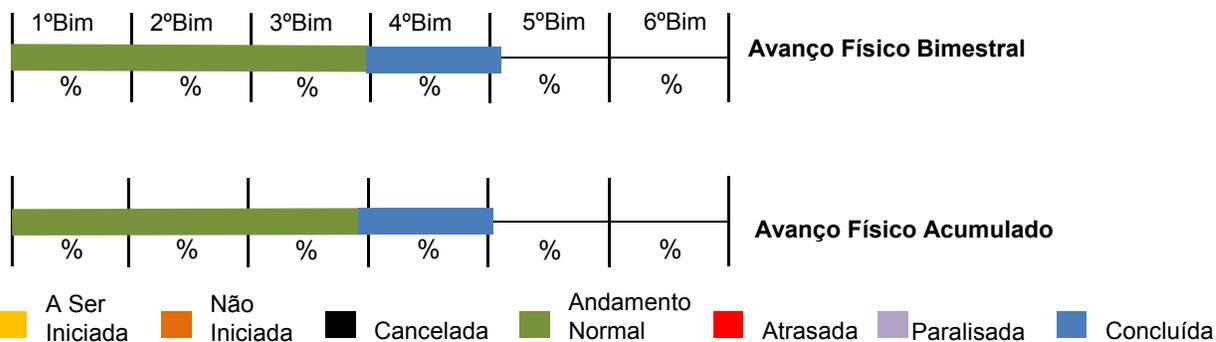

MONITORAMENTO E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001 - Etapa 11 SAG 2015
 26.782.6217.2541.0001 Etapa 15 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.001.811/2009
 Nº do Contrato: 041/2014
 Empresa: Eliseu Kopp & Cia. Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2014
 Data prevista de conclusão: 24/06/2019 (Quarto Aditivo)
 Valor estimado para novo período: R\$ 8.163.308,40 (Quarto Aditivo)
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Eng.º Darione José Maria Cavalcanti de Oliveira


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços de monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos instalados em pontos definidos no Edital da Concorrência nº 008/2010. Complementarmente, deverão ser elaborados inventários, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos, com expedição concomitante de relatório individual para emissão de autos de infração e notificação, utilizando medidores eletrônicos de velocidade fixos de operação autônoma.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:

Andamento normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:

Andamento normal.

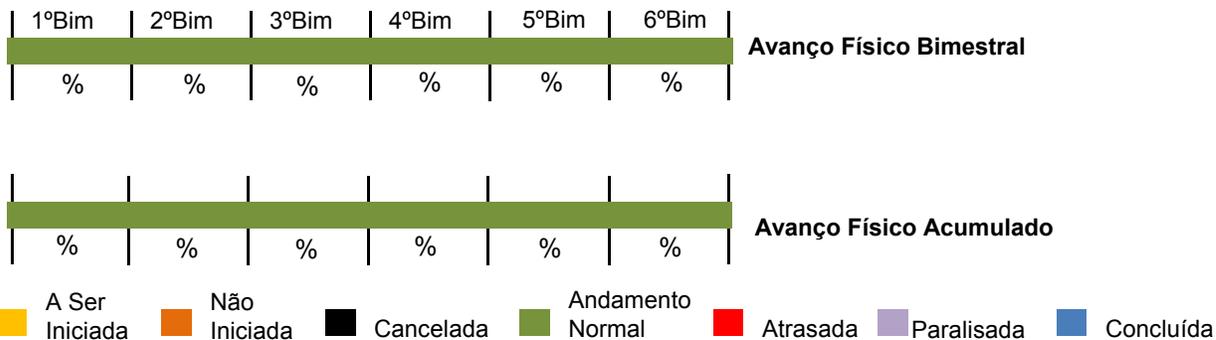

PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS



Programa de Trabalho:
26.782.6217.2541.0001
Nº do Processo: 113.017.091/2015
Nº do Convênio de Cooperação: 002/2015
Conveniado: Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF
Data da Assinatura do Convênio: 24/11/2015
Data prevista de conclusão: 14/05/2018
Recurso: Fontes 237, 437
Executor: Eng.º Juliana Soares das Neves


DESCRIÇÃO DO OBJETO: O presente Convênio de Cooperação Recíproca tem por objetivo a execução pelo DER/DF e pelo DETRAN/DF das atividades de Fiscalização de Trânsito nas rodovias integrantes do Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF e nas vias urbanas, bem como atividades de Educação de Trânsito, Engenharia de Tráfego, Estatísticas de Acidentes de Trânsito, Monitoramento Aéreo das Rodovias, Processamento Eletrônico de Multas, visando a aumentar a segurança e a melhoria das condições de trânsito no Distrito Federal, observando-se as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e demais normas pertinentes.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:


Executado 16,66% no bimestre. Acumulado 83,33%. As atividades realizadas foram:
Fiscalização de Trânsito (Remoção de Veículos): **Setembro** : Quant = 200; Valor = R\$ 100.000,00. **Outubro**: Quant. = 200; Valor =R\$ 100.000,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:

Executado 16,66% no bimestre. Acumulado 100,00%. As atividades realizadas foram:
Fiscalização de Trânsito (Remoção de Veículos): **Novembro**: Quant = 200; Valor = R\$ 100.000,00. **Dezembro**: Quant. = 200; Valor =R\$ 100.000,00. Concluída Etapa de 2017.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO



Programas de Trabalho: 26.782.6217.2541.0001
 Nº do Processo: 113.002.947/2016
 Nº do Contrato: 036/2016
 Empresa: Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
 Data de início: 28/12/2016
 Data prevista de conclusão: 28/06/2019
 Valor: R\$ 10.800.000,00
 Recurso: Fonte 237 e/ou 437
 Executor: Eng.º Cristiano Alves Cavalcante (Titular), Eng.º Viviane Coelho de Castro (Suplente) e Jesse Gouvea de Oliveira (Suplente)



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços especializados de tecnologia da informação para provimento da Solução Integrada de Gestão de Infrações de Trânsito – RADAR.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:

Fatura referente ao período de 21/08/2017 a 20/10/2017 encaminhada para pagamento .

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:

Fatura referente ao período de 21/10//2017 a 20/12/2017 encaminhada para pagamento. Concluída Etapa de 2017.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programas de Trabalho:
 26.782.6217.2904.0001
 Nº do Processo: 113.003.588/2016
 Nº do Contrato: 021/2016
 Empresa: Hot Cozinha Industrial Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 11/07/2016
 Data prevista de conclusão: 12 meses
 Valor: R\$ 153.600,00
 Recursos: Fonte 237
 Executora: Jucianne Batista Nogueira de Oliveira
 e Kein Yon Ko (suplente)
 IS de 18/07/2016



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de lanche para a Escola Vivencial de Trânsito – Transitolândia, com entregas diárias de segunda-feira à sexta-feira, a critério do DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:

No 5º Bimestre, referente aos meses de setembro e outubro, foram atendidas pela Transitolândia 4.055 crianças e 329 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 39 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo DER para viabilizar a chegada dessas crianças à Transitolândia, utilizando o contrato no valor de R\$ 17.740,70.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:

No 6º Bimestre, referente aos meses de setembro e outubro, foram atendidas pela Transitolândia 3.836 crianças e 282 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 35 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo DER para viabilizar a chegada dessas crianças à Transitolândia, utilizando o contrato no valor de R\$ 15,436,50.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2904.0001 - Etapa 14 SAG 2015
 26.782.6217.2904.0001 - 2016
 Nº do Processo: 113.012.201/2013
 Nº do Contrato: 012/2014
 Empresa: Travel Bus Ltda - Me
 Data de Início: 24/03/2014
 Data prevista de conclusão: 23/03/2018 (Terceiro Aditivo)
 Valor: R\$ 626.740,35 (Segundo Aditivo)
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Jucianne Batista Nogueira de Oliveira
 Kein Yon Ko (suplente)
 (IS de 24/11/2015)


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviço de transporte de crianças a serem atendidas pela Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia) do DER-DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:


No 5º Bimestre, referente aos meses de setembro e outubro, foram atendidas pela Transitolândia 4.055 crianças e 329 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 39 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo DER para viabilizar a chegada dessas crianças à Transitolândia, utilizando o contrato no valor de R\$ 63.612,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:

No 6º Bimestre, referente aos meses de setembro e outubro, foram atendidas pela Transitolândia 3.836 crianças e 282 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 35 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo DER para viabilizar a chegada dessas crianças à Transitolândia, utilizando o contrato no valor de R\$ 55.809,00.

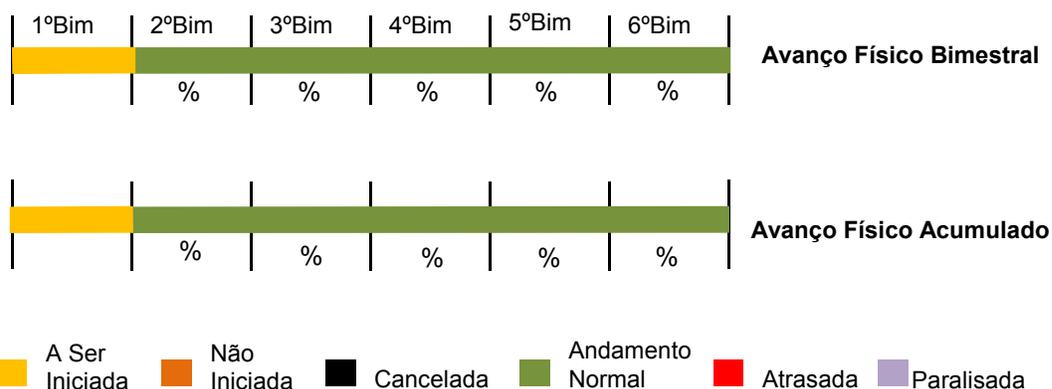

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TRECHOS DO SRDF – LOTE 1

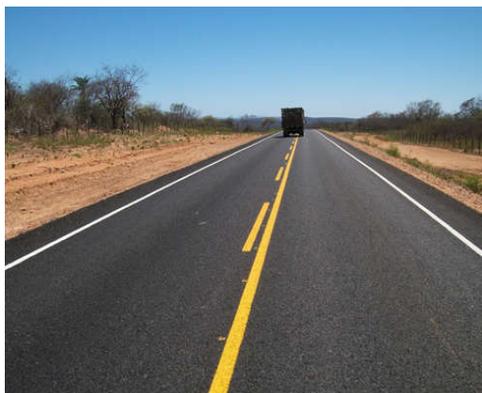


Programa de Trabalho:
 26.782.6217.4197.0001 – Etapa SAG 17 2016
 N° do Processo: 113.007.572/2013
 N° do Contrato: 001/2016
 Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 25/01/2016
 Data do Recebimento da IS: 11/02/2016
 Data prevista de conclusão: 05/02/2018
 (Quinto Aditivo)
 Valor Contratual: R\$ 3.043.293,27 + R\$ 21.291,58 (3ª Aditivo) = R\$ 3.064.584,85.
 Recurso: Fonte 237
 Executor Titular: Eng.º Guilherme José da Fonseca Berniz e Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva (suplente)
 IS, 11/02/2016


DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução da sinalização horizontal, em, vários trechos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, definido como Lote 1 – 1º Distrito Rodoviário, 4º Distrito Rodoviário e 5º Distrito Rodoviário, tudo conforme especificações nos termos do Edital de Concorrência nº 006/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
 Executado 2,9%. Acumulado 69,9%. Continuação da Sinalização Horizontal DF-130 – Trecho DF-250/BR-251. Conclusão da Sinalização Horizontal da DF-128- Trecho BR-020/Divisa.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:
 Executado 2,8%. Acumulado 72,7%. Continuação da Sinalização Horizontal DF-130 – Trecho DF-250/BR-251. Conclusão da Sinalização Horizontal da DF-463 - Trecho BR-001/DF-473.

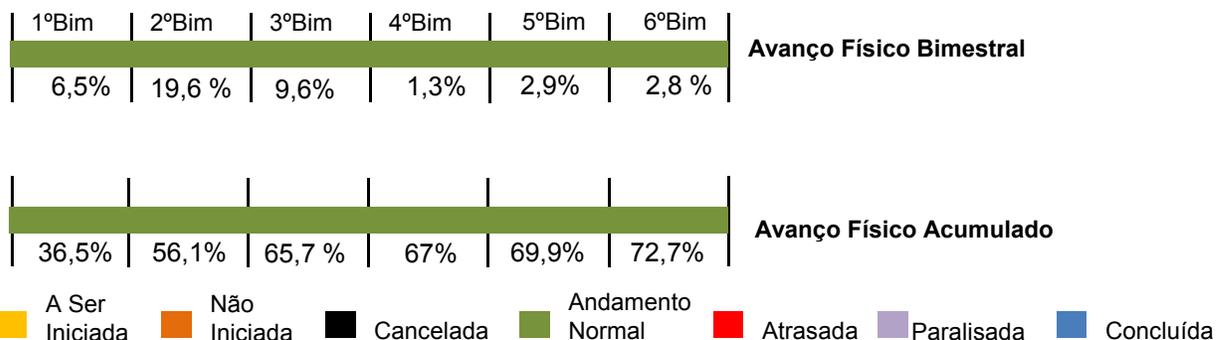

CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CICLOVIA – DF-087


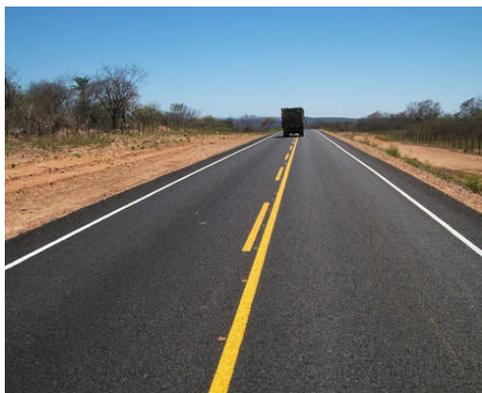


Programa de Trabalho:
 26.451.6216.3090.0008
 Nº do Processo: 113.004.511/2015
 Nº do Contrato: 038/2017
 Empresa: CF – SANTOS TERRAPLENAGEM
 EIRELI-ME.
 Data da IS: 06/11/2017
 Data prevista de conclusão: 04/05/2018
 Valor Contratual: R\$ 6.224.581,52
 Recurso: Fonte 335
 Executor Titular: Eng.º Guilherme José da
 Fonseca Berniz e Sandra Santos Martins
 (Suplente)

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução das obras para construção da ciclovia e restauração do pavimento da rodovia distrital DF-087 (EPVL).


AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:

Executado 13,28%. Acumulado 13,28%. Administração de obra, serviços preliminares, canteiro de obra, limpeza, locação de contêineres, terraplenagem da ciclovia, drenagem de rede, obras complementares, início do plantio de grama.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TRECHOS DO SRDF LOTE 2

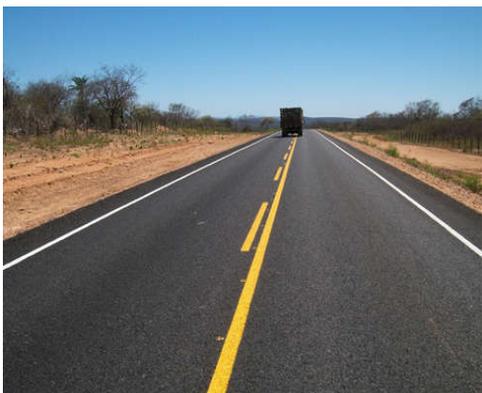

Programa de Trabalho: 26.782.6217.4197.0001
 Nº do Processo: 113.000.864/2016
 Nº do Contrato: 002/2016
 Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 25/01/2016
 Data do Recebimento da IS: 11/02/2016
 Data prevista de conclusão: 05/02/2018 (Sexto Aditivo)
 Valor: R\$ 5.688.920,63 + R\$ 1.028.292,56 (Primeiro Aditivo) + R\$109.641,73 (Quarto Aditivo)= R\$ 6.826.854,92
 Recurso: Fonte 237
 Executor Titular: Eng.º Guilherme José da Fonseca Berniz e Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva (suplente)
 IS, 11/02/2016

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução da sinalização horizontal, em, vários trechos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, definido como Lote 2 – 2º Distrito Rodoviário, 3º Distrito Rodoviário, tudo conforme especificações nos termos do Edital de Concorrência nº 006/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:

Executado 3,8% no bimestre. Acumulado 58,71%. Continuação da Sinalização da DF-003 – EPIA – Trecho DF-007 (EPTT)/DF-051. Continuação na DF-003 (EPIA) – Trecho: DF-051/BR-040. Continuação da Sinalização Horizontal na DF-050 – Trecho: DF-003/DF-205. Concluída a revitalização da sinalização horizontal na DF-440 Trecho: Km 0,00/Km 2,10. Continuação dos serviços de Sinalização Horizontal na DF-006 – Trecho: DF-005/DF-007. Conclusão dos serviços de Sinalização Horizontal na DF-459 – Trecho: RA-XII/RAIX. Concluída a revitalização da sinalização horizontal na DF-010- trecho: DF-003/DF-011.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:

Executado 6,10%. Acumulado 64,81%. Continuação da sinalização horizontal na DF-003, Trecho: DF-007/DF-051. Continuação da sinalização horizontal na DF-003, Trecho: 051/BR040. Conclusão da sinalização horizontal na DF-150, Trecho: DF-003/DF-205. Conclusão dos serviços de sinalização horizontal na DF-006, Trecho: DF-005/DF-007.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
1,5%	5,6%	7,9%	4,91%	3,8%	6,10%

Avanço Físico Bimestral

36,5%	42,1%	50%	54,91%	58,71%	64,81%
-------	-------	-----	--------	--------	--------

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO OPERADO PELO DER-DF




Programa de Trabalho:
 26.782.6217.4198.0001
 Nº do Processo: 113.003.907/2016
 Nº do Contrato: 002/2017
 Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 14/02/2017
 Data prevista de conclusão: 13/08/2019
 Valor: R\$ 4.882.728,14
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Eng.º Carlos Alberto Mundim Pena

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico operados pelo DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
 Executado 19% no bimestre. Acumulado 81%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:
 Executado 19% no bimestre. Acumulado 100%. Concluída etapa de 2017.

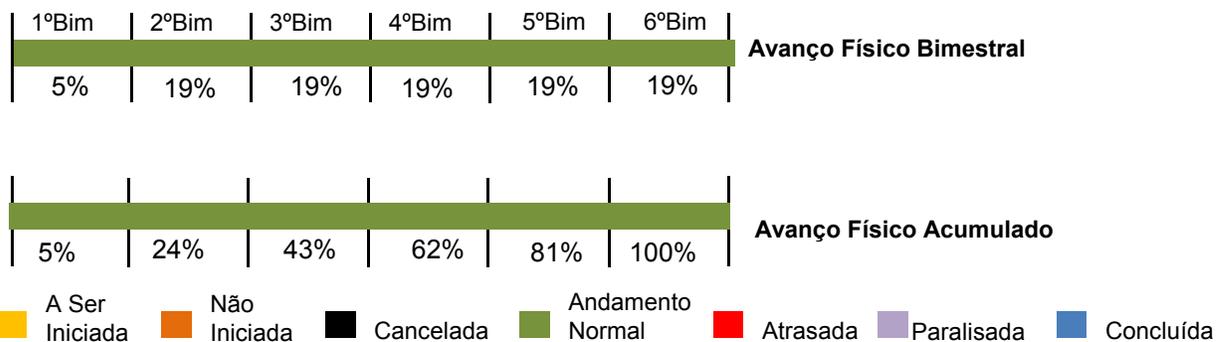

FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE PAINÉIS DE MENSAGENS MÓVEIS



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.3209.0001 (Segundo Aditivo)
 Etapa 12 SAG 2015
 26.782.6217.3209.0001 – Etapa 41 SAG 2016
 N° do Processo: 113.009.643/2013
 N° do Contrato: 066/2014
 Empresa: Talentech-Tecnologia Ltda.
 Data de Início: 15/12/2014
 Data prevista de conclusão: 15/12/2018
 (Quarto Aditivo)
 Valor Anual: R\$ 3.676.269,60 (Quarto Aditivo)
 Recurso: Fonte 237 (Terceiro Aditivo)
 Executora: Afonso Guilherme Dutra

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento, implantação, manutenção e suporte técnico de painéis de mensagens variáveis e sistema de informação e orientação aos usuários, em tempo real e repasse de conhecimento para atender às necessidades do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:


Em setembro operaram 30 painéis com gasto de R\$ 306.355,80.

Em outubro operaram 30 painéis com gasto de R\$ 306.355,80.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:

Em novembro operaram 30 painéis com gasto de R\$ 306.355,80.

Em dezembro operaram 30 painéis com gasto de R\$ 306.355,80.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL




Programa de Trabalho:
 26.782.6217.3209.0001 - Etapa 41 SAG 2016
 N° do Processo: 113.002.964/2014
 N° do Contrato: 011/2016
 Empresa: SINASC – Sinalização e Construção de Rodovias Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 29/04/2016
 Data do recebimento da IS: 11/05/2016
 Data prevista de conclusão: 09/03/2017 (Segundo Aditivo)
 Valor: R\$ 2.457.298,59
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Eng.º Guilherme José da Fonseca Berniz
 Substituto: Eng.ª Tainá de Aguiar Botelho

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução da instalação de sinalização vertical do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Cc nº 001/2015.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 99%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
 Executado 1% no bimestre. Acumulado 100%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Contrato finalizado.

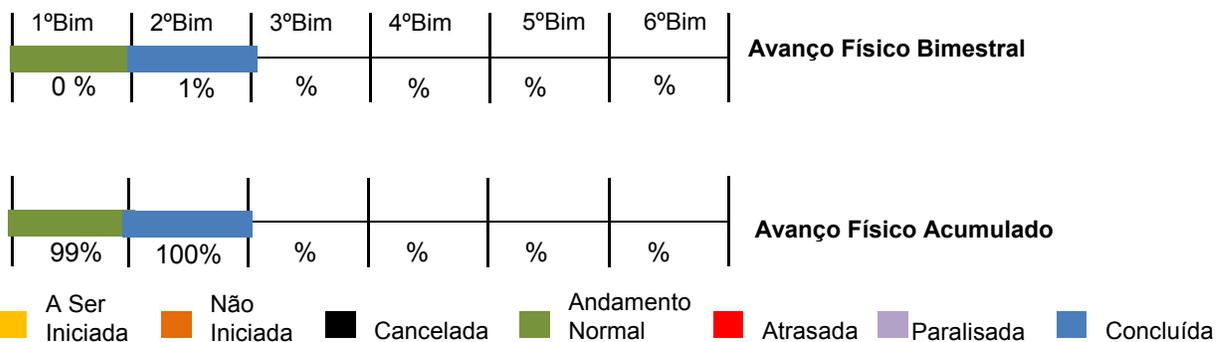

PAVIMENTAÇÃO VC-533, LIGAÇÃO DE BRAZLÂNDIA A PADRE LÚCIO





Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1475.1199
 Etapa 16 SAG 2017/Etapa 28 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.005.439/2012
 Nº do Contrato: 039/2013
 Empresa: NG Engenharia e Construções Ltda.
 Data da assinatura do contrato: 22/11/2013
 Data do recebimento da IS: 26/09/2014
 Data prevista de conclusão: 15/05/2018
 Valor: R\$ 5.405.070,40 +
 R\$ 1.299.126,98 (Quarto Aditivo) +
 R\$ 561.300,44 (Nono Aditivo) + R\$ 723.900,89 (12º
 Aditivo) = R\$ 7.989.398,71
 Recurso: Fonte 100, 135 (Terceiro Aditivo), 335
 (Oitavo Aditivo)
 Executor: Engº Antônio Gomes da Silva Filho
 População da RA IV: 50.490

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de obras para pavimentação de toda a extensão da rodovia vicinal VC-533, além de implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre o seu entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF/180 e a divisa com estado do Goiás (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio). Extensão de 3,852 km. Cc nº 005/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
 Foi realizado o encabeçamento da ponte da VC-533.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:
 Executado 7º no bimestre. Acumulado 92%. Foram realizados serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e fornecimento de material betuminoso.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

DUPLICAÇÃO DA DF-463




Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1475.1199
 Etapa 15 SAG 2017/Etapa 26 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.005.051/2010
 Nº do Contrato: 043/2014
 Empresa: Serterra Transportes Escavações
 Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
 Data do Início: 10/07/2014
 Data prevista de conclusão: 10/03/2017 (19º Aditivo)
 Valor: R\$ 6.552.350,76 (6º Aditivo)+
 R\$ 666.984,73 (11º Aditivo) +
 R\$ 7.724,13 (12º Aditivo) + 939.084,88 (15º Aditivo)
 + 1.600.000,00 (17º Aditivo) + 507.150,44 (18º
 Aditivo) =R\$ 10.273.294,94
 Recurso: Fonte 100, 135 (Quinto Aditivo), 335
 (Décimo Aditivo)
 Executor: Engº Guilherme José da Fonseca Berniz
 População das RA's XXVII e XIV: 123.455


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução das obras de duplicação da rodovia DF-463, adequação da rodovia e acessos aos Setores Habitacionais Mangueiral e Jardim Botânico. Extensão de 3,9 km. Cc nº 001/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
 Executado 0,8% no bimestre. Acumulado 99,8%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Executado 0,2% no bimestre. Acumulado 100%. Obra concluída.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída


RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-001 (EPCT), TRECHO KM 119,3 AO KM 131,8 – LAGO OESTE 1ª ETAPA



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1475.1199
 Etapa 29 SAG 2017/Etapa 35 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.011.751/2014
 Nº do Contrato: 003/2016
 Empresa: EPC Projetos e Construções Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 16/02/2016
 Data prevista de conclusão: 28/01/2017
 (Terceiro Aditivo)
 Valor inicial: R\$ 6.753.902,84 + R\$ 2.624.908,10
 (quarto Termo Aditivo) = R\$ 9.378.810,94
 Recurso: Fontes 148 e 348 (Primeiro Aditivo)
 Executor: Eng.º Paulo Robert Santos Machado

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução das obras de restauração da rodovia DF-001 (EPCT), entroncamento da DF-170 ao entroncamento BR-010/020/030/450/DF-001/003/150-Parque Rodoviário do DER/DF, trecho compreendido do km 119,3 ao km 131,8 (Lago Oeste – 1ª Etapa), incluídos os serviços de sinalização vertical e horizontal, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 11/2014. Extensão de 12,52 km.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Foram entregues os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo.

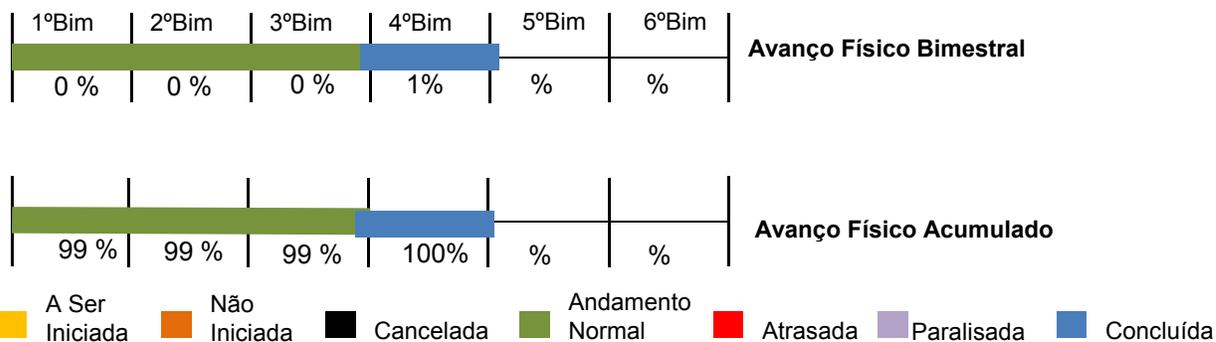

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-001 (EPCT), ENTRONCAMENTO DA DF-170 AO ENTRONCAMENTO DA BR-010/020/030/DF-003/DF-150- LAGO OESTE - 2ª ETAPA




Programas de Trabalho: 26.782.6216.1475.1199
 Nº do Processo: 113.011.217/2016
 Nº do Contrato: 003/2017
 Empresa: LK Construções e Terraplanagem-EIREILI - ME
 Data de início: 24/02/2017
 Data prevista de conclusão: 04/01/2018 (Segundo Aditivo)
 Valor: R\$ 9.604.026,18 + R\$ 608.349,94 (Terceiro Aditivo) = R\$ 10.212.376,12
 Recurso: 248
 Executor: Kênio Márcio Avelar (Titular) e Eugênio Maracajá de Moraes (Suplente)


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Restauração da DF-001 (EPCT) - Lago Oeste, entroncamento da DF-170 ao entroncamento da BR-010/020/030/DF-003/DF-150 (Parque Rodoviário do DER/DF) - 2ª Etapa. Extensão de 8,8 km. Cc nº 005/2016.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:
 Executado 38% no bimestre. Acumulado 70%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
 Executado 30% no bimestre. Acumulado 100%.

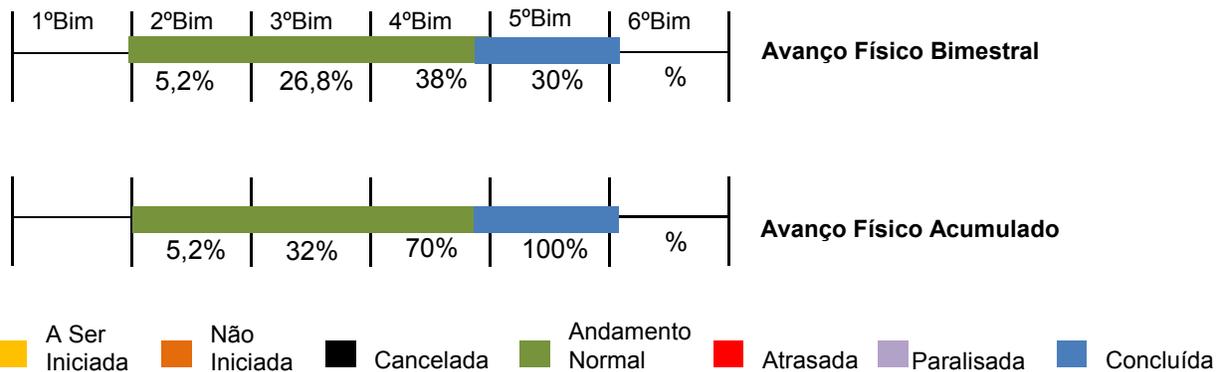

CONSULTORIA EM ENGENHARIA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL.

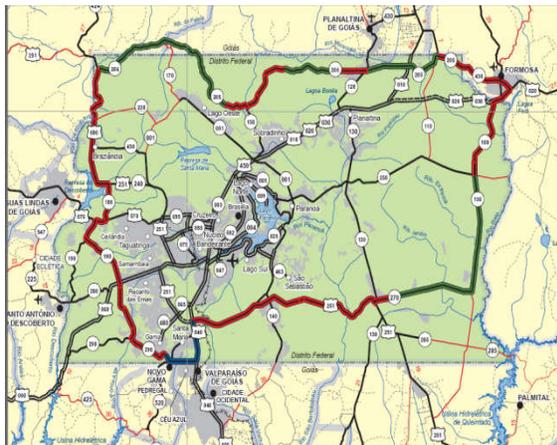

Programa de Trabalho: 26.782.6216.1968.0013
 Etapa 34 SAG 2017/Etapa 34 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.000.942/2014
 Nº do Contrato: 006/2015
 Empresa: Strata Engenharia EIRELI (Segundo Aditivo)
 Data da Assinatura do Contrato: 15/06/2015
 Data do Recebimento da IS: 29/06/2015
 Data prevista de conclusão: 04/04/2018 (Sexto Aditivo)
 Valor inicial: R\$ 7.151.845,29
 Recurso: Fonte 135, 335 (Apostila)
 Executores: Geol. Wellington Rodrigues dos Santos,
 Eng.º Stênio Fonseca da Costa e Eng.º Willkerson
 Victor da Silva (Instrução de Serviço nº 136,
 22/07/2015)
 População das RA's VI, VII, XIV, XIII, II, XV, XII, IX,
 IV, V e XXVI: 1.620.965

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa de consultoria em engenharia para análise e adequações nos produtos oriundos do contrato 040/2008 e a elaboração dos projetos básico e executivo para implantação do Anel Viário do Distrito Federal conforme Edital de Concorrência nº 002/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIMESTRE 2017:



Executado 0% no bimestre. Acumulado 42,91%.

- A Comissão elaborou o Parecer Técnico nº 15/2017, de 30/10/2017, que opina de forma favorável a aprovação com ressalvas do Relatório do Projeto Básico da Rodovia DF-100.
- A Comissão elaborou o Parecer Técnico nº 16/2017, de 30/10/2017, que opina de forma favorável a aprovação com ressalvas do Relatório do Projeto Básico da Rodovia DF-270.
- A Comissão elaborou o Parecer Técnico nº 17/2017, de 31/10/2017, que opina de forma favorável a aprovação integral do Relatório do Projeto Básico da Rodovia DF-180A (Segmento 1).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIMESTRE 2017:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 42,91%.

- A Comissão elaborou o Parecer Técnico nº 18/2017, de 06/11/2017, que opina de forma favorável a aprovação com ressalvas do Relatório do Projeto Básico da Rodovia DF-180 (Segmento 2).
- A Comissão elaborou o Parecer Técnico nº 19/2017, de 08/11/2017, que opina de forma favorável a aprovação com ressalvas do Relatório do Projeto Básico da Rodovia DF-290.
- A Comissão elaborou o Parecer Técnico nº 20/2017, de 08/11/2017, que opina de forma favorável a aprovação integral do Relatório do Projeto Básico da Rodovia DF-130.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA PAVIMENTAÇÃO DA DF-285, TRECHO KM 16,3 e KM 27,2



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.3711.6161
 Etapa 37 SAG 2017/Etapa 10 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.012.231/2015
 Nº do Contrato: 004/2016
 Empresa: EXTREMA CONSTRUÇÃO LTDA.
 Data da Assinatura do Contrato: 08/03/2016
 Data do recebimento da IS: 09/03/2016
 Data prevista de conclusão: 07/07/2017 (Terceiro Aditivo)
 Valor: R\$ 131.554,59
 Recurso: Fonte 100
 Executores: Geo. Luciano dos Santos, Geol. Maria Dulcineia Xavier Nunes e Eng.^a Patrícia Marc C. M. Milhomem


DESCRIÇÃO DO OBJETO: Elaboração do Plano de Controle Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD para o obra de pavimentação da DF-285, Trecho: Km 16,3- km 27,2 (Divisa de MG).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:

Não houve avanço físico no bimestre, pois se aguarda análise do IBRAM para o Estudo encaminhado em 26/07/2016. Reiterado o pedido de análise, por meio dos Ofício Nº 112/2017 – DG (Sisdoc Nº 2248/17) e 894/2017 – DG (Sisdoc Nº 15646/17).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:

Não houve avanço físico no bimestre, pois se aguarda análise do IBRAM para o Estudo encaminhado em 26/07/2016. Reiterado o pedido de análise, por meio dos Ofício Nº 112/2017 – DG (Sisdoc Nº 2248/17) e 894/2017 – DG (Sisdoc Nº 15646/17).

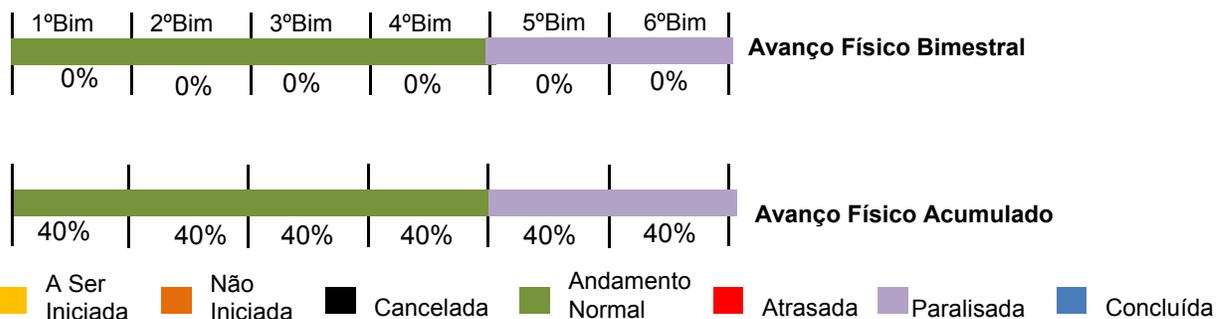

ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA PAVIMENTAÇÃO DA DF-001 (DF-430/DF-170)




Programa de Trabalho:
 26.782.6216.3711.6161
 Etapa 38 SAG 2017/Etapa 46 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.018.219/2014
 Nº do Contrato: 007/2016
 Empresa: ECOTECH Tecnologia Ambiental e Consultoria Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 11/03/2016
 Data do recebimento da IS: 04/04/2016
 Data prevista de conclusão: : Reativado a partir de 17/11/2017 (Quinto Aditivo)
 Valor: R\$ 68.695,68
 Recurso: Fonte 100
 Comissão Executora: Geo. Geol. Wellington Rodrigues dos Santos, Geol. Maria Dulcineia Xavier Nunes e Eng.^a Patrícia Marc C. M. Milhomem (IS nº 137, 27/06/2016- DODF nº 122, 28/06/2016)

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Elaboração do Plano de Controle de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD para o obra de pavimentação da DF-001, incluindo a construção de ponte de concreto sobre o Rio da Palma, trecho: DF-430 entr. DF-415/ entr. DF-415 entr./ DF-220 entr. DF-220- entr. DF-170. Convite nº 001/2015.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:
 Executado 0% no Bimestre. Serviço sem possibilidade de avanço (aguardando Elaboração de Projeto).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
 Projeto do empreendimento, entregue pela DIREP em 18/10/2017 e, disponibilizado à Empresa ECOTECH. Solicitada, em 19/10/2017, a emissão de empenho no valor de R\$ 54.956,54 (cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais, cinquenta e quatro centavos) e após, o reativamento e adição de 150 dias ao prazo contratual.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM.2017:
 Executados 40% dos serviços no bimestre.

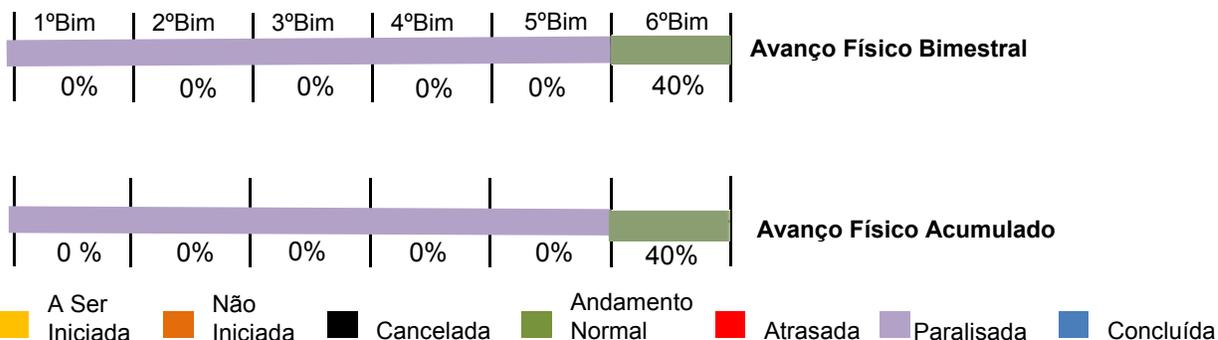

GERENCIAMENTO AMBIENTAL E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DO CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO EIXO SUL



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1226.0001
 Etapa 8 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.005.547/2013
 Nº do Contrato: 009/2016
 Empresa: STE Serviços Técnicos de Engenharia S/A
 Data da Assinatura do Contrato: 07/04/2016
 Data de Recebimento da IS: 15/04/2016
 Data prevista de conclusão: 05/04/2018
 (Segundo Aditivo)
 Valor: R\$ 3.658.938,70 – R\$ 1.280.628,55
 (Primeiro Aditivo)= R\$ 2.378.310,15 + R\$ 257.803,47 (Segundo Aditivo) = R\$2.636.113,62
 Recurso: Fonte 335
 Comissão Executora: Eng.^a Patrícia Marc C. M. Milhomem; Geol. Maria Dulcinéia Xavier Nunes e Eng.^o Paulo Roberto da Silva (IS, 12/04/2016)


DESCRIÇÃO DO OBJETO: Gerenciamento Ambiental dos Programas Ambientais do Corredor de Transporte Público Coletivo Eixo Sul, ligação das cidades do Gama e Santa Maria ao Plano Piloto, na DF-480/DF-065/DF-040/DF-003/DF-025/DF-047 e acesso ao Terminal Asa Sul. Tudo conforme os anexos do Edital da Concorrência Nº 009/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:

Executado 6,2 % do Serviço no 5º Bimestre de 2017, totalizando 45,1% de serviços já executados do contrato.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:

Executado 12,5 % do Serviço no 6º Bimestre de 2017, totalizando 57,6% de serviços já executados do contrato.

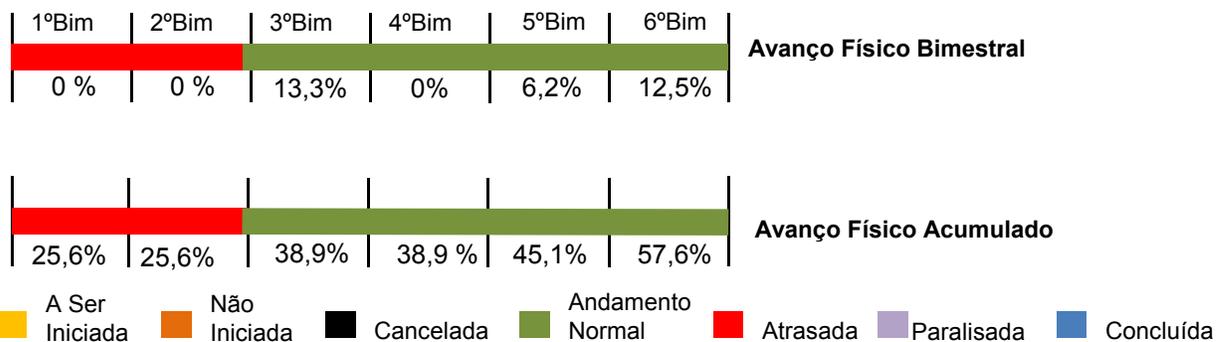

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E ENCARREGADO




Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001
 Etapa 17 SAG 2015/Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.000.098/2013
 Nº do Contrato: 045/2014
 Empresa: Interativa Dedetização, Higienização e Conservação Ltda.
 Data de Início: 22/07/2014
 Data prevista de conclusão: 21/01/2018 (Sétimo Aditivo)
 Valor estimado: R\$ 2.612.403,66 (Quinto Aditivo)
 Recurso: Fonte 100, 237, 437 (Terceiro Aditivo), 220 e 420 (Primeira Apostila)
 Executor: Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva
 Executor Substituto: Eng.º Bruno Sousa Almeida (IS nº 164, 15/07/2016)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação dos serviços especializados de conservação, limpeza e manutenção simples das rodovias do Distrito Federal, nos Distritos Rodoviários, unidades Administrativas e nas Regiões de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, sob a supervisão do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:
 Prestação dos serviços em andamento normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
 Prestação dos serviços em andamento normal.

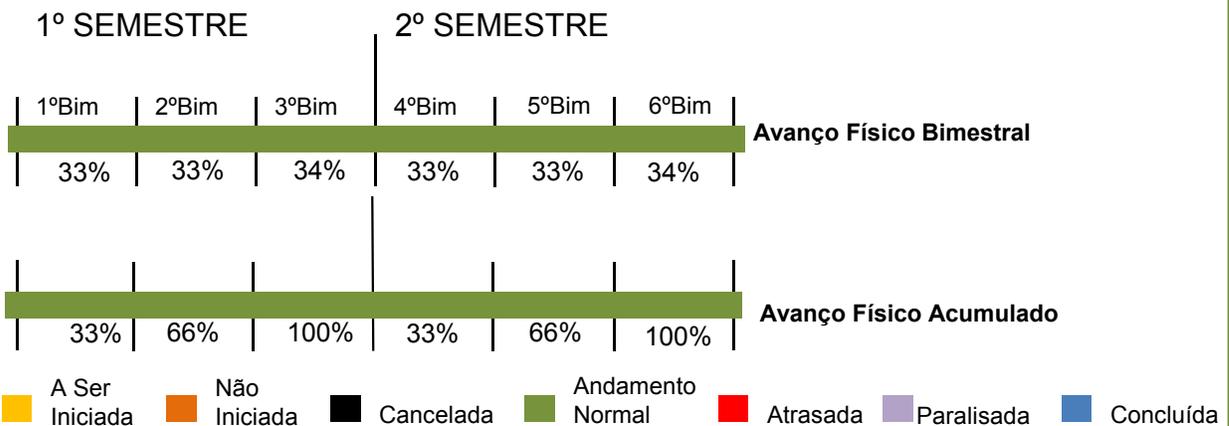

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA





Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001
 Etapa 17 SAG 2015/Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.004.578/2015
 Nº do Contrato: 009/2015
 Empresa: Centro Oeste Asfaltos Ltda.
 Data de início: 16/07/2015
 Data prevista de conclusão: 16/07/2018
 (Quarto Aditivo)
 Valor Inicial: R\$ 333.699,00 (R\$ 142.700,00 +
 R\$ 190.999,00 - Terceiro Aditivo)
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Eng.º Luiz Geraldo Rangel Vilela

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento parcelado de 100 toneladas de Emulsão Asfáltica Catiônica de Ruptura Rápida, tipo RR-2C.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-2c – 6,42% em volume. (13,220 ton).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-2c – 0% em volume.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE




Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001 - Etapa 12 SAG 2016
Nº do Processo: 113.006.861/2015
Nº do Contrato: 022/2016
Empresa: HL Terraplenagem Ltda - EPP
Data da Assinatura do Contrato: 29/07/2016
Data prevista de conclusão: 31/07/2018 (Primeiro Aditivo)
Valor Inicial: R\$ 2.240.000,00
Recurso: Fonte 100
Executor: Eng.º Mozer Teixeira de Castro e Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva (suplente).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de 10.000 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ para atender às demandas emergências de tapa-buracos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:
 Houve o fornecimento normal de massa asfáltica por parte da contratada.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
 Houve o fornecimento normal de massa asfáltica por parte da contratada.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:
 Houve o fornecimento normal de massa asfáltica por parte da contratada.

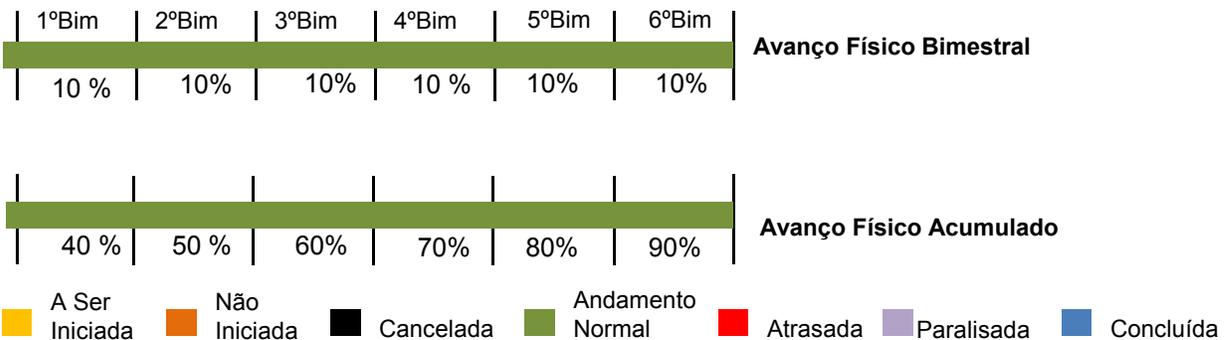

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001 - Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.007.779/2016
 Nº do Contrato: 023/2016
 Empresa: Centro Oeste Asfalto Ltda.
 Data de início: 05/09/2016
 Data prevista de conclusão: 04/09/2018
 (Primeiro Aditivo)
 Valor Inicial: R\$ 215.950,00
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Eng.º Luiz Geraldo Rangel Vilela


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento parcelado de 100 toneladas de Emulsão Asfáltica para imprimação (EAI) e impermeabilização de trechos a se recuperar e/ou pavimentar, de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal –SRDF, a ser utilizado pelo DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:

Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação (EAI). 0% (em volume).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:

Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação (EAI). 0% (em volume).

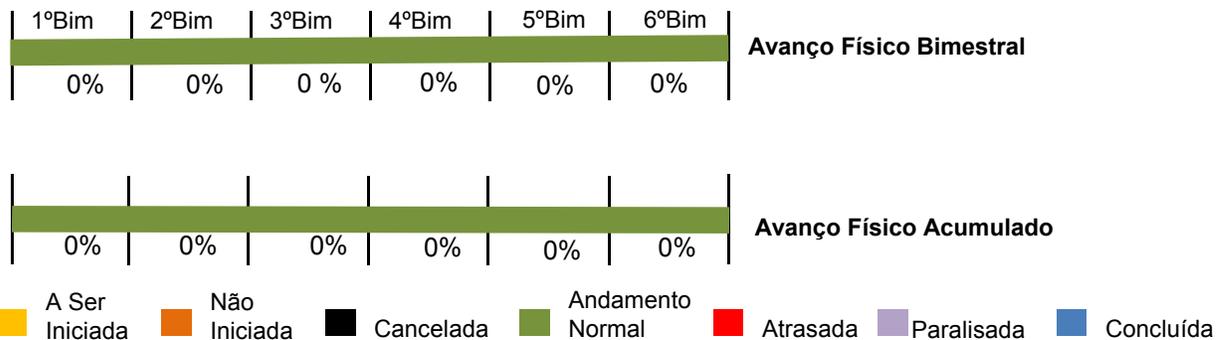

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001 - Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.010.837/2016
 Nº do Contrato: 025/2016
 Empresa: Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda.
 Data de início: 30/09/2017
 Data prevista de conclusão: 29/09/2018
 (Primeiro Aditivo)
 Valor Inicial: R\$ 297.438,40
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº. Luiz Geraldo Rangel Vilela

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento parcelado de 160 toneladas de Emulsão Asfáltica tipo ruptura média RM -1C.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RM- 1C – 0% em volume.


AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RM- 1C – 0% em volume.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RM – 1C – 0% (em volume).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RM – 1C – 0% (em volume).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RM – 1C – 0% (em volume).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RM – 1C – 0% (em volume).



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

REMOÇÃO DE ENGENHOS PUBLICITÁRIOS E OCUPAÇÕES IRREGULARES DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS DO DF E DA RIDE



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001
 Etapa 17 SAG 2015/Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.005.021/2013
 Nº do Contrato: 012/2015
 Empresa: GB da Silva – Esquadrias & Equipamentos de Sinalização-EPP
 Data da Assinatura do Contrato: 03/08/2015
 Data prevista de conclusão: 28/07/2018
 (Terceiro Aditivo)
 Valor inicial: R\$ 1.176.902,40
 Recurso: Fonte 100, 220 ou 420 (Primeiro Aditivo)
 Executor: Hans Fernandes de Lemos

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços do tipo remoção de engenhos publicitários e ocupações irregulares das faixas de domínio das rodovias do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno-RIDE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Edital de Pregão nº 042/2015.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2017:


Nesse bimestre foram apreendidos/recolhidos 18 outdoors, 11.486 faixas, 456 banners, 02 mobiliários urbanos, 519 placas, 350 metros lineares de cerca/muro, interdição de 02 acessos, 20 quiosques e similares, 449 barracas, 509 produtos comercializados irregularmente em veículos estacionados às margens da rodovia, 283 produtos comercializados à margem da rodovia e 10 trailer/reboques.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:

Nesse bimestre foram apreendidos/recolhidos 18 outdoors, 05 front-light, 01 back-light, 12.791 faixas, 360 banners, 02 mobiliários urbanos, 637 placas, interdição de 03 acessos, 453 barracas, 525 produtos comercializados irregularmente em veículos estacionados às margens da rodovia, 355 produtos comercializados à margem da rodovia e 1 trailer/reboques.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:

Nesse bimestre foram apreendidos/recolhidos 06 outdoors, 01 front-light, 7.341 faixas, 173 banners, 317 placas, interdição de 01 acesso, 08 quiosques e similares, 239 barracas, 261 produtos comercializados irregularmente em veículos estacionados às margens da rodovia, 177 produtos comercializados à margem da rodovia e 02 trailer/reboques.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA GETEC/SUTEC





Programa de Trabalho:
 26.451.6010.3903.9710 – Etapa 36 SAG 2015
 26.451.6001.3903.9710 – Etapa 23 SAG 2016
 26.451.6001.3903.9710 – Etapa 10 SAG 2017
 Nº do Processo: 113.008.694/2010
 Nº do Contrato: 014/2015
 Empresa: MULTICON Engenharia Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 24/08/2015
 Data do recebimento da IS: 08/09/2015
 Data prevista de conclusão: 27/02/2018
 (Oitavo Aditivo)
 Valor: R\$ 621.938,62 + R\$ 136.515,53 = R\$ 758.454,15 + R\$ 161.023,64 (Terceiro Aditivo) + 124,866,41 (Sexto Aditivo) = R\$ 1.044.344,20
 Recurso: Fontes 100 , 420 e 220
 Executor: Eng.º Elcy Ozório dos Santos
 Substituto: Arq. Fabrício Ferreira Faiad

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução das obras de restauração de reforma do Edifício Sede da GETEC, localizado no Parque Rodoviário do DER-DF, Rodovia DF-001, km 0, Sobradinho-DF. TP nº 006/2011.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 70,41%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:
 Executado 6,54% no bimestre. Acumulado 81,95 %.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída



CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA GECOP/SUTRAN



Programa de Trabalho:
 26.451.6001.1984.9792 – Etapa SAG 62
Nº do Processo: 113.025.698/2017
Nº do Contrato: 029/2017
Empresa: TASK Engenharia e Infraestrutura Ltda.
Data da Assinatura do Contrato: 19/07/2017
Data do Recebimento da IS: 14/08/2017
Data prevista de conclusão: 12/03/2018
Valor: R\$ 762.399,60
Recurso: Fonte 237
Executor: Darione de Oliveira

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução das obras de continuação da construção do Edifício Sede da Gerência de Controle Operacional – GECOP da Superintendência de Trânsito.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:
 Executado acumulado 20%. Os serviços realizados foram: reboco interno e externo dos blocos B e C, instalação hidráulica e parte da instalação elétrica e cobertura do telhado dos blocos b e c.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 01



Programa de Trabalho:
 26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 26 SAG 2015/Etapa 24 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.007.877/2012
 Nº do Contrato: 018/2014
 Empresa: Trier Engenharia Ltda.
 Data de Início: 13/05/2014
 Data prevista de conclusão: Reativado a partir de 25/04/2016 (14º Aditivo)
 Valor: R\$ 32.679.197,28 + R\$ 655.000,00 (4º Aditivo)+ R\$ 6.568.563,91 (14º Aditivo) = R\$ 39.902.761,19
 Recurso: Fontes 135, 100 (2º Aditivo), 231 (3º Aditivo), 900, 100 e 335 (14º Aditivo)
 Executores: Eng.º Bruno Sousa Almeida, Eng.º Geraldo Jacinto da Silva Filho e Eng.º Elcy Ozório dos Santos (Instrução nº 115, 20/05/2016, DODF nº 99, 25/05/2016)
 População da RA V: 63.050

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 0,0 ao km 2,5, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
 Executado 11,16% no bimestre. Acumulado 25,53%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:
 Executado 5,1 % no bimestre. Acumulado 30,63%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
1%	1,34%	2%	4,9%	11,16%	5,1%

Avanço Físico Bimestral

6,94%	8,28 %	10,28%	14,37%	25,53%	30,63%
-------	--------	--------	--------	--------	--------

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 02



Programa de Trabalho: 26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 13 SAG 2017/Etapa 25 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.004.262/2014
 Nº do Contrato: 021/2014
 Empresa: Consórcio JM/Cidade
 Data de Início: 14/05/2014
 Data prevista de conclusão: Reativado a partir de 25/04/2016 (13º Aditivo)
 Valor: : R\$ 39.829.963,10 + R\$ 7.815.270,04 (13º Aditivo) + 5.739.511,71 (15º Aditivo) - R\$ 2.373.212,63 (16º Aditivo) =R\$ 51.011.532,22
 Recurso: Fontes 135, 100 (2º Aditivo), 231 (4º Aditivo), 900, 131 e 335 (13º Aditivo), 231 (1ª Apostila)
 Executores: Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva, Eng.º Geraldo Jacinto da Silva Filho e Eng.º Elcy Ozório dos Santos (Instrução nº 116, 20/05/2016, DODF nº 99, 25/05/2016)
 Executor Substituto: Eng.º Bruno Sousa Almeida (IS nº 164, 15/07/2016)
 População da RA V: 63.050


DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 2,5 ao km 5,2, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:

Executado 3,5% no bimestre. Acumulado 33,5%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:

Executado 1,1 % no bimestre. Acumulado 34,6%.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE, REMODELAÇÃO DA PONTE DO BRAGHETTO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DF-002 (ERN) E DF-007 (EPTT)



Programa de Trabalho:

26.782.6216.3056.0004 (10º Aditivo)

26.782.6216.1475.1199 (1º Aditivo)

Etapa 35 SAG 2017/Etapa 45 SAG 2016

Nº do Processo: 113.007.878/2012

Nº do Contrato: 025/2014

Empresa: Consórcio Via Engenharia/Conterc –
Construção, Terraplenagem e Consultoria Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 26/05/2014

Data prevista de conclusão: Reativado a partir de
09/05/2016 (10º Aditivo)

Valor inicial: R\$ 79.632.741,77+R\$ 14.837.279,45 (10º
Aditivo)+ R\$ 2.101.997,67 (11º Aditivo) = R\$
96.572.018,08

Recurso: Fontes 135, 231 (1º Aditivo), 900, 100 e 335
(10º Aditivo)

Executores: Eng.º Geraldo Jacinto da Silva Filho ,
Eng.º Paulo Robert Santos Machado e Eng.ª Patrícia
Marc Cristiane de Menezes Milhomem (Instrução nº
117, 20/05/2016, DODF nº 99, 25/05/2016)
(Instrução nº 181, 16/08/2016, DODF nº 155,
17/08/2016)

População das RA's XVIII e I: 250.607


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução de obras para Implantação do Trevo de Triagem Norte (TTN), remodelação da Ponte do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego em 2,1 km da rodovia DF-007 (EPTT), no trecho compreendido entre a DF-002 e o entroncamento com a DF-003/BR-450 (Balão do Torto), e em 0,4 km da rodovia DF-002 (ERN), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-007 (ponte do Braghetto) até o acesso às vias W1/W3, execução de estrutura cicloviária, bem como a elaboração dos projetos executivos decorrentes das obras de artes especiais a serem implantadas e remodeladas. Cc nº 002/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:


Executado 6% no bimestre. Acumulado 25%. Concluídos as OAE's (Viadutos) 12, 02 e 01.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2017:

Executado 5% no bimestre. Acumulado 30%. Concluído Ramo 7W e 50% da OAE 9C.

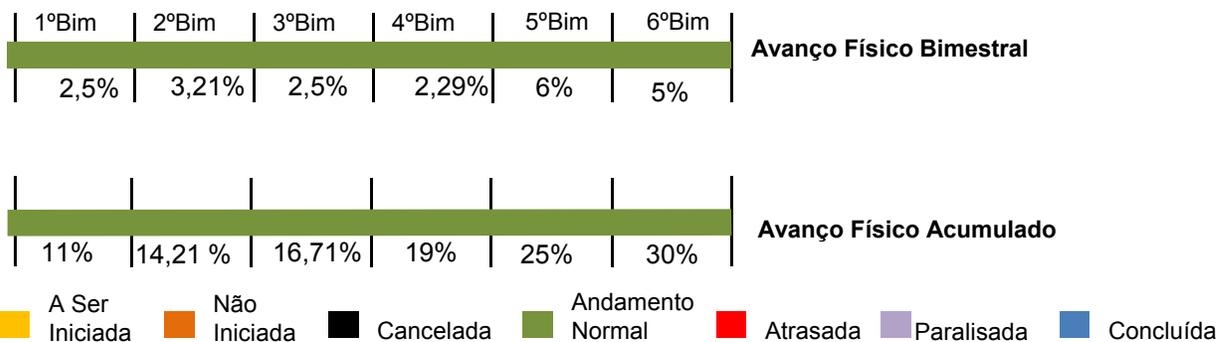

SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE, REMODELAÇÃO DA PONTE DO BRAGHETTO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DF-002 (ERN) E DF-007 (EPTT)

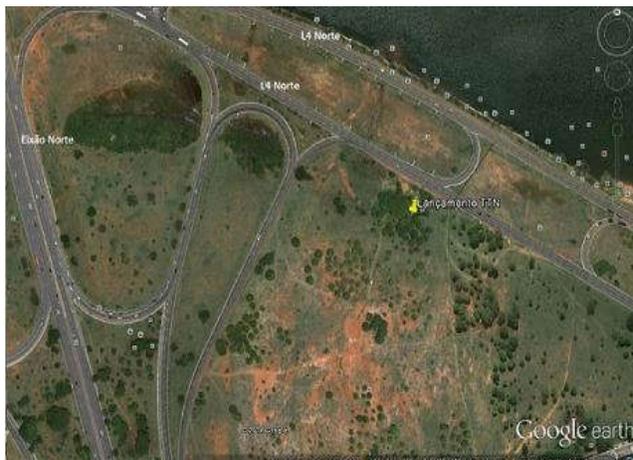

Programa de Trabalho:
 26.782.6216.3056.0004
 Etapa 36 SAG 2017/Etapa 55 SAG 2016
 N° do Processo: 113.005.297/2013
 N° do Contrato: 010/2016
 Empresa: STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A
 Data da Assinatura do Contrato: 14/04/2016
 Data do Recebimento da IS: 02/05/2016
 Data prevista de conclusão: 20/11/2018
 Valor inicial: R\$ 7.993.852,19
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Eng.º Antônio Gomes da Silva Filho e Eng.º Kênio Márcio Avelar (suplente)
 IS 05/05/2016)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Supervisão das obras de implantação do Trevo de Triagem Norte (TTN), remodelação da ponte do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego nas rodovias DF-002 (ERN) e DF-007 (EPTT). Cc nº 008/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
 Andamento normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2017:
 Andamento normal.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída
