



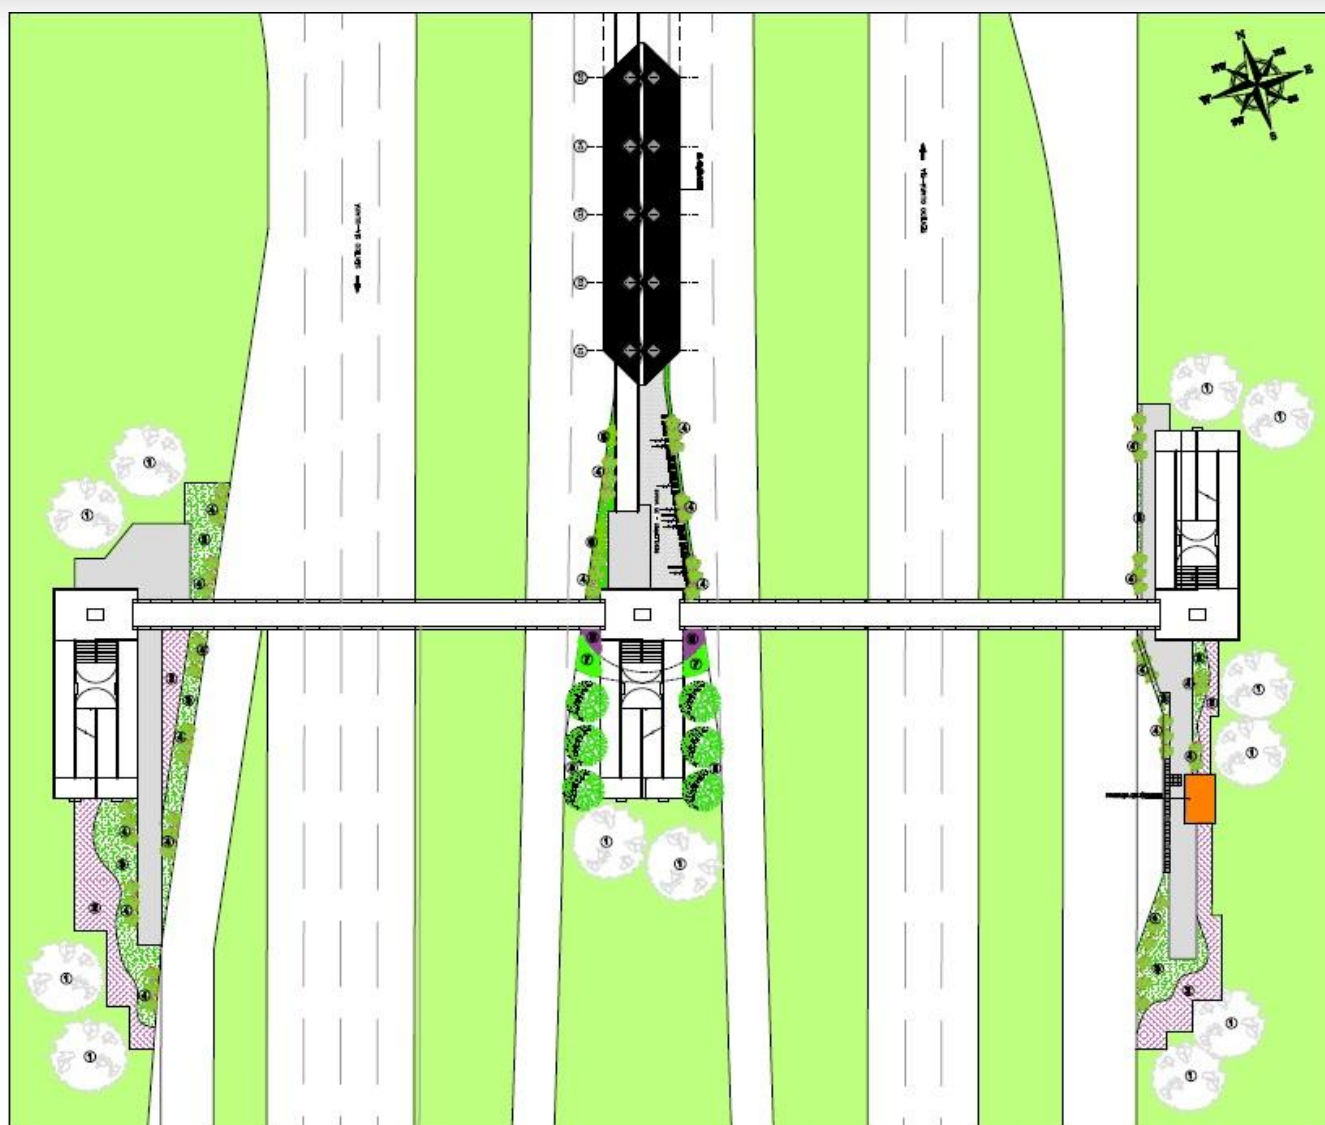

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL— 4º Bimestre/2013

SOLUÇÃO INTEGRADA PARA DEPARTAMENTOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

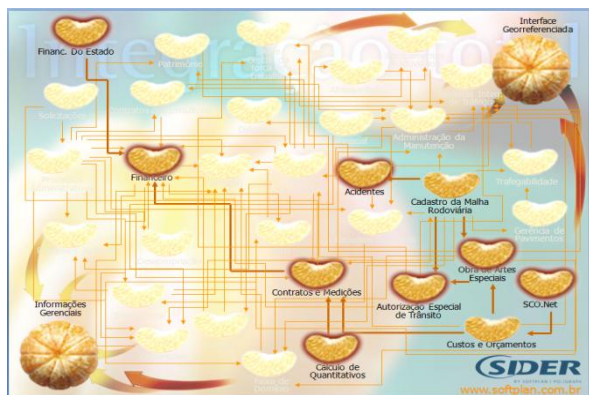

PROGRAMAS DE TRABALHO:

26.122.6010.8517.0006 (2011),

26.122.6010.8517.0014 (2012),

26.122.6010.2557.2569 (2013)

RA 99 – TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 113.000.376/2007

Nº DO CONTRATO: 051/2008

EMPRESA: POLIGRAPH SISTEMAS E

REPRESENTAÇÕES LTDA

DATA DE INÍCIO: 01/01/2009

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013

VALOR: R\$ 2.727.734,84 + R\$ 80.660,68 =

R\$ 2.808.395,52 (8º ADITIVO)

RECURSOS: FONTES 100, 237, 300, 220, 420, 437

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços especializados de engenharia, visando a sistematização de um modelo integrado de gestão, permitindo ao DER-DF alcançar, com base em um banco de dados unificado, melhorias sustentáveis para a gestão de contratos de obras rodoviárias, segurança de trânsito de pessoas e de cargas do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

Solução recebida oficialmente no final do ano de 2010 e, desde então, mantida, o que justifica, além da possibilidade legal, a vigência atual e suas renovações. Os serviços prestados foram: assistência com análise, diagnóstico e solução de problemas, atendimento às dúvidas sobre as características e utilização das ferramentas e aplicativos de apoio, alterações e implementação de novas funções, consultas e/ou novos relatórios, desde que não caracterize o desenvolvimento de novos módulos ou impliquem em alterações estruturais no funcionamento do aplicativo.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%
---	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 2º Bimestre de 2012:

- Contrato renovado até 31/12/2013.
- Principais atividades:

A Consultoria contratada deverá disponibilizar equipe técnica em sua sede para atender ao DER/DF por telefone, faz internet, conexão remota através de modem ou correspondência convencional, prestando serviços para: a) Assistência com análise, diagnóstico e solução de problemas; b) Atendimento às dúvidas sobre as características e utilização das ferramentas e aplicativos de apoio; c) Alterações e implementação de novas funções, consultas e/ou novos relatórios, desde que não caracterize o desenvolvimento de novos módulos ou implique em alterações estruturais no funcionamento do aplicativo.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO




PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6215.2460.0001(2012), etapa 25 SAG
 RA 99 – TODO DF
Nº DO PROCESSO: 113.008.698/2011
CONTRATO: 027/2011
EMPRESA: GRÁFICA E EDITORA
 MOVIMENTO
DATA DE INÍCIO: 19/12/2011
DATA PREVISTA CONCLUSÃO: 18/12/2013
 (PRIMEIRO ADITIVO)
VALOR: R\$ 1.700.000,00
RECURSOS: FONTE 237

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços gráficos e diagramação de campanhas educativas de trânsito e meio ambiente, por meio de confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços gráficos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

Foram gastos R\$ 42.111,71 com serviços reprográficos e realizadas diversas ações, como palestras, campanha Volta às Aulas, Dia Mundial do Pedestre, Dia Nacional do Ciclista, Comando Saúde, Operação Funil, e Campanha para Motociclistas, totalizando 18.800 abordagens.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO TIPO TALÃO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.2541.0001 (2013)

RA 99 – TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 113.006353/2010

Nº DO CONTRATO: 031/2010

EMPRESA: ENGEBRÁS S/A INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 07/12/2010

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 25/06/2014
(NONO ADITIVO)

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 642.951,60


RECURSOS: FONTE 237

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Locação de 50 (cinquenta) equipamentos eletrônicos do tipo Talão para captura e registro eletrônico de infrações de trânsito.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

➤ Em 2013 já foi pago: R\$ 53.579,30 (jan/13) + R\$ 53.579,30 (fev/13) + R\$ 53.579,30 (março/12) + R\$ 53.579,30 (abr/13) + R\$ 53.579,30 (mai/13) + R\$ 53.579,30 (jun/13) + R\$ 53.579,30 (jul/13).
Totalizando = R\$ 375.055,10 no ano de 2013.

➤ O contrato foi prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 29/05/2013.



Avanço Físico Bimestral



% Acumulativo Executado dos Serviços

■ A Ser Iniciada ■ Não Iniciada ■ Cancelada ■ Andamento Normal ■ Atrasada ■ Paralisada ■ Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- A paralisação do presente contrato deve-se à necessidade de obtenção de dados on-line que alimentarão a base de consulta para o registro eletrônico de infrações de Trânsito. Estes dados são obtidos junto ao DETRAN/DF, órgão detentor dos registros relacionados aos veículos e condutores, no âmbito do DF.
- Até o momento, estes dados ainda não foram repassados pelo DETRAN/DF. O DER/DF tem realizado consultas sistemáticas junto ao DETRAN/DF para a obtenção desses dados (ofícios, e-mails, telefonemas, reuniões).
- Comentário 4º bimestre: Fica reativado o contrato a partir de 03 de outubro de 2012, ficando inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato nº 31/2012.
- Nono Termo Aditivo (DODF nº 118 de 11/06/2013): O valor estimado para o próximo período é de R\$ 642.951,60.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- Obtenção contínua da base de dados necessárias junto ao DETRAN/DF para que os talonários comecem a ser utilizados.



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.2541.0001

Nº DO PROCESSO: 113.001.225/2008

Nº DO CONTRATO: 028/2011

EMPRESA: ENGEBRÁS S/A INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA

DATA DE INÍCIO: 23/12/2011

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2014

VALOR: R\$ 21.979.430,01 + R\$ 1.187.120,00

(TERCEIRO ADITIVO) = R\$ 23.166.550,01

RECURSOS: FONTE 237

DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO: Monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:
Executado 16,6% no bimestre. Acumulado. 66,4%. Contrato em ritmo normal.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	16,6%	16,6 %	16,6%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	33,2%	49,8%	66,4%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

Trata-se de serviço de natureza contínua.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP

AutoStore



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.2541.0001

Nº DO PROCESSO: 113.010.751/2011

Nº DO CONTRATO: 018/2012

EMPRESA: LIG MÓBILE TELECOMUNICA-ÇÕES LTDA

DATA DE INÍCIO: 06/06/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 05/06/2014
(PRIMEIRO ADITIVO)

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 147.696,00 + R\$ 26.263,00 (PRIMEIRO ADITIVO) = R\$ 173.959,00

RECURSOS: FONTE 237


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Locação de 60 equipamentos de Rádio Comunicação e 02 (dois) Fixos (estação Rádio Base).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

➤ Os equipamentos começaram a serem utilizados em 28/06/12.

➤ O contrato foi prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 04/06/2013, e foi acrescido ao contrato mais 10 (dez) equipamentos de rádio comunicação e 01 (um) fixo (estação rádio base), totalizando, a partir de agora, desembolso mensal de R\$ 19.861,00.

➤ Até hoje, já foi pago R\$ 3.360,00 (jun/12 – habilitação dos rádios) + R\$ 1.202,80 (locação jun/12) + R\$ 12.028,00 (jul/12) + R\$ 12.028,00 (ago/12) + R\$ 12.028,00 (set/12) + R\$ 12.028,00 (out/12) + R\$ 12.028,00 (nov/12) + R\$ 12.028,00 (dez/12), + R\$ 12.028,00 (jan/13) + R\$ 12.028,00 (fev/13) + R\$ 12.028,00 (março/13) + R\$ 12.028,00 (abril/13) + R\$ 12.028,00 (maio/13) + R\$ 12.028,00 (jun/13) + R\$ 19.861,00 (jul/13), totalizando R\$ 76.730,80 (ano 2012) + R\$ 92.029,0000 (ano/2013).



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.2541.0001

Nº DO PROCESSO: 054.001403/2011

Nº DO CONVÊNIO: 001/2012

CONVENIADO: POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DATA DE INÍCIO: 11/05/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 11/05/2014

RECURSOS: FONTES 237 E 437

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 66,4%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
16,6%	33,2%	49,8%	66,4%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

**FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF,
SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



PROGRAMAS DE TRABALHO:

26.782.2800.2904.0001 (2011) e
26.782.6215.2904.0001 (2012), ETAPA 29 SAG
RA 99 – TODO DF

Nº DO PROCESSO: 113.005.681/2010

Nº DO CONTRATO: 011/2011

EMPRESA: HOT COZINHA INDUSTRIAL

DATA DE INÍCIO: MARÇO/ 2011

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2014
(TERCEIRO ADITIVO)

VALOR: R\$ 152.496,00

RECURSOS: FONTE 237

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Lanche para as crianças das Escolas Públicas, que são levadas nos períodos matutino e vespertino, no Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o Trânsito, para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

Foram gastos R\$ 6.583,45 com fornecimento de lanche para Transitolândia e foram atendidas 1.684 crianças.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%
---	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ Terceiro aditivo (DODF nº 118 de 11/06/2013): O valor estimado para o próximo período é de R\$ 152.496,00.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.3209.0001

Nº DO PROCESSO: 113.000.076/2013

Nº DO CONTRATO: 018/2013

EMPRESA: SITRAN-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA

DATA DE INÍCIO: 03/06/2013

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 11/05/2014 (PRIMEIRO ADITIVO)



VALOR: R\$ 838.882,14

RECURSOS: 237

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de sinalização para orientação de destino específica para eventos do Comitê organizador da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

Avanço físico 16%. Acumulado 86%. Suspensão dos serviços: Primeiro Termo aditivo - Suspensão da execução dos serviços a partir de 12/07/2013, devendo encerrar-se em 11/05/2014 (DODF nº 157, de 01/08/2013), motivo: as rodovias DF-047; DF-003; DF-025; DF-065 e DF-480; 17 semipórticos não puderam ser instalados porque modificações estão sendo realizadas nas faixas lindeiras destas rodovias como parte de obras de adequação.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 3º Bimestre: Providenciando medição dos serviços executados.

➤ 4º Bimestre: Primeiro Termo aditivo - Suspensão da execução dos serviços a partir de 12/07/2013, devendo encerrar-se em 11/05/2014 (DODF nº 157, de 01/08/2013).

- Aguardando publicação do 2º termo aditivo - correção da data do início do contrato para 03/06/2013 e não 30/05/2013. Quando reativar o contrato.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE TRAVESSIA DE ANIMAIS SILVESTRES



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.3209.0001

Nº DO PROCESSO: 113.003.307/2011

Nº DO CONTRATO: 022/2013

EMPRESA: SITRAN-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETROÔNICA LTDA

DATA DE INÍCIO: 08/08/2013 (PRIMEIRO ADITIVO)

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 05/12/2013 (PRIMEIRO ADITIVO)

VALOR: R\$ 84.476,66

RECURSOS: 237

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de sinalização de advertência de animais silvestres na DF-001 e BR-450, em torno do Parque Nacional de Brasília (PNB).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

As placas, no total de 52, estão sendo confeccionadas e serão implantadas até o prazo de execução dos serviços, 05/11/2013.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE TRAVESSIA DE ANIMAIS SILVESTRES

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:


SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VÁRIOS TRECHOS DE RODOVIAS DO SRDF



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6215.4197.0001(2012)
 Nº DO PROCESSO: 113.007.600/2011
 Nº DO CONTRATO: 013/2012
 EMPRESA: SITRAN – COMÉRCIO E
 INDÚDTRIA DE ELETRÔNICA LTDA.
 DATA DE INÍCIO: 15/05/2012
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 29/10/2013
 (QUARTO ADITIVO)
 VALOR: R\$ 9.201.943,03 + R\$ 2.235.918,41
 (SEGUNDO ADITIVO) = R\$ 11.437.861,44
 RECURSOS: FONTE 237

DESCRIÇÃO DA OBRA: Sinalização Horizontal em vários trechos de rodovias do SRDF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:
 Serviço concluído. Suspensão da vigência contratual.

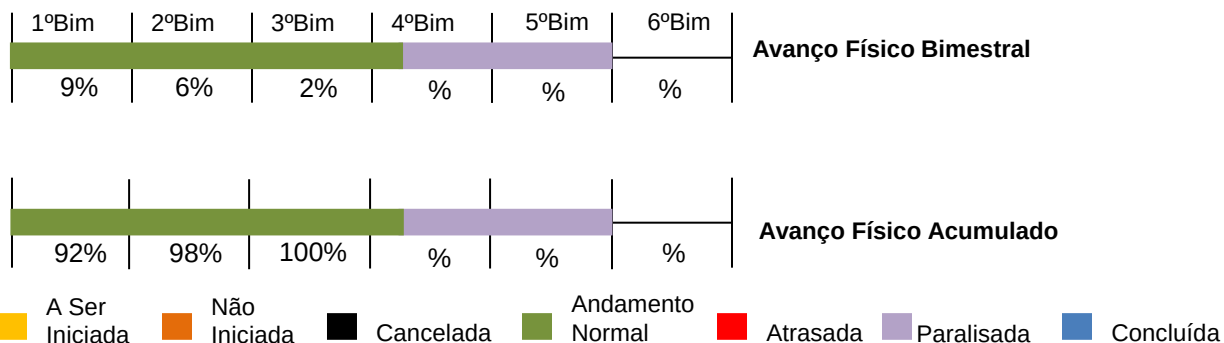

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VÁRIOS TRECHOS DE RODOVIAS DO SRDF

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 1º Bimestre de 2013: Solicitado a prorrogação de prazo de execução dos serviços por mais 30 dias tendo em vista o período chuvoso e suas consequências que impediram a aplicação de material termoplástico extrudado e hot-spray, dificultando a execução dos serviços.
- 3º Bimestre: Em 22/05/2013 foi encaminhado pelo Executor do contrato ao Superintendente de Obras /DER/DF a Decisão nº 6225/2012 do TCDF e solicitado manifestação da PROJUR, da SUAFIN, da SUTEC para aplicação dos preços do sistema SICRO 2 do DNIT, pois o Executor não pode alterar qualquer cláusula para readequação do contrato sem a anuência do ordenador de despesa.
- 4º Bimestre: Quarto Termo Aditivo- Suspende a vigência contratual por 90 dias, devendo encerrar-se em 29/10/2013 (DODF nº 157, de 01/08/2013).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6515.4198.0001

Nº DO PROCESSO: 113.004.476/2006

Nº DO CONTRATO: 020/2008

EMPRESA: SITRAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETÔNICA LTDA.

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 01/08/2008

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 01/08/2014
(SEXTO ADITIVO)

VALOR: R\$ 2.105.493,13 (INICIAL)

RECURSOS: FONTE 237

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Manutenção preventiva dos equipamentos do sistema semafórico operado pelo DER/DF. Concorrência nº 01/2007.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 66,4%. Contrato prorrogado por mais 1 ano e em andamento normal.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	33,2%	49,8%	66,4%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ Trata-se de serviço de natureza contínua.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-095 (EPCL)





PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1347.9481 (2012)
 Nº DO PROCESSO: 113.006.748/2011
 Nº DO CONTRATO: 007/2012
 EMPRESA: AJL ENGENHARIA E
 CONSTRUÇÕES LTDA.
 DATA DE INÍCIO: 03/05/2012
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/03/2013
 (QUARTO ADITIVO).
 VALOR: R\$ 1.643.903,83
 RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de Passarela em estrutura mista na Rodovia DF-095 (EPCL), Trecho DF-003(EPIA) e DF-097 (EPAC), próximo ao Ceasa.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2013:

Medição Final já foi paga. Concluída a obra e o contrato.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-095
(EPCL)**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-001 (EPCT), TRECHO ENTRONC. BR-060 E A DF-075, PRÓXIMO A 1ª AVENIDA



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1347.9481 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.005.702/2011
Nº DO CONTRATO: 008/2012
EMPRESA: RIO PLATENSE CONSTRUÇÕES,
 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 03/05/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/01/2013
VALOR: R\$ 1.218.484,17
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de Passarela em estrutura mista na Rodovia DF-001 (EPCT), Trecho: Entroncamento da BR-060 a DF-075 (EPNB), próximo à 1ª Avenida.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2013:
 Acumulado 100%. Concluída a obra e o contrato.



 A Ser Iniciada	 Não Iniciada	 Cancelada	 Andamento Normal	 Atrasada	 Paralisada	 Concluída
--	--	---	--	--	--	---

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-001
(EPCT), TRECHO: ENTRONC. BR-060 E A DF-075, PRÓXIMO A 1ª AVENIDA**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA RODOVIA DF-075 (EPNB), TRECHO ENTRE A DF-003 E A DF-079 (UPA).



PROGRAMAS DE TRABALHO:

26.782.6216.1347.9481

Nº DO PROCESSO: 113.007.989/2012

Nº DO CONTRATO: 020/2013

EMPRESA: RIO PLATENSE CONSTRUÇÕES,
PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

DATA DE INÍCIO: 26/06/2013

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013

VALOR: R\$ 1.898.558,31

RECURSOS: FONTE 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração projeto de construção de passarela na Rodovia DF-075 (EPNB), entroncamento com a DF-003 e a DF-079.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

Executado 1,10% no bimestre. Foi realizado 25% dos serviços gerais (implantação do canteiro, locação e identificação da obra).

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	1,1%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	1,1%	%	%
---	---	---	------	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA RODOVIA DF-075 (EPNB), TRECHO ENTRE A DF-003 E A DF-079.

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ A obra teve início em 06/08/2013, em consequência do recebimento da IS nº 007/2013.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

➤ Está prevista a aprovação dos Projetos Executivos (100%), execução de 100% da infraestrutura, 50% da mesoestrutura, 50% da estrutura metálica e 50% da superestrutura.



VIADUTO ENGENHO DAS LAGES, TRECHO ENTRONC. BR-060 COM A DF-290



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.0011(2012)
Nº DO PROCESSO: 113.010.021/2009
Nº DO CONTRATO: 017/2012
EMPRESA: ETEC
DATA DE INÍCIO: 01/06/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 28/07/2013
 (QUARTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 7.266.888,31
RECURSOS: FONTES 231 e 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Viaduto do Engenho das Lages, obras de finalização de implantação do entroncamento da BR-060 com a DF-290.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:
 Contrato concluído.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

VIADUTO ENGENHO DAS LAGES, TRECHO ENTRONC. BR-060 COM A DF-290

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO: DF-410/DF-345, PLANALTINA - LOTE 1



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.0027 (2013),
Nº DO PROCESSO: 113.010.929/2011
Nº DO CONTRATO: 006/2013
EMPRESA: TRIER ENGENHARIA LTDA.
DATA DE INÍCIO: 20/03/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013
(TERCEIRO ADITIVO)
VALOR: R\$ 3.130.103,78
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Pavimentação da DF-230 no trecho compreendido entre seu entroncamento com a DF-345 até o entroncamento com a DF-410, identificado como LOTE 1 (km 10,20 ao km 13,50, da estaca 85 a estaca 250). As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização. Extensão de Pavimentação: 3.300,00 m (conforme dados do Edital de Concorrência nº 006/2012).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:
Executado 45% no bimestre. Concluídos os serviços de drenagem profunda e bueiros; Executado 90% da terraplenagem; 30% da pavimentação.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	10%	45%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	10%	55%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 2º bimestre de 2013: Início dos serviços de drenagem a partir do 3º bimestre.
- 3º bimestre de 2013: Início dos serviços de limpeza e terraplenagem.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- 4º bimestre: Execução da pavimentação, término dos serviços de drenagem (bueiros).
- 5º bimestre: Conclusão da terraplenagem e pavimentação.

PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO DF-410/ DF-345 PLANALTINA- LOTE 2



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.0027(2013) ,
Nº DO PROCESSO: 113.000.768/2013
Nº DO CONTRATO: 007/2013
EMPRESA: TRIER ENGENHARIA LTDA .
DATA DE INÍCIO: 20/03/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013
(TERCEIRO ADITIVO)
VALOR: R\$ 6.132.454,62
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Pavimentação da DF-230 no trecho compreendido entre seu entroncamento com a DF-345 até o entroncamento com a DF-410, identificado como LOTE 2 (km. 13,50 ao km. 19,10), até o asfalto existente (da estaca 250 a estaca 530). As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização. Extensão de Pavimentação: 5.600,00 m. (Conforme dados do Edital de Concorrência nº 006/2012).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:
Executado 50% no bimestre. 90% de terraplenagem, 90% de drenagem profunda e 30% da pavimentação.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	17%	50%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	17%	67%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO: DF-410/DF-345, PLANALTINA - LOTE 2

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 2º bimestre de 2013: Início dos serviços de drenagem.
- 4º bimestre de 2013: Conclusão da limpeza superficial.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- 5º bimestre: Conclusão dos serviços de terraplenagem e pavimentação.

**CONSTRUÇÃO DE ACESSO (AGULHA) à DF-003 (EPIA), TRECHO DF-095/DF-010,
COM IMPLANTAÇÃO DE BAIA DE PARADA DE ÔNIBUS E REMANEJAMENTO DO
ABRIGO EXISTENTE.**



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.1199 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.010.786/2010
Nº DO CONTRATO: 028/2012
EMPRESA: CRC – CONSTRUTORA
RODRIGUES CAMPOS LTDA
DATA DE INÍCIO: 09/08/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/09/2013
(QUARTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 199.873,17
RECURSOS: FONTE 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de acesso (Agulha) à DF-003 (EPIA), trecho DF-095/DF-010, com implantação de baia de parada de ônibus e remanejamento do abrigo existente.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:
Contrato concluído.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
99%	1%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
99%	100%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

**CONSTRUÇÃO DE ACESSO (AGULHA) à DF-003 (EPIA), TRECHO DF-095/DF-010,
COM IMPLANTAÇÃO DE BAIA DE PARADA DE ONIBUS E REMANEJAMENTO DO
ABRIGO EXISTENTE.**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

RECURSOS: FONTE 100

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	42%	%	%

%	%	%	42%	%	%

38

DUPLICAÇÃO DF-451

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PAVIMENTAÇÃO VIA DE ACESSO A VILA BASEVI E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA.



PROGRAMAS DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.4734 (2012)
 26.782.6216.1475.1199 (2013)
 Nº DO PROCESSO: 113.009.410/2009
 Nº DO CONTRATO: 061/2012
 EMPRESA: DIVAL ENGENHARIA LTDA.
 DATA DE INÍCIO: 20/11/2012
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/08/2013
 (SEGUNDO ADITIVO)
 VALOR: R\$ 1.732.147,49
 RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Pavimentação via de acesso a Vila Basevi e implantação de ciclovia.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:

- Rescindido o contrato com a Dival Engenharia. A 2ª empresa assumiu o serviço. Foi publicado um novo contrato;
- A empresa SETA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E ADMINISTRAÇÃO LTDA, assumiu os serviços da DIVAL Engenharia Ltda.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	2%	0%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
2%	4%	4%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO VIA DE ACESSO A VILA BASEVI E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA.

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 1º Bimestre de 2013: A Superintendência de Obras está a par da inexecução parcial da obra da Vila Basevi, mesmo tendo enviado diversas cartas cobrando celeridade da empresa, a contratada não retornou os serviços, estando a obra paralisada.
- 2º Bimestre de 2013: A contratada retomou os serviços de terraplenagem após cobrança da Superintendência de Obras e da fiscalização.
- A empresa deverá apresentar ao DER qual será o novo plano de ação, uma vez que até a presente data só executou a limpeza parcial e parte do rebaixo do sub leito.
- O contrato da empresa expira em 20/03/2013 e a fiscalização informa que a empresa Dival Engenharia não deverá terminar o contrato e a obra, estando passível de sanções conforme o contrato assinado.
- 3º Bimestre de 2013: Contrato Rescindido com a DIVAL em 21/06/2013 (DODF Nº 133 de 28/06/2013).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PAVIMENTAÇÃO VIA DE ACESSO A VILA BASEVI E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA.



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.1199
Nº DO PROCESSO: 113.009.410/2009
Nº DO CONTRATO: 023/2013
EMPRESA: SETA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E ADMINISTRAÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 12/07/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/01/2014
VALOR: R\$ 1.732.147,49
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Pavimentação via de acesso a Vila Basevi e implantação de ciclovia. Concorrência Nº 003/2012.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

- Executado 81% no bimestre. Acumulado 85%.
- 100% do serviço da Via de Ligação concluído, restando apenas a terraplenagem da ciclovia;
- 100% do serviço de solo cal concluído;
- 90% de bloquetes assentados;
- 65% do serviço de drenagem concluído.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	81%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	4%	85%	%	%
---	---	----	-----	---	---

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

PAVIMENTAÇÃO VIA DE ACESSO A VILA BASEVI E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA.

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 4º Bimestre: Rescindido o contrato com a Dival Engenharia. A 2ª empresa assumiu o serviço (DODF nº 133, de 28/06/2013)

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

1. Conclusão dos assentamentos dos bloquetes;
2. Início e término da terraplenagem da ciclovia;
3. Término do serviço de drenagem
4. Início e Término das obras complementares (suavização dos taludes, plantio de árvore, plantio de grama, etc).

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 1



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.005.389/2011
Nº DO CONTRATO: 053/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E
 CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 16/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/10/2013
 (SEGUNDO ADITIVO)
VALOR: R\$ 2.687.681,33
RECURSOS: FONTE 148

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF – 355 Lote 1

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

- Executado 35% no bimestre. Acumulado 85%.
- Conclusão do serviço de solo cal;
- Conclusão do serviço de BGS;
- 85% do serviço de pavimentação concluído.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
2%	10%	38%	35%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
2%	12%	50%	85%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 1

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 1º Bimestre:

- O empenho só saiu no final do 1º bimestre e a empresa contratada imediatamente iniciou os serviços de terraplenagem.
- Rebaixo e regularização do sub-leito
- Serviços de terraplanagem
- Encabeçamento da ponte
- Execução dos serviços de drenagem
- Instalação do caminho de serviço
- Todos os serviços do bimestre anterior foram praticamente concluídos.

➤ 2º Bimestre:

- Inicialização do reforço do sub-leito em solo cal.
- Inicialização e término da sub-base em solo cal.
- Término do encabeçamento da ponte

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

1. Inicialização e término das obras complementares (defensas metálicas);
2. Inicialização e conclusão da sinalização vertical e horizontal;
3. Acabamento nos bordos e caixas de empréstimo ao longo da rodovia.

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 2




PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.001.123/2013
 (PROC. ORIGINAL 113.005.389/2011)
Nº DO CONTRATO: 053/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E
 CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 16/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/10/2013
 (SEGUNDO ADITIVO)
VALOR: R\$ 2.604.238,43
RECURSOS: FONTE 148

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF – 355, Lote 2

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

- Executado 45% no bimestre. Acumulado 75%.
- Conclusão do serviço de terraplenagem;
- Conclusão do serviço de solo cal;
- 85% do serviço de base em brita graduada concluído;
- 35% do serviço de pavimentação concluído;
- 70% do serviço de drenagem concluído.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 2

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤1º Bimestre:

- O empenho só saiu no final do 1º bimestre.
- Término do serviço de limpeza
- Execução dos caminhos de serviço
- Execução da drenagem
- Serviço de terraplanagem
- Rebaixo do sub leito


➤2º Bimestre

- Finalizar os serviços de terraplenagem e dos dispositivos de drenagem
- Inicializar os serviços para o reforço do sub-leito em solo cdl
- Inicializar os serviços para instalação da sub-base em solo cdl.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

1. Conclusão do serviço de base em brita graduada;
2. Conclusão do serviço de pavimentação;
3. Conclusão do serviço de drenagem;
4. Inicialização e término das obras complementares (plantio de grama batatais);
5. Inicialização e conclusão da sinalização rodoviária;
6. Início e término da colocação de tachas e de tachões.



PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 3

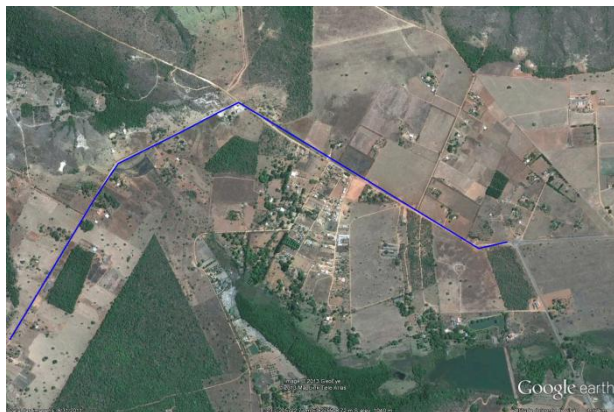

PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.001.124/2013
 (PROC. ORIGINAL 113.005.389/2011)
Nº DO CONTRATO: 053/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E
 CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 16/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/10/2013
 (SEGUNDO ADITIVO)
VALOR: R\$ 2.560.770,55
RECURSOS: FONTE 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF – 355 Lote 3.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:
 Avanço 65%. Acumulado 75%. Executado os serviços de terraplenagem; pavimentação, drenagem e obras de arte correntes.



A Ser Iniciada Não Iniciada Cancelada Andamento Normal Atrasada Paralisada Concluída

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 3

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

Questionamento técnicos relativo a execução dos serviços foram respondidos em junho 2013 pela SUTEC o que levou a demora no início da execução da obra .

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 4





PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.001.125/2013
 (PROC. ORIGINAL 113.005.389/2011)
Nº DO CONTRATO: 053/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E
 CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 16/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/10/2013
 (SEGUNDO ADITIVO)
VALOR: R\$ 2.658.283,00
RECURSOS: FONTE 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF – 355, Lote 4.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

Executado 55%. Acumulado 65%. Executado os serviços de terraplenagem; pavimentação, drenagem e obras de arte correntes.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 4

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

Questionamento técnicos relativo a execução dos serviços foram respondidos em junho 2013 pela SUTEC o que levou a demora no início da execução da obra.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL DO TIPO PONTE EM TRECHO DA DF – 355.



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.1475.3517 (2012)

Nº DO PROCESSO: 113.004.242/2010

Nº DO CONTRATO: 056/2012

EMPRESA: LAJE ENGENHARIA LTDA

DATA DE INÍCIO: 23/10/2012


DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/08/2013
(SEGUNDO ADITIVO)

VALOR: R\$ 1.272.771,83

RECURSOS: FONTES 348 E 148

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração de Projeto Executivo e a Construção de uma Obra de Arte Especial, do tipo Ponte, sobre o Córrego Jardim na DF- 355.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:
Contrato concluído.



■ A Ser Iniciada ■ Não Iniciada ■ Cancelada ■ Andamento Normal ■ Atrasada ■ Paralisada ■ Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- Em 16/04/2013 foi solicitado a SUOBRA a paralisação da obra em virtude do aterro do encabeçamento da ponte ainda não estar concluído.
- Em 18/06/2013 prorroga o contrato até 31/08/2013.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:



RECUPERAÇÃO DA PISTA DO BALÃO DO COLORADO E IMPLANTAÇÃO DA FAIXA DE ACELERAÇÃO NA RODOVIA BR-450/DF-003 (EPIA)



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1475.8121 (2012) ,
Nº DO PROCESSO: 113.008.571/2011
Nº DO CONTRATO: 003/2012
EMPRESA: CONSORCIO RV-CONVAP- ARP
DATA DE INÍCIO: 11/04/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013
 (8º ADITIVO)
VALOR: R\$ 5.616.681,44 (10º ADITIVO)
RECURSOS: FONTES 231, 148, 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução das obras de recuperação da pista do Balão do Colorado, implantação da faixa de aceleração na rodovia BR-450/DF-003 (EPIA) e a realização dos serviços complementares na DF-150, inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 60%. Aguardando autorização dos Órgãos competentes (Exército Brasileiro e Defesa Civil) para o uso de explosivos na execução da galeria de águas pluviais e para o início da escavação de mat. 3ª cat. no túnel N.A.T.M, localizado no Balão do Grande Colorado.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

RECUPERAÇÃO DA PISTA DO BALÃO DO COLORADO E IMPLANTAÇÃO DA FAIXA DE ACELERAÇÃO NA RODOVIA BR-450/DF-003 (EPIA)


COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 1º Bimestre (30/01/2013): Obra paralisada a partir de 27/12/2012.
- 3º Bimestre (24/06/2013): Contrato prorrogado por 120 dias.
- Fim da paralisação do contrato em 27/03/2013, porém é necessária a liberação do uso de explosivos por parte do Exército Brasileiro para dar continuidade à obra.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- Para 2013: Execução do túnel N.A.T.M. localizado no balão do Grande Colorado e conclusão da obra.

RESTAURAÇÃO DA DF-180, TRECHO: BR-060 A BR-070, LOTE 01


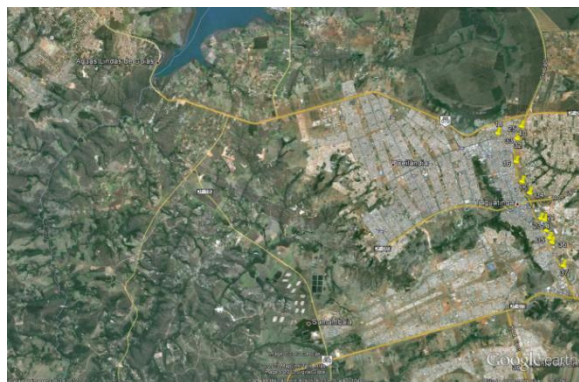


PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1689.0005 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.792/2011
Nº DO CONTRATO: 058/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 13/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013 (SEGUNDO ADITIVO)
VALOR: R\$ 2.335.435,89
RECURSOS: FONTE 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da rodovia DF-180 no trecho compreendido do seu entroncamento com a BR-070/DF-190, identificado como Lote 01. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:
 Executado 65% no bimestre. Iniciados os serviços de:

- Fresagem;
- Terraplenagem (base e sub-base) na pista de rolamento e acostamento;
- Pavimentação (imprimação, pintura de ligação e capa) na pista de rolamento e acostamento.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 2º bimestre de 2013: Aguardando empenho.
- 4º bimestre de 2013: Solicitado aditivo de prorrogação de prazo 90 dias.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF-180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO DF-190/VC-311, LOTE 02




PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1689.0005 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.804/2013
Nº DO CONTRATO: 059/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 13/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013 (SEGUNDO ADITIVO)
VALOR: R\$ 3.860.417,26
RECURSOS: FONTE: 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da Rodovia DF-180, compreendido do sub-trecho DF-190 até a VC 311, identificado como Lote 02. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

Executado 60% no bimestre. Continuação dos serviços do 3º bimestre - restauração nos acostamentos (fresagem, sub-base, base, imprimação, pintura de ligação e capa) e na pista (fresagem, sub-base, base, imprimação, pintura de ligação e capa). Iniciado o serviço de drenagem.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF-180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO VC-311/BR-060, LOTE 02

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- Foi solicitado aditivo de prorrogação de prazo de 90 dias.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:


RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF-180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO VC-311/BR-060, LOTE 03



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1689.0005 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.805/2013
Nº DO CONTRATO: 060/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 13/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:
 PARALISADO ATÉ 08/11/2013 (SEGUNDO ADITIVO)
VALOR: R\$ 3.106.491,96
RECURSOS: FONTE: 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da rodovia DF-180 compreendido entre o sub-trecho da VC-311 até seu entroncamento com a BR- 060, identificado como Lote 03. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:
 Continuação dos serviços do 3º bimestre - Serviços de restauração na pista e no acostamento (fresagem, sub-base, base, imprimação, pintura de ligação e capa).

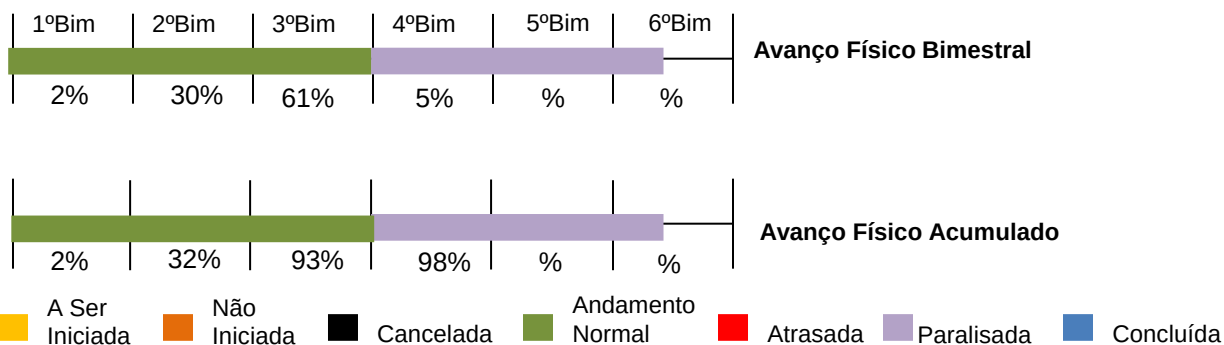


**RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF – 180, COMPREENDIDO DO
SUB-TRECHO VC 311/BR- 060, LOTE 03**

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤DODF nº 180, 29/08/2013: Contrato paralisado por 90 dias, devendo encerrar-se em 08/11/2013.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF ANEL VIÁRIO – ESTUDO EVTEA/EIA/RIMA

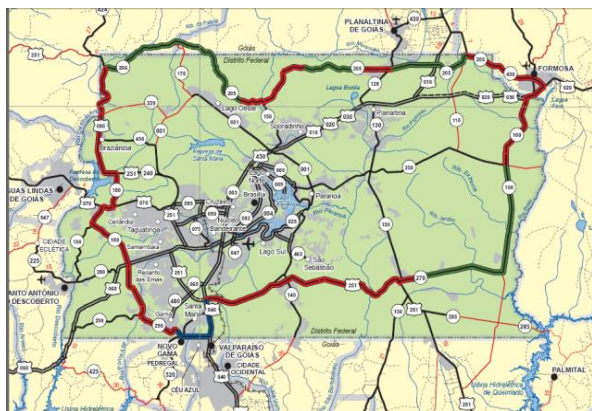

PROGRAMAS DE TRABALHO:
 26.782.2800.3550.0001 (2011) e
 26.782.6216.1968.0013(2012), ETAPA 66 SAG
 RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.002.321/2008
Nº DO CONTRATO: 040/2008
EMPRESA: STRATA ENGENHARIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 05/11/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/10/2012
VALOR: R\$ 7.290.752,11
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços de elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Estudos de Impacto Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA e dos Projetos Executivos de Engenharia das Rodovias integrantes do Anel Viário do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:
 Permanece paralisado.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	0%	0%	%	%

Avanço Físico Bimestral

60%	60%	60%	60%	%	%
-----	-----	-----	-----	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF ANEL VIÁRIO – ESTUDO EVTEA/EIA/RIMA

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ Comentário do 2º bimestre de 2012:

• Os serviços objeto do Contrato nº 040/2008 estão paralisados pelo fato dos recursos orçamentários previstos na Lei Orçamentária Anual de 2012 contemplar, na rubrica Estudos e Projetos, o valor de R\$ 3.000.000,00, para custear todos os serviços de estudos e projetos do Departamento, valor insuficiente para concluir sequer os trabalhos do Contrato nº 040/2008. Por isso foi elaborado o Memorando 027/2012 – 3º DR, de 16/01/2012, solicitando definição da Direção sobre os recursos a serem alocados no Contrato. A Direção está viabilizando junto aos Órgãos competentes a suplementação orçamentária para fazer face às despesas com o referido contrato.

➤ Comentário 4º bimestre de 2012: Foi solicitado no final de agosto a suspensão do contrato nº 040/2008, haja vista que não houve suplementação orçamentária até o momento. O contrato continua paralisado.

➤ Comentário 5º bimestre de 2012: Contrato Suspenso: Décimo Termo Aditivo, publicado no DODF nº 186 de 15/09/2012, página 55 – suspende o prazo do contrato por 90 dias a partir de 24/08/2012.

➤ Comentário 6º bimestre de 2012: Contrato continua suspenso.

➤ Comentário 1º bimestre de 2013: Vigência do contrato expirou em 24/11/2012.


➤ Comentário 2º bimestre de 2013: Vigência do contrato expirou em 24/11/2012. Continua Suspenso.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

➤ 3º bimestre de 2013: Avaliar se ainda há interesse em prosseguir com o contrato e verificar se a vigência pode ser prorrogada.

➤ 4º bimestre de 2013: Por decisão do Diretor Geral, após ouvidas as áreas técnicas e o parecer do Sr. Procurador do DER, às folhas 1709 e 1710 dos autos do processo, o presente contrato será considerado expirado.

PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA DF-131

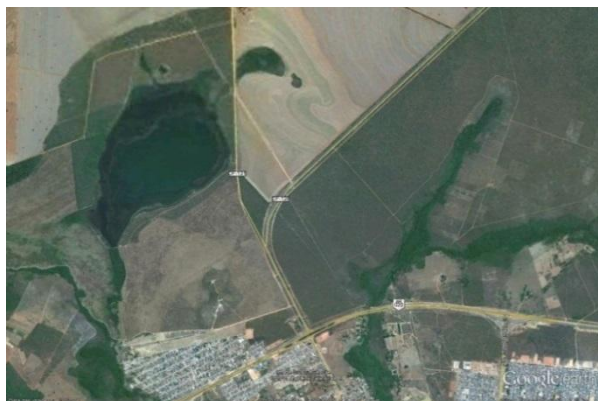

PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.1968.0013 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.011.685/2011
Nº DO CONTRATO: 034/2012
EMPRESA: EXTREMA CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 25/09/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2013
 (TERCEIRO ADITIVO)
VALOR: R\$ 489.159,33
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Projeto de Engenharia para Pavimentação da DF- 131.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:
 Projeto concluído.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
45 %	30%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
70%	100%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA DF-131


COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 1º Bimestre: Foi solicitado um aditivo de prazo de 30 dias para a correta finalização e aprovação do Componente Ambiental.
- 2º Bimestre: Foi solicitado o terceiro aditivo de prazo de 30 dias para a correta fiscalização e adequações do projeto de drenagem segundo orientações da ADASA.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- 1º Bimestre: Encerramento do contrato para o dia 23/03/2013.
- 2º Bimestre: Encerramento do contrato para o dia 23/05/2013.

**PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE EIA/RIMA, DESTINADOS À
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
ENTRE AS CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E PLANO PILOTO –
CORREDOR EIXO NORTE.**

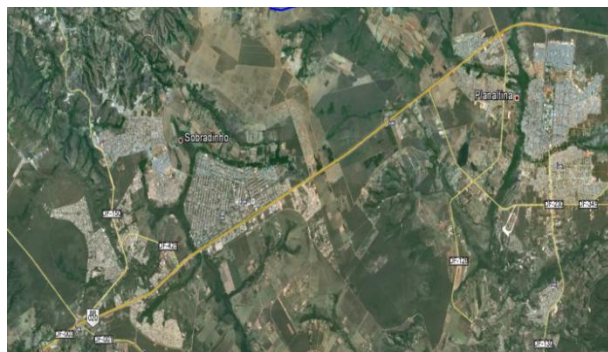

PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1968.0013 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.340/2011
Nº DO CONTRATO: 063/2012
EMPRESA: CONSÓRCIO DF INTERLIGADO
DATA DE INÍCIO: 26/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2014
VALOR: R\$ 12.251.695,70
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Projeto Executivo de Engenharia e de EIA/RIMA, destinados à implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto – Corredor Eixo Norte.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2013:

Executado 4,29% no bimestre. Acumulado físico: 29,36%.

Etapas realizadas: Relatórios de Acompanhamento 3 e 4 do Estudo Ambiental.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

Executado 5,36% no bimestre. Acumulado físico: 34,72%.

Etapas realizadas:

- Elaboração do Projeto do Corredor BRT Eixo Norte (1,63%)
- Estudo de Traçado (2,90%)
- Análise do Sistema (0,83%)

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
9,75%	6,13%	4,29%	5,36%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
18,94%	25,07%	29,36%	34,72%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE EIA/RIMA, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS ENTRE AS CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E PLANO PILOTO – CORREDOR EIXO NORTE.


COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

O Projeto encontra-se com atraso de 20% no cronograma.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Acelerar as análises dos projetos básicos entregues no final do 4º bimestre.

EXECUÇÃO DA OBRA DE AUMENTO DE CAPACIDADE E MELHORAMENTOS NA RODOVIA DF- 047 (EPAR)

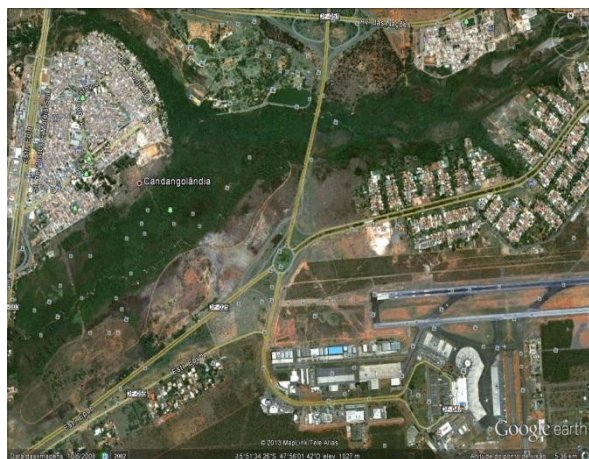

PROGRAMAS DE TRABALHO:

26.782.6216.3207.0001 (2012)

28.782.6216.3207.0004 (2013)

Nº DO PROCESSO: 113.005.351/2011

Nº DO CONTRATO: 062/2012

EMPRESA: CONSÓRCIO EPAR

(TRIER/GEOSONDA/IQS)

DATA DE INÍCIO: 26/11/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2014

VALOR: R\$ 43.400.987,10

RECURSOS: FONTE 100, 148, 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução da obra de aumento de capacidade e melhoramento na Rodovia DF-047 (EPAR). As obras englobam os serviços de terraplanagem, pavimentação rígida e flexível, drenagem, sinalização, contenção de taludes, obras de arte especiais, obras complementares e de recuperação do meio ambiente.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

Executado 22% no bimestre. Continuação dos serviços do 3º bimestre. Início dos serviços da parede diafragma no balão e dos serviços de drenagem (túnel linner).

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
1%	4,5%	2,5%	22%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
1%	5,5 %	8,0%	30%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

EXECUÇÃO DA OBRA DE AUMENTO DE CAPACIDADE E MELHORAMENTOS NA RODOVIA DF- 047 (EPAR)

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 2º bimestre de 2013:

- Projeto Executivo da trincheira em fase de aprovação pelo DER-DF.
- Projeto Executivo da drenagem em fase de aprovação pelo DER-DF.
- Foram enviadas fotos do andamento da obra.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

➤ 3º bimestre de 2013:

- Trabalhar com equipes em áreas distintas:
 - Drenagem
 - Trincheira
 - Pavimentação das marginais
- Estas ações já estão sendo executadas.
- Concentrar o serviço na trincheira.


ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/ RIMA) PARA O TREVO DE TRIAGEM NORTE (TTN)



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.3711.6161 (PRIMEIRO ADITIVO)
 Nº DO PROCESSO: 113.005.275/2012
 Nº DO CONTRATO: 033/2012
 EMPRESA: HIDROLÓGICA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 DATA DE INÍCIO: 17/09/2012
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:
 PARALISADO ATÉ 20/11/2013 (QUINTO ADITIVO)
 VALOR: R\$ 143.840,94
 RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: EIA/ RIMA para o Trevo de Triagem Norte (DF-002 – Eixo Norte / DF-007 (EPTT) – Ponte do Braghetto.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:
 Executado 50% no bimestre. Serviço concluído. Contrato suspenso.

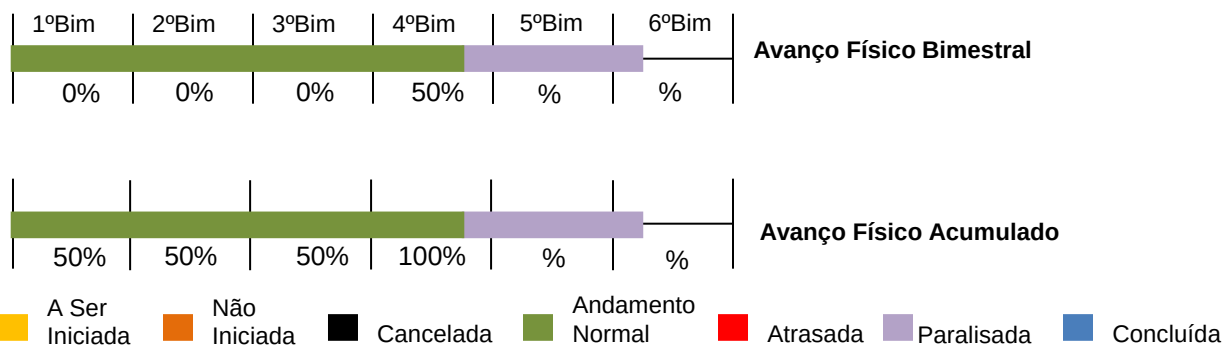

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/ RIMA) PARA O TREVO DE TRIAGEM NORTE (TTN)

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- Os serviços estão divididos em 04 produtos: 1. EIA Versão preliminar; 2. EIA Versão Final; 3. RIMA Versão Preliminar e 4. RIMA Versão Final.
- Os Produtos 1 e 3 (Versões Preliminares do EIA e do RIMA) já foram elaborados e encaminhados ao IBRAM.
- O IBRAM solicitou correções/complementações aos Produtos.
- Os produtos 2 e 4 (Versões Finais - EIA/RIMA) já foram elaborados e encaminhados ao IBRAM.
- Aguardando a manifestação do IBRAM.
- Foi solicitada a suspensão do contrato enquanto aguarda a manifestação do IBRAM.
- DODF nº 191, de 13/09/2013: Paralisa o prazo de execução dos serviços a partir de 22/08/2013, devendo encerrar-se a paralisação em 20/11/2013.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- Receber a aprovação do IBRAM para os Produtos Finais e realizar o pagamento final à Empresa contratada.

ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO TRECHO DA DF-355



PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.205.26.782.6216.3711.6161
Nº DO PROCESSO: 113.008.887/2012
Nº DO CONTRATO: 009/2013
EMPRESA: ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 25/03/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/11/2013 (TERCEIRO ADITIVO)
VALOR: R\$ 124.937,18
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração dos Planos de Controle Ambiental relativos à obra de pavimentação da rodovia DF-355, no trecho compreendido entre a DF-120 e a DF-320 e a obra de pavimentação da Via de Ligação entre a DF-001 (EPCT) e a Vila Basevi, conforme especificações nos anexos do Edital.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

Executado 10% no bimestre. Os produtos 1 e 2 (versões preliminares dos estudos ambientais) já foram entregues pela empresa contratada. Os dois produtos já foram remetido ao IBRAM para análise. Até o momento não houve resposta quanto a aceitação dos mesmos. A elaboração dos produtos finais pela empresa somente é possível após a manifestação do órgão ambiental (IBRAM).

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	0%	50%	20%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	0%	50%	70%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída


COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 3º Bimestre: A elaboração dos produtos finais pela empresa somente é possível após a manifestação do órgão ambiental (IBRAM).
- 4º Bimestre:
 - Por meio do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2013, houve a prorrogação do prazo de execução dos serviços por 90 dias, devendo expirar-se em 21/09/2013, estende-se por consequência a vigência contratual para 30/11/2013.
 - No dia 04/09/2013 foi solicitado ao Diretor Geral a suspensão do Contrato por um período de 90 (noventa) dias, enquanto aguardamos a manifestação do IBRAM para a análise dos referidos produtos (DODF nº 194, 18/09/2013).
 - A elaboração dos produtos finais pela empresa somente é possível após a manifestação do órgão ambiental (IBRAM).

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

- A elaboração dos produtos finais pela empresa somente é possível após a manifestação do órgão ambiental (IBRAM).
- Após esta manifestação, ela será remetida a empresa contratada para a correção nas versões preliminares, realizando assim, a versão final de cada estudo ambiental.

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF

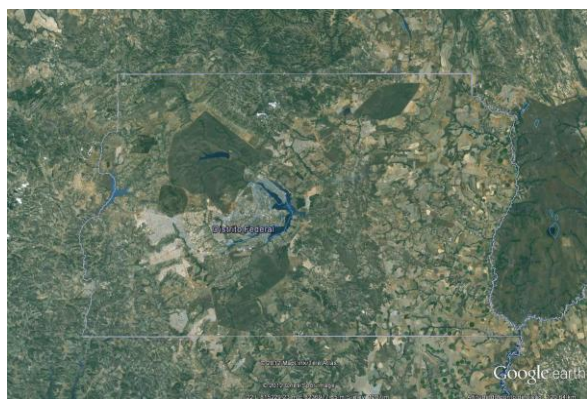

PROGRAMA DE TRABALHO:
 26.782.6216.3711.6162 (2013)
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.005.428/2006
Nº DO CONTRATO: 002/2010
FIRMA: GEO-LÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 19/02/2010
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 28/02/2014 (SEXTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 1.303.632,37
RECURSOS: FONTE 237

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central (DF e Goiás).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:
 Executado 0% no bimestre- Ritmo lento. Permanece o mesmo patamar de 60% dos serviços já realizados até o 3º bimestre de 2013.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	0%	0%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
60%	60%	60%	60%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ Os serviços estão divididos em 07 fases de trabalho, correspondendo à elaboração de 07 produtos: 1. Plano de Trabalho; 2. Levantamento das Informações; 3. Oficina de Planejamento; 4. Estudo para o Plano de Manejo; 5. Plano de Manejo Parcial; 6. Oficinas Participativas; 7. Plano de Manejo Final.

➤ Executado 60% dos serviços. Produto 4 aprovado pelo Instituto Chico Mendes e Versão Preliminar do Produto 5 em análise pela Equipe de Supervisão do ICMBio.

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Aprovar o Produto 5.

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.4195.0001

RA 99 – TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 113.000.727/2012

Nº DO CONTRATO: 023/2012

EMPRESA: G. B. DA SILVA EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO- EPP

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/07/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2013


VALOR: R\$ 222.949,00

RECURSOS: FONTE 100


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de Asfalto diluído CM-30

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

Contrato concluído. Fornecimento de 9,7% de asfalto diluído CM-30 no bimestre.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.4195.0001

RA 99 – TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 113.000.727/2012

Nº DO CONTRATO: 025/2012

EMPRESA: DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/07/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2014
(PRIMEIRO ADITIVO)



VALOR: R\$ 192.000,00

RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

Fornecimento de 15% de asfalto diluído RM-1C no bimestre, tendo em vista que o contrato foi renovado para o próximo exercício.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.4195.0001

RA 99 – TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 113.000.727/2012

Nº DO CONTRATO: 024/2012

EMPRESA: CENTRO OESTE ASFALTO LTDA

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/07/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2014
(PRIMEIRO ADITIVO)



VALOR: R\$ 77.899,80

RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

Fornecimento de 16,7% de asfalto diluído RM-1C no bimestre, tendo em vista que foi renovado para o próximo exercício.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.4195.0001

Nº DO PROCESSO: 113.007.966/2012

Nº DO CONTRATO: 005/2013

EMPRESA: PETROENGE ENGENHARIA S/A

DATA DE INÍCIO: 19/03/2013

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 18/03/2014

VALOR: R\$ 951.500,00

RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Fornecimento parcelado de 5.298 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2013:

O contrato já teve cumprido 65,55%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	55,58%	9.97%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
%	%	55,58%	65,55%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:
