




RELATÓRIO DE ANDAMENTO DE ATIVIDADES - 2013

**RELATÓRIO DE
ACOMPANHAMENTO DOS PRINCIPAIS
INVESTIMENTOS DE 2013**

ANEXO I

- **Andamento das Principais Ações**

SOLUÇÃO INTEGRADA PARA DEPARTAMENTOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

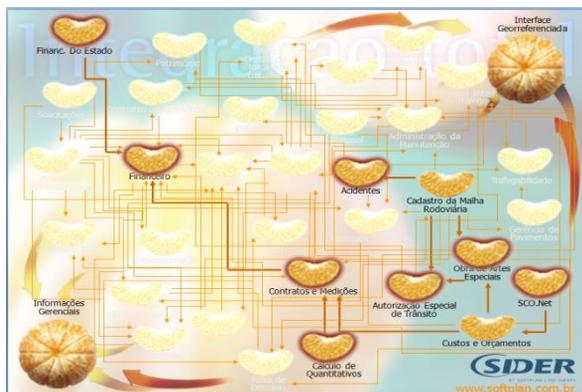

PROGRAMAS DE TRABALHO:

26.122.6010.8517.0006 (2011),
26.122.6010.8517.0014 (2012),
26.122.6010.2557.2569 (2013)
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.000.376/2007
Nº DO CONTRATO: 051/2008
EMPRESA: POLIGRAPH SISTEMAS E
REPRESENTAÇÕES LTDA
DATA DE INÍCIO: 01/01/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013
VALOR: R\$ 2.727.734,84 + R\$ 80.660,68 =
R\$ 2.808.395,52 (8º ADITIVO)
RECURSOS: FONTES 100, 237, 300, 220, 420,
437

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços especializados de engenharia, visando a sistematização de um modelo integrado de gestão, permitindo ao DER-DF alcançar, com base em um banco de dados unificado, melhorias sustentáveis para a gestão de contratos de obras rodoviárias, segurança de trânsito de pessoas e de cargas do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO: Solução recebida oficialmente no final do ano de 2010 e, desde então, mantida, o que justifica, além da possibilidade legal, a vigência atual e suas renovações. Continua em andamento o Acompanhamento, Suporte e Consultoria da nova sistematização e manutenção dos aplicativos de apoio.

CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.2460.0001(2012), ETAPA 25 SAG
RA 99 – TODO DF
Nº DO PROCESSO: 113.008.698/2011
CONTRATO: 027/2011
EMPRESA: GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO
DATA DE INÍCIO: 19/12/2011
DATA PREVISTA CONCLUSÃO: 18/12/2013
(PRIMEIRO ADITIVO)
VALOR: R\$ 1.700.000,00
RECURSOS: FONTE 237

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços gráficos e diagramação de campanhas educativas de trânsito e meio ambiente, por meio de confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços gráficos.

AVANÇO FÍSICO: No 5º Bimestre foram gastos o total de R\$ 212.382,70 com serviços gráficos. No mês de setembro foram gastos R\$ 97.965,64 com serviços gráficos voltados para campanhas educativas e Semana Nacional de Trânsito. No mês de outubro foram gastos R\$114.417,06 incluindo a Feira de Ciência e Tecnologia. Foram alcançados nos meses set/out 11.506 condutores, pedestres, ciclista e motociclistas com campanhas acerca de álcool/direção, velocidade, cadeirinha de bebê, celular, Funil, ciclista, Campanha para Motofretista, etc.

LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO TIPO TALÃO



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6215.2541.0001 (2013)
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.006353/2010
Nº DO CONTRATO: 031/2010
EMPRESA: ENGEBRÁS S/A INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 07/12/2010
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 25/06/2014
(NONO ADITIVO)
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 642.951,60
RECURSOS: FONTE 237

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Locação de 50 (cinquenta) equipamentos eletrônicos do tipo Talão para captura e registro eletrônico de infrações de trânsito.

AVANÇO FÍSICO: Em 2013 já foi pago: R\$ 53.579,30 (jan/13) + R\$ 53.579,30 (fev/13) + R\$ 53.579,30 (março/12) + R\$ 53.579,30 (abr/13) + R\$ 53.579,30 (mai/13) + R\$ 53.579,30 (jun/13) + R\$ 53.579,30 (jul/13) + R\$ 53.579,30 (ago/13) + R\$ 53.579,30 (set/13) + R\$ 53.579,30 (out/13).
Totalizando = R\$ 535.793,00 no ano de 2013.

ENGEBRAS S/A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6215.2541.0001
Nº DO PROCESSO: 113.001.225/2008
Nº DO CONTRATO: 028/2011
EMPRESA: ENGEBRÁS S/A INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA
DATA DE INÍCIO: 23/12/2011
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2014
VALOR: R\$ 21.979.430,01 + R\$ 1.187.120,00
(TERCEIRO ADITIVO) = R\$ 23.166.550,01
RECURSOS: FONTE 237

DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO: Monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N).

AVANÇO FÍSICO: Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 83%. Contrato em ritmo normal.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP

3aisStoics



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.2541.0001

Nº DO PROCESSO: 113.010.751/2011

Nº DO CONTRATO: 018/2012

EMPRESA: LIG MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

DATA DE INÍCIO: 06/06/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 05/06/2014
(PRIMEIRO ADITIVO)

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 147.696,00 + R\$ 26.263,00 (PRIMEIRO ADITIVO) = R\$ 173.959,00

RECURSOS: FONTE 237

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Locação de 60 equipamentos de Rádio Comunicação e 02 (dois) Fixos (estação Rádio Base).

AVANÇO FÍSICO: Até hoje, já foi pago R\$ 3.360,00 (jun/12 – habilitação dos rádios) + R\$ 1.202,80 (locação jun/12) + R\$ 12.028,00 (jul/12) + R\$ 12.028,00 (ago/12) + R\$ 12.028,00 (set/12) + R\$ 12.028,00 (out/12) + R\$ 12.028,00 (nov/12) + R\$ 12.028,00 (dez/12), + R\$ 12.028,00 (jan/13) + R\$ 12.028,00 (fev/13) + R\$ 12.028,00 (março/13) + R\$ 12.028,00 (abril/13) + R\$ 12.028,00 (maio/13), + R\$ 14.461,34 (jun/13) + R\$ 14.162,00 (jul/13) + R\$ 14.162,00 (ago/13) + R\$ 14.162,00 (set/13) + R\$ 14.162,00 (out/13) totalizando R\$ 76.730,80 (ano 2012) + **R\$ 117.101,50 (ano/2013)** – TOTAL GERAL = R\$ 193.832,30.

➤ Até hoje, ainda não foi paga a fatura referente ao mês de junho/2013.

FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6215.2541.0001

Nº DO PROCESSO: 054.001403/2011

Nº DO CONVÊNIO: 001/2012

CONVENIADO: POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DATA DE INÍCIO: 11/05/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 11/05/2014

RECURSOS: FONTES 237, 437

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO: Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 83%. Contrato em ritmo normal.

APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO



PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.2800.2541.0004 (2011) e
26.782.6215.2541.0004(2012), ETAPA 27 SAG
RA 99 - TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.0006376/2008;
113.007.804/2011
Nº DO CONVÊNIO: 002/2008
EMPRESA: BPRv (BATALHÃO DE POLÍCIA
RODOVIÁRIA) e DER/DF
DATA DE INÍCIO: 19/12/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 18/12/2013
RECURSOS: FONTES 237, 417, 437

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Delegação de competência para fiscalização de trânsito nas rodovias distritais do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, e mediante delegação de competência, nas rodovias federais, nos limites do distrito federal, propiciando a todos o direito a um trânsito em condições seguras, adotando-se todas as medidas destinadas à fluidez, conforto, defesa ambiental e à educação para o trânsito e em tudo fiscalizando o fiel cumprimento das disposições do código de trânsito brasileiro e seus regulamentos.

AVANÇO FÍSICO: Concluído os serviços de fiscalização deste convênio.

PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS

PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6215.2541.0001
Nº DO PROCESSO: 113.007.132/2008
Nº DO CONVÊNIO: 001/2010
CONVENIADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN/DF
DATA DE INÍCIO: 03/12/2010
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30 MESES,
PRORROGÁVEL POR MAIS 30 MESES.
RECURSOS: FONTES 100, 237



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: O presente Convênio tem por objetivo reduzir os níveis de acidentes nas vias urbanas e rurais do DF, tendo por objeto a delegação entre os convenientes da competência para lavratura do auto de infração de trânsito, nos limites das condições e circunstâncias fixadas neste instrumento, bem assim a cooperação mútua para a execução das seguintes atividades: Processamento de Dados, Engenharia de Tráfego, Educação no Trânsito, estatística, Monitoramento Aéreo.

AVANÇO FÍSICO: Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 83%. Contrato em ritmo normal.

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.2800.2904.0001 (2011) e
26.782.6215.2904.0001 (2012), ETAPA 29 SAG
RA 99 – TODO DF
Nº DO PROCESSO: 113.005.681/2010
Nº DO CONTRATO: 011/2011
EMPRESA: HOT COZINHA INDUSTRIAL
DATA DE INÍCIO: MARÇO/ 2011
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2014
(TERCEIRO ADITIVO)
VALOR: R\$ 152.496,00
RECURSOS: FONTE 237

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Lanche para as crianças das Escolas Públicas, que são levadas nos períodos matutino e vespertino, no Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o Trânsito, para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental.

AVANÇO FÍSICO: No mês de setembro foram atendidas 2.276 crianças na Transitolândia e 1.400 em escolas e atividades externas, sendo fornecidos 1.705 lanches e gastos R\$ 6.018,65. No mês de outubro foram atendidas pela escola 1.174 crianças e 18.204 em atividades externas, incluindo a Feira de Ciência e Tecnologia. Em outubro foram fornecidos 2.229 lanches e gastos R\$ 7.868,37. Neste bimestre (set/out) foram fornecidos o total de 3.934 lanches e gastos R\$ 13.887,02, sendo que a escola atendeu o total de 20.480 crianças.

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6215.3209.0001
Nº DO PROCESSO: 113.000.076/2013
Nº DO CONTRATO: 018/2013
EMPRESA: SITRAN-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
ELETRÔNICA LTDA
DATA DE INÍCIO: 03/06/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 11/05/2014
(PRIMEIRO ADITIVO)
VALOR: R\$ 838.882,14
RECURSOS: FONTE 237

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de sinalização para orientação de destino específica para eventos do Comitê organizador da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014.

AVANÇO FÍSICO: Avanço físico 16%. Acumulado 86%. Suspensão dos serviços: Primeiro Termo aditivo - Suspensão da execução dos serviços a partir de 12/07/2013, devendo encerrar-se em 11/05/2014 (DODF nº 157, de 01/08/2013), motivo: as rodovias DF-047; DF-003; DF-025; DF-065 e DF-480; 17 semipórticos não puderam ser instalados porque modificações estão sendo realizadas nas faixas lindeiras destas rodovias como parte de obras de adequação.

SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE TRAVESSIA DE ANIMAIS SILVESTRES



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6215.3209.0001
Nº DO PROCESSO: 113.003.307/2011
Nº DO CONTRATO: 022/2013
EMPRESA: SITRAN-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
ELETRÔNICA LTDA
DATA DE INÍCIO: 08/08/2013 (PRIMEIRO
ADITIVO)
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 05/12/2013
(PRIMEIRO ADITIVO)
VALOR: R\$ 84.476,66
RECURSOS: FONTE 237

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de sinalização de advertência de animais silvestres na DF-001 (EPCT) e BR-450/DF-003 (EPIA), em torno do Parque Nacional de Brasília (PNB).

AVANÇO FÍSICO: Já foi realizada a medição final (R\$ 70.554,18) correspondente a 83,51% do valor total do contrato. Obra concluída com 83,51% do Contrato.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VÁRIOS TRECHOS DE RODOVIAS DO SRDF



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6215.4197.0001(2012)
Nº DO PROCESSO: 113.007.600/2011
Nº DO CONTRATO: 013/2012
EMPRESA: SITRAN – COMÉRCIO E INDÚDTRIA
DE ELETRÔNICA LTDA.
DATA DE INÍCIO: 15/05/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 29/10/2013
(QUARTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 9.201.943,03 + R\$ 2.235.918,41
(SEGUNDO ADITIVO) = R\$ 11.437.861,44
RECURSOS: FONTE 237

DESCRIÇÃO DA OBRA: Sinalização Horizontal em vários trechos de rodovias do SRDF.

AVANÇO FÍSICO: Serviço Concluído. Processo encaminhado para PROJUR DER/DF para promover as medidas necessária (judiciais) para ressarcimento de valores ditos como não devidos pelo TCDF.

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6515.4198.0001
Nº DO PROCESSO: 113.004.476/2006
Nº DO CONTRATO: 020/2008
EMPRESA: SITRAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
ELETRÔNICA LTDA.
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 01/08/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 01/08/2014
(SEXTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 2.105.493,13 (INICIAL)
RECURSOS: FONTE 237

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Manutenção preventiva dos equipamentos do sistema semafórico operado pelo DER/DF. Concorrência nº 01/2007.

AVANÇO FÍSICO: Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 83%. Contrato em andamento normal.

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-095 (EPCL)



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1347.9481 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.006.748/2011
Nº DO CONTRATO: 007/2012
EMPRESA: AJL ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA.
DATA DE INÍCIO: 03/05/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/03/2013
(QUARTO ADITIVO).
VALOR: R\$ 1.643.903,83
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de Passarela em estrutura mista na Rodovia DF-095 (EPCL), Trecho DF-003(EPIA) e DF-097 (EPAC), próximo ao Ceasa.

AVANÇO FÍSICO: Obra concluída.

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-001 (EPCT),
TRECHO ENTRONC. BR-060 E A DF-075, PRÓXIMO A 1ª AVENIDA**



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1347.9481 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.005.702/2011
Nº DO CONTRATO: 008/2012
EMPRESA: RIO PLATENSE CONSTRUÇÕES,
PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 03/05/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/01/2013
VALOR: R\$ 1.218.484,17
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de Passarela em estrutura mista na Rodovia DF-001 (EPCT), Trecho: Entroncamento da BR-060 a DF-075 (EPNB), próximo à 1ª Avenida.

AVANÇO FÍSICO: Obra concluída.

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA RODOVIA DF-075 (EPNB), TRECHO ENTRE A DF-003
E A DF-079 (UPA).**



PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.6216.1347.9481
Nº DO PROCESSO: 113.007.989/2012
Nº DO CONTRATO: 020/2013
EMPRESA: RIO PLATENSE CONSTRUÇÕES,
PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 26/06/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013
VALOR: R\$ 1.898.558,31
RECURSOS: FONTE 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração projeto de construção de passarela na Rodovia DF-075 (EPNB), entroncamento com a DF-003 e a DF-079.

AVANÇO FÍSICO: Avançamos 12,5% da obra nesse bimestre. Acumulado 13,6%. Foram aprovados os projetos, executado 53% da infraestrutura (estacas), 47% da mesoestrutura (blocos) e 20% da superestrutura (forma e armação das rampas, escadas e pilares do lado A).

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA DF-001 (EPCT), TRECHO BR-060 E VC-331



PROGRAMAS DE TRABALHO:

26.782.6216.1347.9481

Nº DO PROCESSO: 113.005.703/2011

Nº DO CONTRATO: 032/2013

EMPRESA: CCL CONSTRUTORA LTDA

DATA DE INÍCIO: 03/09/2013

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 16/01/2014

VALOR: R\$ 1.148.241,80

RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de Obra de Arte Especial do tipo Passarela em estrutura mista em arco na DF-001, tr. BR-060 e VC-331/ Recanto das Emas.

AVANÇO FÍSICO: Executado 5% no bimestre. Acumulado 5%.

- Entrega dos projetos executivos;
- Sondagens;
- Início da construção do canteiro de obras;
- Observado interferência com rede elétrica da CEB.

VIADUTO ENGENHO DAS LAGES, TRECHO ENTRONC. BR-060 COM A DF-290



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.6216.1475.0011(2012)

Nº DO PROCESSO: 113.010.021/2009

Nº DO CONTRATO: 017/2012

EMPRESA: ETEC

DATA DE INÍCIO: 01/06/2012

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 28/07/2013
(QUARTO ADITIVO)

VALOR: R\$ 7.266.888,31

RECURSOS: FONTES 231, 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Viaduto do Engenho das Lages, obras de finalização de implantação do entroncamento da BR-060 com a DF-290.

AVANÇO FÍSICO: Obra concluída.

PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO: DF-410/DF-345, PLANALTINA - LOTE 1



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.0027 (2013),
Nº DO PROCESSO: 113.010.929/2011
Nº DO CONTRATO: 006/2013
EMPRESA: TRIER ENGENHARIA LTDA.
DATA DE INÍCIO: 20/03/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013
(TERCEIRO ADITIVO)
VALOR: R\$ 3.130.103,78
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Pavimentação da DF-230 no trecho compreendido entre seu entroncamento com a DF-345 até o entroncamento com a DF-410, identificado como LOTE 1 (km 10,20 ao km 13,50, da estaca 85 a estaca 250). As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização. Extensão de Pavimentação: 3.300,00 m (conforme dados do Edital de Concorrência nº 006/2012).

AVANÇO FÍSICO: Executado 40% no bimestre. Acumulado 95%. 100% da pavimentação no bimestre. Concluídos os serviços de terraplenagem e restando apenas concluir a sinalização e drenagem superficial.

PAVIMENTAÇÃO DA DF-230 TRECHO DF-410/ DF-345 PLANALTINA- LOTE 2



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.0027(2013) ,
Nº DO PROCESSO: 113.000.768/2013
Nº DO CONTRATO: 007/2013
EMPRESA: TRIER ENGENHARIA LTDA .
DATA DE INÍCIO: 20/03/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013
(TERCEIRO ADITIVO)
VALOR: R\$ 6.132.454,62
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Pavimentação da DF-230 no trecho compreendido entre seu entroncamento com a DF-345 até o entroncamento com a DF-410, identificado como LOTE 2 (km. 13,50 ao km. 19,10), até o asfalto existente (da estaca 250 a estaca 530). As obras previstas englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização. Extensão de Pavimentação: 5.600,00 m. (Conforme dados do Edital de Concorrência nº 006/2012).

AVANÇO FÍSICO: Executado 23% no bimestre. 90% da pavimentação, restando apenas a conclusão da sinalização, obras de arte corrente.

CONSTRUÇÃO DE ACESSO (AGULHA) à DF-003 (EPIA), TRECHO DF-095/DF-010, COM IMPLANTAÇÃO DE BAIA DE PARADA DE ÔNIBUS E REMANEJAMENTO DO ABRIGO EXISTENTE.




PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.1199 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.010.786/2010
Nº DO CONTRATO: 028/2012
EMPRESA: CRC – CONSTRUTORA RODRIGUES CAMPOS LTDA
DATA DE INÍCIO: 09/08/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/09/2013 (QUARTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 199.873,17
RECURSOS: FONTE 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de acesso (Agulha) à DF-003 (EPIA), trecho DF-095/DF-010, com implantação de baia de parada de ônibus e remanejamento do abrigo existente.

AVANÇO FÍSICO: Obra concluída.

DUPLICAÇÃO DA DF-451

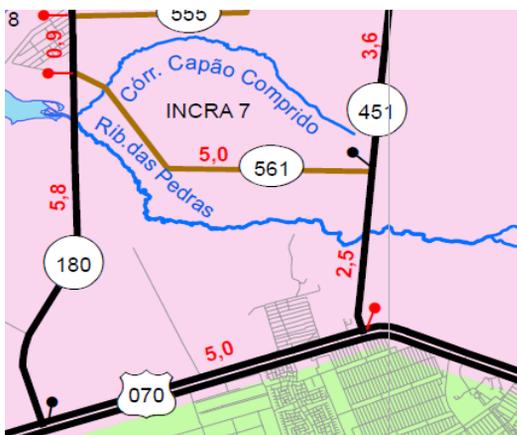

PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.1199
Nº DO PROCESSO: 113.000.292/2013
Nº DO CONTRATO: 017/2013
EMPRESA: GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
DATA DE INÍCIO: 07/05/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013 (SEGUNDO ADITIVO)
VALOR: R\$ 1.588.056,20
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Duplicação de 1,39 km da Rodovia DF-451, no trecho compreendido do entroncamento da Rodovia BR-070 ao entroncamento da Rodovia Vicinal - VC-561. Concorrência nº 001/2013.

AVANÇO FÍSICO: Executado 28% no bimestre. Acumulado 70%. Foram feitos os serviços de:

- Terraplenagem;
- Drenagem profunda;
- Drenagem superficial;
- Pavimentação.

PAVIMENTAÇÃO VIA DE ACESSO A VILA BASEVI E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA.



PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.4734 (2012)
26.782.6216.1475.1199 (2013)
Nº DO PROCESSO: 113.009.410/2009
Nº DO CONTRATO: 061/2012 - DIVAL ENGENHARIA LTDA (CANCELADO)
NOVO CONTRATO: 023/2013 - SETA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E ADMINISTRAÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 12/07/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/01/2014
VALOR: R\$ 1.732.147,49 + 413.252,53 (SEGUNDO ADITIVO)
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Pavimentação via de acesso a Vila Basevi e implantação de ciclovia. Concorrência Nº 003/2012. Rescindido o contrato 061/2012 e a empresa SETA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TERRAPLENAGEM E ADMINISTRAÇÃO LTDA assumiu o serviço. Foi publicado um novo contrato – 023/2013.

AVANÇO FÍSICO: Executado 13% no bimestre. Acumulado 98%.

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.4195.0001
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.000.727/2012
Nº DO CONTRATO: 023/2012
EMPRESA: G. B. DA SILVA EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO- EPP
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/07/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2013
VALOR: R\$ 222.949,00
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Fornecimento de Asfalto diluído CM-30.

AVANÇO FÍSICO: Contrato concluído.

RESTAURAÇÃO DA DF-345




PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.3515
Nº DO PROCESSO: 113.008.569/2012
Nº DO CONTRATO: 035/2013
EMPRESA: JM TERRAPLENAGEM E
CONSTRUÇÕES LTDA
DATA DE INÍCIO: 11/10/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 180 DIAS
VALOR: R\$ 6.823.971,05
RECURSOS: FONTE 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da DF-345 e implantação das interseções desta com as rodovias DF-205 e VC-111 no trecho compreendido do entroncamento com a BR-010 (A)/Divisa GO/DF ao entroncamento com a BR-020, com extensão de 11 km.

AVANÇO FÍSICO: Não houve avanço físico neste bimestre.

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 1

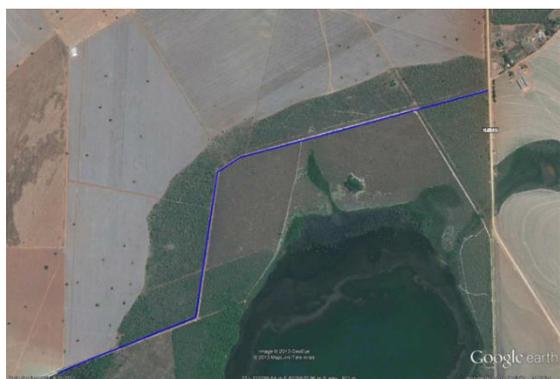

PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.005.389/2011
Nº DO CONTRATO: 053/2012
EMPRESA: JM TERRAPLENAGEM E
CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 16/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/01/2014
(QUINTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 2.687.681,33
RECURSOS: FONTE 148

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF-355 no trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Entroncamento da DF-120 (estaca 0) até a estaca 3 + 480 - Lote 1.

AVANÇO FÍSICO: Executado 5% no bimestre. Acumulado 90%.

- Inicialização e conclusão do serviço de imprimação e pintura de ligação.
- Conclusão do serviço de capa asfáltica.

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 2



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.001.123/2013
(PROC. ORIGINAL 113.005.389/2011)
Nº DO CONTRATO: 053/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E
CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 16/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/01/2014
(QUINTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 2.604.238,43
RECURSOS: FONTE 148

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF-355 no trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Entroncamento da estaca 3 + 480 até a estaca 6+960 – Lote 2.

AVANÇO FÍSICO: Executado 7% no bimestre. Acumulado 82%.

- Conclusão do serviço de base em brita graduada;
- Conclusão do serviço de drenagem
- Inicialização do serviço de imprimação;
- Inicialização do serviço de capa asfáltica.

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 3



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.001.124/2013
(PROC. ORIGINAL 113.005.389/2011)
Nº DO CONTRATO: 053/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E
CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 16/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013
(TERCEIRO ADITIVO)
VALOR: R\$ 2.560.770,55
RECURSOS: FONTE 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF-355 no trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Entroncamento da estaca 6 + 960 até a estaca 10 + 440 – Lote 3.

AVANÇO FÍSICO: Avanço 20%. Acumulado 95%. Executado os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes e imprimação.

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF-355, LOTE 4



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.001.125/2013
(PROC. ORIGINAL 113.005.389/2011)
Nº DO CONTRATO: 053/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E
CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 16/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013
(TERCEIRO ADITIVO)
VALOR: R\$ 2.658.283,00
RECURSOS: FONTE 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF-355 no trecho compreendido entre o entroncamento da DF-120 com a DF-320. Entroncamento da estaca 10 + 440 até o entroncamento com a DF-320 – Lote 4.

AVANÇO FÍSICO: Executado 30%. Acumulado 95%. Executado os serviços de terraplenagem; pavimentação, drenagem, obras de arte correntes e imprimação.

EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL DO TIPO PONTE EM TRECHO DA DF – 355.



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.004.242/2010
Nº DO CONTRATO: 056/2012
EMPRESA: LAJE ENGENHARIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 23/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/08/2013
(SEGUNDO ADITIVO)
VALOR: R\$ 1.272.771,83
RECURSOS: FONTES 348 E 148

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração de Projeto Executivo e a Construção de uma Obra de Arte Especial, do tipo Ponte, sobre o Córrego Jardim na DF- 355.

AVANÇO FÍSICO: Obra concluída.

RECUPERAÇÃO DA PISTA DO BALÃO DO COLORADO E IMPLANTAÇÃO DA FAIXA DE ACELERAÇÃO NA RODOVIA BR-450/DF-003 (EPIA)




PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.8121 (2012) ,
Nº DO PROCESSO: 113.008.571/2011
Nº DO CONTRATO: 003/2012
EMPRESA: CONSORCIO RV-CONVAP- ARP
DATA DE INÍCIO: 11/04/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013
(8º ADITIVO)
VALOR: R\$ 5.616.681,44 (10º ADITIVO)
RECURSOS: FONTES 231, 148, 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução das obras de recuperação da pista do Balão do Colorado, implantação da faixa de aceleração na rodovia BR-450/DF-003 (EPIA) e a realização dos serviços complementares na DF-150, inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente.

AVANÇO FÍSICO: Executado 0% no bimestre. Acumulado 60%. Foi autorizado pelos Órgãos competentes o uso de explosivos para o início da execução da galeria de águas pluviais na escavação de MAT. 3ª CAT. no túnel N.A.T.M., localizado no Balão do Grande Colorado.

RESTAURAÇÃO DA DF-180, TRECHO: BR-060 A BR-070, LOTE 01

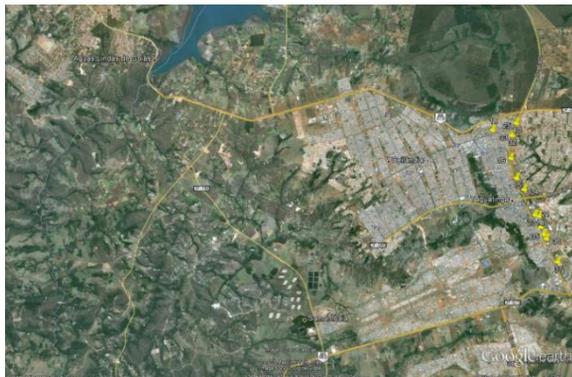

PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1689.0005 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.792/2011
Nº DO CONTRATO: 058/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E
CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 13/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013
(SEGUNDO ADITIVO)
VALOR: R\$ 2.335.435,89
RECURSOS: FONTE 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da rodovia DF-180 no trecho compreendido do seu entroncamento com a BR-070/DF-190, identificado como Lote 01. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO: Executado 25,85% no bimestre. Acumulado 91%. Continuação dos serviços de fresagem, terraplenagem, pavimentação e drenagem.

RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF-180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO DF-190/VC-311, LOTE 02



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1689.0005 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.804/2013
Nº DO CONTRATO: 059/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E
CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 13/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013
(SEGUNDO ADITIVO)
VALOR: R\$ 3.860.417,26
RECURSOS: FONTE: 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da Rodovia DF-180, compreendido do sub-trecho DF-190 até a VC 311, identificado como Lote 02. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO: Execução 25% no bimestre. Acumulado 95%. Continuação dos serviços de fresagem, terraplenagem, pavimentação e drenagem.

RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF-180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO VC-311/BR-060, LOTE 03




PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1689.0005 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.805/2013
Nº DO CONTRATO: 060/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E
CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 13/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: SUSPENSO
ATÉ 08/11/2013 (SEGUNDO ADITIVO)
VALOR: R\$ 3.106.491,96
RECURSOS: FONTE: 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da rodovia DF-180 compreendido entre o sub-trecho da VC-311 até seu entroncamento com a BR- 060, identificado como Lote 03. As obras englobam os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO: Será solicitado aditivo de prazo a partir de 08/11/2013 para o término do serviço.

PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF ANEL VIÁRIO – ESTUDO EVTEA/EIA/RIMA

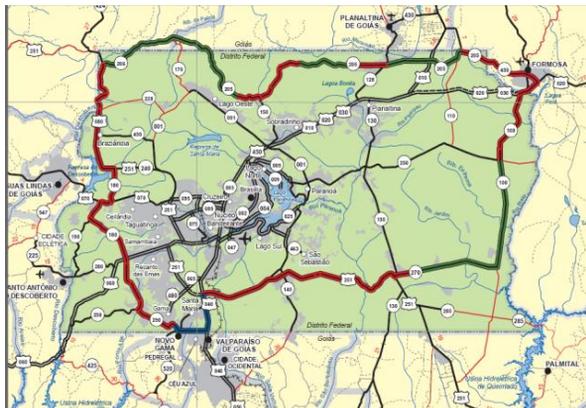

PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.2800.3550.0001 (2011) e
26.782.6216.1968.0013(2012), ETAPA 66 SAG
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.002.321/2008
Nº DO CONTRATO: 040/2008
EMPRESA: STRATA ENGENHARIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 05/11/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/10/2012
VALOR: R\$ 7.290.752,11
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços de elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Estudos de Impacto Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA e dos Projetos Executivos de Engenharia das Rodovias integrantes do Anel Viário do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO: Por decisão do Diretor Geral, após ouvidas as áreas técnicas e o parecer do Sr. Procurador do DER, às folhas 1709 e 1710 dos autos do processo, o presente contrato será considerado expirado.

PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA DF-131




PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1968.0013 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.011.685/2011
Nº DO CONTRATO: 034/2012
EMPRESA: EXTREMA CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 25/09/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2013
(TERCEIRO ADITIVO)
VALOR: R\$ 489.159,33
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Projeto de Engenharia para Pavimentação da DF- 131.

AVANÇO FÍSICO: Projeto concluído.

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE EIA/RIMA, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS ENTRE AS CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E PLANO PILOTO – CORREDOR EIXO NORTE.

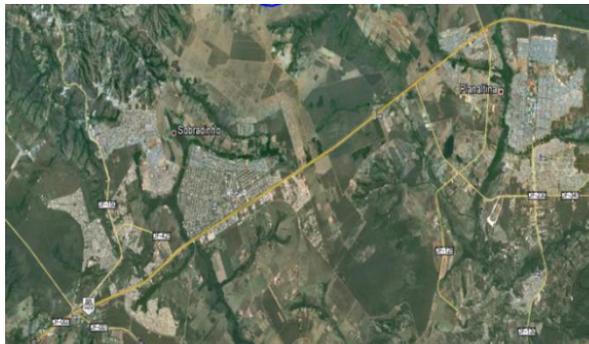

PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1968.0013 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.340/2011
Nº DO CONTRATO: 063/2012
EMPRESA: CONSÓRCIO DF INTERLIGADO
DATA DE INÍCIO: 26/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2014
VALOR: R\$ 12.251.695,70
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Projeto Executivo de Engenharia e de EIA/RIMA, destinados à implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto – Corredor Eixo Norte.

AVANÇO FÍSICO: Executado 18,72 no bimestre. Acumulado 53,44%.

Etapas realizadas: Projeto Básico Geométrico (3,77%); Projeto Básico de Terraplenagem (0,91%); Projeto Básico de OAE (3,81%); Projeto Básico de Drenagem (1,35%); Projeto Básico de Pavimentação (0,61%); Projeto Básico de Obras Complementares (0,67%); Projeto Básico de Paisagismo (0,66%); Projeto Básico de estações, terminais e Garagens (3,83%); Projeto Básico de Desapropriação (0,93%); Projeto Básico de Interferência (0,91%); Projeto Básico de ITS (1,27%)

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EIA/RIMA, DESTINADO AO CORREDOR EIXO SUDOESTE.



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1968.0013
Nº DO PROCESSO: 113.001.608/2013
Nº DO CONTRATO: 036/2013
EMPRESA: ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A
DATA DE INÍCIO: 17/10/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 15 MESES
VALOR: R\$ 9.681.024,81
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração de projeto executivo de engenharia e EIA/RIMA, destinado a implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Taguatinga, Núcleo Bandeirantes e o Plano Piloto – Corredor Eixo Sudoeste.

AVANÇO FÍSICO: Não teve avanço no 5º bimestre.

EXECUÇÃO DA OBRA DE AUMENTO DE CAPACIDADE E MELHORAMENTOS NA RODOVIA DF- 047 (EPAR)



PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.6216.3207.0001 (2012)
28.782.6216.3207.0004 (2013)
Nº DO PROCESSO: 113.005.351/2011
Nº DO CONTRATO: 062/2012
EMPRESA: CONSÓRCIO EPAR
(TRIER/GEOSONDA/IQS)
DATA DE INÍCIO: 26/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2014
VALOR: R\$ 43.400.987,10
RECURSOS: FONTES 100, 148, 348

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução da obra de aumento de capacidade e melhoramento na Rodovia DF-047 (EPAR). As obras englobam os serviços de terraplanagem, pavimentação rígida e flexível, drenagem, sinalização, contenção de taludes, obras de arte especiais, obras complementares e de recuperação do meio ambiente.

AVANÇO FÍSICO: Executado 20% no bimestre. Acumulado 50%. Serviços concentrados na trincheira:

- Parede diafragma;
- Escavação e transporte;
- Execução de tirantes;
- Drenagem das marginais (abertura dos PV's e boca de lobo).

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.4195.0001
Nº DO PROCESSO: 113.007.966/2012
Nº DO CONTRATO: 005/2013
EMPRESA: PETROENGE ENGENHARIA S/A
DATA DE INÍCIO: 19/03/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 18/03/2014
VALOR: R\$ 951.500,00
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Fornecimento parcelado de 5.298 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ.

AVANÇO FÍSICO: O contrato já teve cumprido 100% do fornecimento previsto, no entanto, foi solicitado um aditivo de 25%.

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.4195.0001
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.000.727/2012
Nº DO CONTRATO: 025/2012
EMPRESA: DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE
ASFALTOS S/A
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/07/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2014
(PRIMEIRO ADITIVO)
VALOR: R\$ 192.000,00
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C.

AVANÇO FÍSICO: Fornecimento de 0% de asfalto diluído RM-1C no bimestre.

PAVIMENTAÇÃO VC-533, LIGAÇÃO DE BRAZLÂNDIA A PADRE LÚCIO



PROGRAMAS DE TRABALHO:
28.782.6216.1460.4733
Nº DO PROCESSO: 113.005.439/2012
Nº DO CONTRATO: 039/2013
EMPRESA: NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA
DATA DE INÍCIO: 22/11/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 150 DIAS
VALOR: R\$ 5.405.070,4
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de obras para pavimentação de toda a extensão da rodovia vicinal VC-533, além de implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre o seu entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF/180 e a divisa com estado do Goiás (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio). Cc nº 05/2013.

AVANÇO FÍSICO:

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/ RIMA) PARA O TREVO DE TRIAGEM NORTE (TTN)



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.3711.6161 (PRIMEIRO ADITIVO)
Nº DO PROCESSO: 113.005.275/2012
Nº DO CONTRATO: 033/2012
EMPRESA: HIDROLÓGICA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 17/09/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: SUSPENSO ATÉ 20/11/2013 (QUINTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 143.840,94
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: EIA/ RIMA para o Trevo de Triagem Norte (DF-002 – Eixo Norte / DF-007 (EPTT) – Ponte do Braghetto).

AVANÇO FÍSICO: Serviço concluído. Contrato suspenso a partir de 22/08/2013, devendo encerrar o prazo de suspensão em 20/11/2013 (DODF nº 191, de 13/09/2013).

ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO TRECHO DA DF-355




PROGRAMA DE TRABALHO:
26.205.26.782.6216.3711.6161
Nº DO PROCESSO: 113.008.887/2012
Nº DO CONTRATO: 009/2013
EMPRESA: ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 25/03/2013
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: SUSPENSO A PARTIR DE 06/09/2013 (QUARTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 124.937,18
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração dos Planos de Controle Ambiental relativos à obra de pavimentação da rodovia DF-355, no trecho compreendido entre a DF-120 e a DF-320 e a obra de pavimentação da Via de Ligação entre a DF-001 (EPCT) e a Vila Basevi, conforme especificações nos anexos do Edital.

AVANÇO FÍSICO: Executado 10% no bimestre. Os produtos 1 e 2 (versões preliminares dos estudos ambientais) já foram entregues pela empresa contratada. Os dois produtos já foram remetido ao IBRAM para análise. Até o momento não houve resposta quanto a aceitação dos mesmos. A elaboração dos produtos finais pela empresa somente é possível após a manifestação do órgão ambiental (IBRAM). Contrato suspenso.

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF

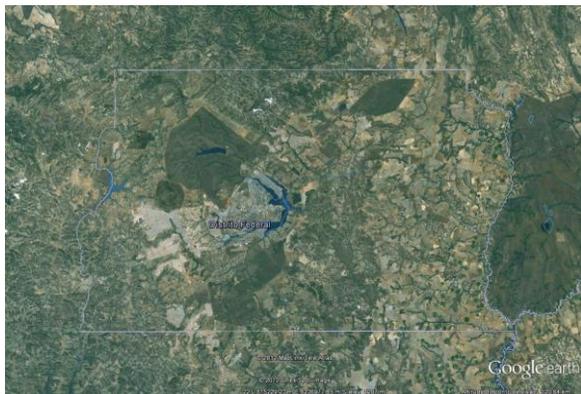

PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.3711.6162 (2013)
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.005.428/2006
Nº DO CONTRATO: 002/2010
FIRMA: GEO-LÓGICA CONSULTORIA
AMBIENTAL
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 19/02/2010
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 28/02/2014
(SEXTO ADITIVO)
VALOR: R\$ 1.303.632,37
RECURSOS: FONTE 237

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central (DF e Goiás).

AVANÇO FÍSICO: Executado 10% no bimestre. Acumulado 70%.

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.4195.0001
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.000.727/2012
Nº DO CONTRATO: 024/2012
EMPRESA: CENTRO OESTE ASFALTO LTDA
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/07/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2014
(PRIMEIRO ADITIVO)
VALOR: R\$ 77.899,80
RECURSOS: FONTE 100

DESCRIÇÃO DA OBRA: Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C.

AVANÇO FÍSICO: Fornecimento de 3,3% de asfalto diluído RR-2C no bimestre.
