




Relatório de Acompanhamento Governamental – 2º Bimestre/2015

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO

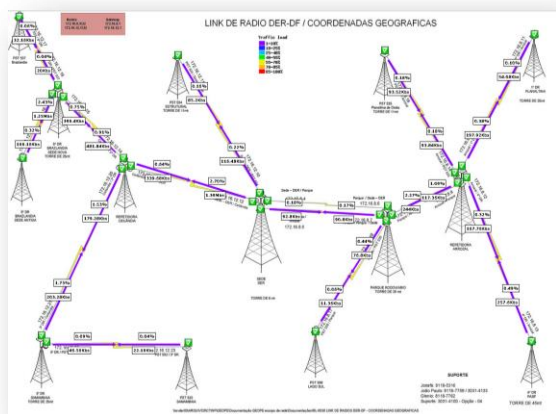

Programas de Trabalho:

26.122.2800.8517.0014 (2011)

26.122.6010.2557.2569 (2013/2014)

Etapa 6 SAG 2015

Nº do Processo: 113.000.559/2011

Nº do Contrato: 025/2011

Empresa: Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda.

Data de início: 21/11/2011

Data prevista de conclusão: 20/11/2015

(Quarto Aditivo)

Valor: R\$ 306.175,68 (Quarto Aditivo)

Recurso: Fonte 100

Executor: Thiago Vinícius de Melo Almeida

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços especializados de engenharia, contemplando a manutenção de sistema de comunicação de dados com todos os equipamentos de infraestrutura e serviços necessários para interligação das Unidades que compõem o complexo administrativo do DER/DF e BPRv (Batalhão de Policiamento Rodoviário). Farão parte da prestação dos serviços a manutenção, inspeção periódica dos rádios e switches e manutenção das torres de comunicação de micro-ondas que interligam os 5 Distritos Rodoviários e os postos do BPRv com a sede do Órgão.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Ordens de serviço do Mês de Janeiro:

- 1428- Repetidora Ceilândia; 1429-Antena repetidora de Ceilândia; 1434-Antena 5º DR; 1439-Antena 5º DR (sede nova); 1447- Antena arrozal; 1448- 5º DR; 1450- 3º DR.

Ordens de serviço do Mês de Fevereiro:

- 1455-Link de rádio do 1º e 4º DR com problema; 1456- Arrozal; 1457-4º DR; 1458-Repetidora da Ceilândia com problema; 1459-Antenas sede/3º e 5º DR com problema; 1460-Antenas repetidora de Ceilândia com falhas; 1461-Link de rádio do parque arrozal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

Prestação de serviços dentro da normalidade.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%
---	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO



Programa de Trabalho:
26.782.6215.2460.0001(2012)
Etapa 23 SAG 2014/ Etapa 10 SAG 2015
Nº do Processo: 113.008.698/2011
Contrato: 027/2011
Empresa: Gráfica e Editora Movimento
Data de Início: 19/12/2011
Data prevista de conclusão: 18/12/2015
(Terceiro aditivo)
Valor Inicial: R\$ 2.226.178,16 (Quarto Aditivo)
Recurso: Fonte 237
Executora: Eliane Cavalcante Santos


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços gráficos e diagramação de campanhas educativas de trânsito e meio ambiente, por meio de confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços gráficos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:


Neste bimestre foram gastos com material educativo R\$ 116.731,30. A Campanha de Carnaval alcançou 91.000 motoristas e 4.500 ciclistas, totalizando 95.500 abordagens.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

Neste bimestre foram gastos com material educativo R\$ 32.583,40 nas Campanhas “Volta às Aulas”, “Aniversário da Faixa de Pedestres” e “Aniversário de Brasília”. Foram alcançadas o total de 37.278 pessoas, entre crianças e adultos.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída



Programa de Trabalho:
26.782.6215.2541.0001
Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015
Nº do Processo: 113.001.225/2008
Nº do Contrato: 028/2011
Empresa: Engebrás S/A Indústria, Comércio e
Tecnologia de Informática
Data de Início: 23/12/2011
Data prevista de conclusão: 23/12/2016
(Quinto Aditivo)
Valor: R\$ 21.979.430,01 (Quinto Aditivo)
Recurso: Fonte 237
Executor: Eng.º Murilo de Melo Santos

DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO: Monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 16,6%. Contrato em ritmo normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:
Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 33,2%. Contrato em ritmo normal.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	16,6%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	33,2%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 25 SAG 2014/ Etapa 12 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.003.563/2014
 Nº do Contrato: 060/2014
 Empresa: Lig Móvil Telecomunicações Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 29/09/2014
 Data prevista de conclusão: 28/09/2015
 Valor dos Serviços: R\$ 1.146.696,00
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Leandro Freitas Silva

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de serviço móvel especializado (SME) do tipo sistema troncalizado digital tecnologia tetra para locação de equipamentos para Gerência de Controle Operacional da Diretoria de Fiscalização de Trânsito da Superintendência de Trânsito do DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Foi pago R\$ 93.086,00 (locação Jan/15). Total Geral pago = R\$ 308.922,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

Prestação de serviços dentro da normalidade.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS



DETRAN-DF

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO DISTRITO FEDERAL



Programa de Trabalho:

26.782.6215.2541.0001

Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015

Nº do Processo: 113.007.132/2008

Nº do Convênio: 001/2010

Conveniado: Departamento de Trânsito do
Distrito Federal - DETRAN/DF

Data de Início: 03/12/2010

Data prevista de conclusão: 23/05/2015
(Quinto Aditivo)

Recurso: Fontes 100, 237

Executor: Engº Murilo de Melo Santos

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: O presente Convênio tem por objetivo reduzir os níveis de acidentes nas vias urbanas e rurais do DF, tendo por objeto a delegação entre os convenientes da competência para lavratura do auto de infração de trânsito, nos limites das condições e circunstâncias fixadas neste instrumento, bem assim a cooperação mútua para a execução das seguintes atividades: Processamento de Dados, Engenharia de Tráfego, Educação no Trânsito, estatística, Monitoramento Aéreo.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 16,6%. Contrato em ritmo normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 33,2%. Contrato em ritmo normal.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
16,6%	16,6%	%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
16,6%	33,2%	%	%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SITEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001
 Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015
 Nº do Processo: 054.001.403/2011
 Nº do Convênio: 001/2012
 Conveniado: Polícia Militar do Distrito Federal
 Data de Início: 11/05/2012
 Data prevista de conclusão: 21/05/2017
 Recurso: Fontes 237, 437
 Executor: Engº Murilo de Melo Santos

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 16,6%. Contrato em ritmo normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:


Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 33,2%. Contrato em ritmo normal.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
16,6%	16,6%	%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
16,6%	33,2%	%	%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SERVIÇO INTEGRADO MÓVEL PARA GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE



Programa de Trabalho:

26.782.6215.2541.0001

Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015

Nº do Processo: 113.011.356/2013

Nº do Contrato: 014/2014

Empresa: TNL PCS S/A

Data da Assinatura do Contrato: 28/03/2014

Data prevista de conclusão: 28/03/2015

Valor inicial: R\$ 976.440,00

Recurso: Fonte 237

Executor: Graziela de Sousa Portela

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Serviço Integrado Móvel para Gestão de Trânsito e Mobilidade – SIMGTM, incluindo serviços de instalação, suporte técnico e repasse de conhecimentos para atender a necessidade do DER/DF. Equipamento do tipo celular que utiliza rede de telefonia e de internet para comunicação interna, consulta de veículo e habilitação, registro de infrações de trânsito (on line), registro de ocorrência de acidente de trânsito, emissão de ficha de missão e relatórios voltados para a fiscalização de trânsito e demais funções afins à autarquia.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:



Janeiro – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

Fevereiro – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

Março – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

Abril – Prestação dos serviços dentro da normalidade.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MONITORAMENTO E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO



Programa de Trabalho:

26.782.6215.2541.0001

Etapa 24 SAG 2014/ Etapa 11 SAG 2015

Nº do Processo: 113.001.811/2009

Nº do Contrato: 041/2014

Empresa: Eliseu Kopp & Cia. Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2014

Data prevista de conclusão: 24/12/2016

Valor inicial: R\$ 6.445.569,64

Recurso: Fonte 237

Executor: Engº Darione José Maria Cavalcanti de Oliveira

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços de monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos instalados em pontos definidos no Edital da Concorrência nº 008/2010. Complementarmente, deverão ser elaborados inventários, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos, com expedição concomitante de relatório individual para emissão de autos de infração e notificação, utilizando medidores eletrônicos de velocidade fixos de operação autônoma.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Os trinta equipamentos instalados estão em operação.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

Andamento normal.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programas de Trabalho:
 26.782.2800.2904.0001 (2011) e
 26.782.6215.2904.0001 (2012),
 Etapa 27 SAG 2014/ Etapa 14 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.005.681/2010
 Nº do Contrato: 011/2011
 Empresa: Hot Cozinha Industrial
 Data de Início: Março/ 2011
 Data prevista de conclusão: 31/05/2015
 (Quarto Aditivo)
 Valor: R\$ 166.658,02 (Quarto Aditivo)
 Recursos: Fonte 237
 Executora: Eliane Cavalcante Santos

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Lanche para as crianças das Escolas Públicas, que são levadas nos períodos matutino e vespertino, no Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o Trânsito, para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Não houve aula nas dependências devido às férias escolares.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:
 Neste bimestre houve o pagamento no valor de R\$ 384,77 à empresa contratada.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%
---	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2904.0001
 Etapa 27 SAG 2014/ Etapa 14 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.012.201/2013
 Nº do Contrato: 012/2014
 Empresa: Travel Bus Ltda. - Me
 Data de Início: 24/03/2014
 Data prevista de conclusão: 23/03/2016
 (Primeiro Aditivo)
 Valor: R\$ 626.740,35 (Primeiro Aditivo)
 Recurso: Fonte 237
 Executora: Eliane Cavalcante dos Santos

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviço de transporte de crianças a serem atendidas pela Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia) do DER-DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Neste bimestre não houve utilização do serviço com transporte de crianças à Transitolândia.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

Neste 2º bimestre não houve pagamento para empresa contratada.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%
---	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO DO DER-DF



Programa de Trabalho:
 26.782.6515.4198.0001
 Etapa 31 SAG 2014/ Etapa 13 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.006.446/2014
 Nº do Contrato Emergencial: 053/2014
 Empresa: Sitran - Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
 Data de Início: 02/08/2014
 Data prevista de conclusão: 02/02/2015
 Valor: R\$ 616.088,04
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Engº Carlos Alberto Mundim Pena

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico do DER-DF, instalados em diversos pontos do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:
 Executado 30% no bimestre. Acumulado 80%. Serviço de natureza contínua.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 20%. Acumulado 100%. Conclusão dos serviços.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
20%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

100%	%	%	%	%	%
------	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO DO DER-DF



Programa de Trabalho:
 26.782.6515.4198.0001
 Etapa 13 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.000.631/2015
 Nº do Contrato Emergencial: 001/2015
 Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
 Data da Assinatura do contrato: 02/03/2015
 Data prevista de conclusão: 28/08/2015
 Valor: R\$ 616.088,04
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Engº Carlos Alberto Mundim Pena

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico do DER-DF, instalados em diversos pontos do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE PAINÉIS DE MENSAGENS MÓVEIS



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 25 SAG 2014/ Etapa 12 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.009.643/2013
 Nº do Contrato: 066/2014
 Empresa: Talentech-Tecnologia Ltda.
 Data de Início: 15/12/2014
 Data prevista de conclusão: 15/12/2015
 Valor: R\$ 3.081.600,00
 Recurso: Fonte 237 e/ou 437 (Primeiro Aditivo)
 Executora: Tainá de Aguiar Botelho

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento, implantação, manutenção e suporte técnico de painéis de mensagens variáveis e sistema de informação e orientação aos usuários, em tempo real e repasse de conhecimento para atender às necessidades do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 0%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:
 O início da operação foi em 23/03/2015. Quantidade de equipamentos operando: 10 painéis.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%
---	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

FORNECIMENTO, ATERRAMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO NO-BREAK




Programa de Trabalho:
 26.782.6515.4198.0001 - Etapa 31 SAG 2014
 26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 12 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.007.053/2013
 Nº do Contrato: 067/2014
 Empresa: Sitran - Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
 Data de Início: 06/02/2015
 Data prevista de conclusão: Paralisado até 16/05/2015 (Segundo Aditivo)
 Valor: R\$ 160.000,00
 Recurso: Fonte 237/437
 Executora: Tainá de Aguiar Botelho

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento, aterramento e instalação de 20 equipamentos do tipo no-break, destinados a atender os cruzamentos semaforicos em vias urbanas do DF, incluindo o fornecimento de mão-de-obra e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 0%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

PAVIMENTAÇÃO VC-533, LIGAÇÃO DE BRAZLÂNDIA A PADRE LÚCIO



Programa de Trabalho:

28.782.6216.1475.1199

Etapa 86 SAG 2014/ Etapa 30 SAG 2015

Nº do Processo: 113.005.439/2012

Nº do Contrato: 039/2013

Empresa: NG Engenharia e Construções Ltda.

Data da assinatura do contrato: 22/11/2013

Data prevista de conclusão: 30/06/2015

(Terceiro Aditivo)

Valor: R\$ 5.405.070,40 + R\$ 1.299.126,98= R\$

6.704.197,38 (Quarto Aditivo)

Recurso: Fonte 100, 135 (Terceiro Aditivo)

Executor: Engº Antônio Gomes da Silva Filho


DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de obras para pavimentação de toda a extensão da rodovia vicinal VC-533, além de implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre o seu entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF/180 e a divisa com estado do Goiás (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio). Extensão de 3,852 km. Cc nº 005/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 20%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 20%.




Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

DUPLICAÇÃO DA DF-463

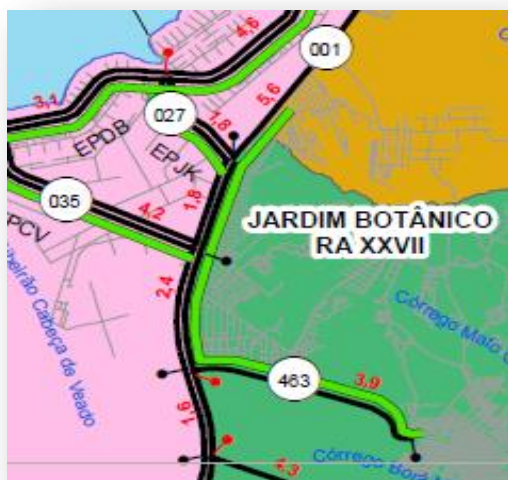

Programa de Trabalho:

26.782.6216.1475.1199

Etapa 82 SAG 2014/ Etapa 28 SAG 2015

Nº do Processo: 113.005.051/2010

Nº do Contrato: 043/2014

Empresa: Serterra Transportes Escavações
Terraplenagem e Pavimentação Ltda.

Data do Início: 10/07/2014

Data prevista de conclusão: Paralisado até
30/04/2015 (Quarto Aditivo)

Valor: R\$ 6.785.814,41

Recurso: Fonte 100

Executor: Engº Guilherme José da Fonseca
Berniz

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução das obras de duplicação da rodovia DF-463, adequação da rodovia e acessos aos Setores Habitacionais Mangueiral e Jardim Botânico. Extensão de 3,9 km. Cc nº 001/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
Executado 0% no bimestre. Acumulado 17,35%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:
Executado 0% no bimestre. Acumulado 17,35%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
17,35%	17,35%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

IMPLANTAÇÃO DA MARGINAL DA DF-480



Programa de Trabalho:
26.782.6216.1475.1199
Etapa 83 SAG 2014/ Etapa 29 SAG 2015
Nº do Processo: 113.001.927/2014
Nº do Contrato: 046/2014
Empresa: GW Construções e Incorporações Ltda.
Data da Assinatura do Contrato: 22/07/2014
Data prevista de conclusão: Paralisada até 02/05/2015 (Terceiro Aditivo)
Valor inicial: R\$ 4.459.511,78
Recurso: Fonte 100
Executor: Engº Eli Câmara



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução das obras de implantação da marginal da rodovia DF-480, trecho entre a DF-001 e a UNB, com extensão de 6.000,24 m, compreendendo eixo principal e acessos. Cc nº 003/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 25%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 25%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SERVIÇOS DE SONDAGEM NAS RODOVIAS DF-001, DF-095, VC-533 E DF-047



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1475.1199 (2014)
 26.782.6216.4195.0001 (Primeiro Aditivo)
 Nº do Processo: 113.006.645/2014
 Nº do Contrato: 065/2014
 Empresa: Evolução Engenharia, Construção e Administração Ltda. - EPP
 Data da Assinatura do Contrato: 04/12/2014
 Data prevista de conclusão:
 Valor inicial: R\$ 20.495,90
 Recurso: Fonte 100, 220, 420 (Primeiro Aditivo)
 Executor: Willkerson Victor da Silva

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução de sondagem na Rodovia DF-001, DF-095 e VC -533, no trecho: nas proximidades da Escola Fazendária(ESAF), Posto BPRv e Ponte Córrego Monjolo, respectivamente, e DF-047, no trecho: entre a intersecção das rodovias DF-025 (EPDB) com a DF-047 (EPAR) e a ponte no córrego Riacho Fundo (sentido Brasília/Aeroporto/Brasília) tudo conforme especificações nos anexos do Convite nº 01/2014.


AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE EIA/RIMA, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS ENTRE AS CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E PLANO PILOTO – CORREDOR EIXO NORTE.

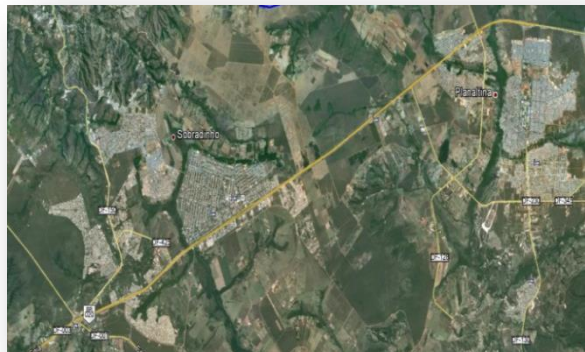

Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1968.0013 (2012)
 Etapa 42 SAG 2014/ Etapa 31 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.009.340/2011
 Nº do Contrato: 063/2012
 Empresa: Consórcio DF Interligado
 Data de Início: 26/11/2012
 Data prevista de conclusão: 30/06/2015
 (Quarto Aditivo)
 Valor: R\$ 12.251.695,70 + R\$ 233.714,04
 (Terceiro Aditivo)
 Recurso: Fonte 100, 135 (Quarto Aditivo)
 Executor: Eng.º Samuel Dias Júnior
 (Instrução de Serviço de 24/12/14)

DESCRIÇÃO DA OBRA: Projeto Executivo de Engenharia e de EIA/RIMA, destinados à implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto – Corredor Eixo Norte.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 83,24%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 83,24%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
83,24%	83,24%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EIA/RIMA, DESTINADO AO CORREDOR EIXO SUDOESTE.



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1968.0013
 Etapa 72 SAG 2014/ Etapa 32 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.001.608/2013
 Nº do Contrato: 036/2013
 Empresa: ITEC Infra Tech Engenharia e Consultoria S.A
 Data da assinatura: 17/10/2013
 Data prevista de conclusão: 29/09/2015
 (Quinto Aditivo)
 Valor: R\$ 9.681.024,81
 Recurso: Fontes 100, 235 (Primeiro Aditivo), 135 (Segundo Aditivo)
 Executores: Paula Ferri Paixão, Wilson Eulálio Porto, Samuel Dias Júnior, Luciano dos Santos
 (Instrução de Serviço de 19/08/2014)

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração de projeto executivo de engenharia e EIA/RIMA, destinado a implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Taguatinga, Núcleo Bandeirantes e o Plano Piloto – Corredor Eixo Sudoeste.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 58,48%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 58,48%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	0%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral


1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
58,48%	58,48%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

22

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DA DF-250

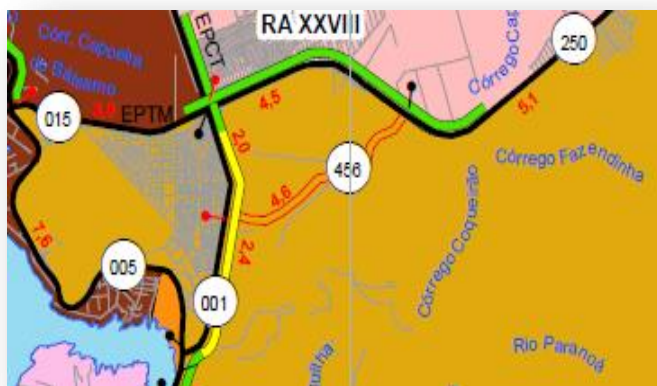

Programa de Trabalho:

26.782.6216.1968.0013

Etapa 85 SAG 2014/ Etapa 34 SAG 2015

Nº do Processo: 113.013.987/2013

Nº do Contrato: 023/2014

Empresa: STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A.

Data de Início: 20/05/2014

Data prevista de conclusão: 30/01/2015
(Terceiro Aditivo)

Valor: R\$ 492.214,41 + R\$ 112.645,13 =
R\$ 604.859,54 (Segundo Aditivo)

Recurso: Fonte 100

Executor: Engº Willkerson Victor da Silva

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração de projeto executivo de engenharia para duplicação da DF-250, no seguimento compreendido do entroncamento com a DF- 001 (EPCT) e DF- 015 (EPTM) até o acesso a Sobradinho dos Melos, com extensão aproximada de 5,3 km.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Executado 21% no bimestre. Acumulado 90%. A Empresa entregou os produtos referentes ao contrato, foram analisados e foram devolvidos com as ponderações do executor para que possam ser feitos os ajustes e complementos necessários.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Obra 100% concluída no 6º bimestre. Último pagamento inserido em Reconhecimento de Dívida.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%


Avanço Físico Bimestral

100%	%	%	%	%	%
------	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF

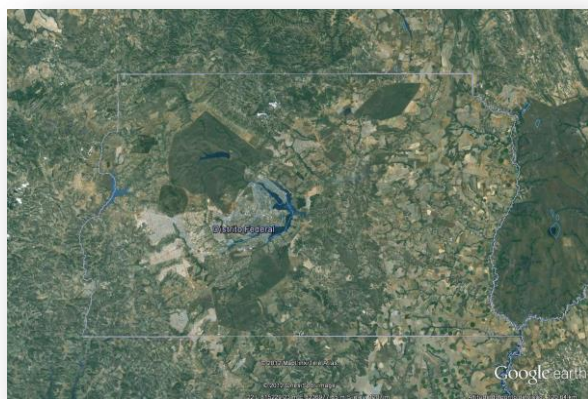


Programa de Trabalho:
 26.782.6216.3711.6162 (2013)
 Etapa 52 SAG 2014/ Etapa 35 SAG 2015
 N° do Processo: 113.005.428/2006
 N° do Contrato: 002/2010
 Empresa: Geo-Lógica Consultoria Ambiental
 Data de início: 19/02/2010
 Data prevista de conclusão: Paralisada até
 19/04/2015 (Nono Aditivo)
 Valor: R\$ 1.303.632,37
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Engº Paulo Roberto da Silva


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central (DF e Goiás).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 80%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 80%.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001 Etapa 55 SAG 2014
 26.782.6216.1475.1199 (Primeiro Aditivo)
 Nº do Processo: 113.002.690/2014
 Nº do Contrato: 028/2014
 Empresa: Ultrapav Ltda. - ME
 Data da Assinatura do Contrato: 09/05/2014
 Data prevista de conclusão: 09/05/2015
 Valor inicial: R\$ 2.079.989,34
 Recurso: Fontes 100, 300, 220 e/ou 420
 Executor: Engº Jarbas Alessandro Martins da Silva

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de 11.622 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ para atender às demandas de tapa buracos, recapeamento asfáltico e pavimentação.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 36%. Não houve fornecimento de CBUQ neste bimestre por parte da Contratada.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

Executado 5% no bimestre. Acumulado 41%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
0%	5%	%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
36%	41%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E ENCARREGADO



Programa de Trabalho:

26.782.6216.4195.0001

Etapa 55 SAG 2014/ Etapa 17 SAG 2015

Nº do Processo: 113.000.098/2013

Nº do Contrato: 045/2014

Empresa: Interativa Dedetização, Higienização e Conservação Ltda.

Data de Início: 22/07/2014

Data prevista de conclusão: 21/07/2015
(Primeiro Aditivo)

Valor estimado: R\$ 3.139.298,16

Recurso: Fonte 100

Executor: Engº Jarbas Alessandro Martins da Silva

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação dos serviços especializados de conservação, limpeza e manutenção simples das rodovias do Distrito Federal, nos Distritos Rodoviários, unidades Administrativas e nas Regiões de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, sob a supervisão do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Executado 29% no bimestre. Acumulado 29%. Foi concluída a prestação de serviços da vigência passada. O novo período do serviços será de janeiro a julho de 2015.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

Executado 30% no bimestre. Acumulado 59%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
29%	30%	%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
29%	59%	%	%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ALAMBRADO E MURO DE DIVISA DO 5º DISTRITO RODOVIÁRIO DO DER-DF





Programa de Trabalho:
 26.451.6216.3197.0001 (2013)
 26.451.6010.1984.9792 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 76 SAG 2014/ Etapa 24 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.010.563/2011
 Nº do Contrato: 042/2013
 Empresa: Mendonça Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP
 Data de Início: 11/12/2013
 Data prevista de conclusão: Paralisado até 03/05/2015 (Sexto Aditivo)
 Valor: R\$ 309.242,70
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº Sérgio Henrique Rezende Valle

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução das obras de reforma e acabamento da Nova Sede do 5º Distrito Rodoviário do DER-DF, localizado na Vila São José DF-180, Km 19 – Brazlândia-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 73,2%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 73,2%.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

CONSTRUÇÃO DA SEDE E ILUMINAÇÃO EXTERNA DO 4º DISTRITO RODOVIÁRIO DO DER/DF





Programas de Trabalho:
 26.451.6216.3197.0001 (2013)
 26.451.6010.1984.9792 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 77 SAG 2014/ Etapa 25 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.002.641/2010
 Nº do Contrato: 043/2013
 Empresa: Mendonça Construtora e Incorporadora Ltda. – EPP
 Data de Início: 11/12/2013
 Data prevista de conclusão: Paralisado até 10/04/2015 (Sexto Aditivo)
 Valor: R\$ 408.254,65
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº Cyrino Flávio Ferreira Silva (Instrução de Serviço, 19/01/2015)

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de reforma e acabamento na nova Sede do 4º Distrito Rodoviário do DER/DF localizado no Setor de Área Especial nº 02, rodovia DF-130, km 53 – Paranoá.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0%. Acumulado 55%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:
 Executado 0%. Acumulado 55%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA GERÊNCIA DE CONTROLE OPERACIONAL (GECOP) – SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO DER



Programa de Trabalho:
 26.451.6010.1984.9792
 Etapa 16 SAG 2014/ Etapa 23 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.003.265/2011
 Nº do Contrato: 008/2014
 Empresa: Titan Construções e Investimentos Imobiliários Ltda.
 Data de Início: 27/02/2014
 Data prevista de conclusão: Paralisado até 21/03/2015 (Segundo Aditivo)
 Valor: R\$ 934.540,32
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº Darione José Maria Cavalcanti de Oliveira



DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução das obras de construção do Edifício Sede da Gerência de Controle Operacional – GECOP da Superintendência de Trânsito.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 50%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 50%.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 01





Programa de Trabalho:
 26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 79 SAG 2014/ Etapa 26 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.007.877/2012
 Nº do Contrato: 018/2014
 Empresa: Trier Engenharia Ltda.
 Data de Início: 13/05/2014
 Data prevista de conclusão: Paralisado até 30/05/2015 (Sexto Aditivo)
 Valor: R\$ 32.679.197,28 + R\$ 655.000,00 (Quarto Aditivo)
 Recurso: Fontes 135, 100 (Segundo Aditivo), 231 (Terceiro Aditivo)
 Executores: Fábio Cardoso da Silva, Bruno Sousa Almeida e Willkerson Victor da Silva (Instrução nº 65, 19/05/14, DODF nº 100, 21/05/14).

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 0,0 ao km 2,5, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 1%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 1%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 02



Programa de Trabalho:

26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 80 SAG 2014/ Etapa 27 SAG 2015
 Nº do Processo: 113.004.262/2014
 Nº do Contrato: 021/2014
 Empresa: Consórcio JM/Cidade
 Data de Início: 14/05/2014
 Data prevista de conclusão: Paralisado até 03/06/2015 (Sexto Aditivo)
 Valor: R\$ 39.829.963,10
 Recurso: Fontes 135, 100 (Segundo Aditivo), 231 (Quarto Aditivo)
 Executores: Fábio Cardoso da Silva, Jarbas Alessandro Martins da Silva e Willkerson Victor da Silva (Instrução nº 66, 19/05/14, DODF nº 100, 21/05/14).



DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 2,5 ao km 5,2, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 19,7%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 19,7%.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

DESCENTRALIZAÇÃO PARA O DER: IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE, REMODELAÇÃO DA PONTE DO BRAGHETTO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DF-002 (ERN) E DF-007 (EPTT)



Programa de Trabalho:

26.782.6216.3056.0003

26.782.6216.1475.1199 (Primeiro Aditivo)

Nº do Processo: 113.007.878/2012

Nº do Contrato: 025/2014

Empresa: Consórcio Via Engenharia/Conterc – Construção, Terraplenagem e Consultoria Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 26/05/2014

Data prevista de conclusão: Paralisado até

29/06/2015 (Quarto Aditivo)

Valor inicial: R\$ 79.632.741,77

Recurso: Fontes 135, 231 (Primeiro Aditivo)

Executores: Fábio Cardoso da Silva, Samuel Dias Júnior e Geraldo Jacinto da Silva Filho (Instrução nº 72, 29/05/14)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução de obras para Implantação do Trevo de Triagem Norte (TTN), remodelação da Ponte do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego em 2,1 km da rodovia DF-007 (EPTT), no trecho compreendido entre a DF-002 e o entroncamento com a DF-003/BR-450 (Balão do Torto), e em 0,4 km da rodovia DF-002 (ERN), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-007 (ponte do Braghetto) até o acesso às vias W1/W3, execução de estrutura cicloviária, bem como a elaboração dos projetos executivos decorrentes das obras de artes especiais a serem implantadas e remodeladas. Cc nº 002/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 0,3%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:


Executado 0% no bimestre. Acumulado 0,3%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
0%	0%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
0,3%	0,3%	%	%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL

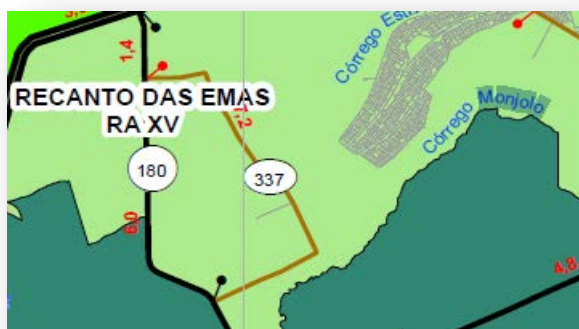

Programa de Trabalho:
 26.782.6216.3361.4359
 Etapa 40 SAG 2015 (UO 22.101)
 Nº do Processo: 112.004.068/2011
 Nº do Contrato: 005/2014- SO
 Prazo de Execução: 21/07/2014
 Prazo de Vigência: 21/10/2014
 Valor: R\$ 494.038,57
 Recurso: Fonte 100
 Executoras: Alessandra Guimarães de Oliveira Santos e Silvia Cristina Sardinha Maia

Portaria Conjunta nº 03, de 13 de fevereiro de 2014 (DODF nº 37, 18/02/2014)

De: UO: 26.205 – Departamento de Estradas de Rodagem – DER
 UG: 200.202 - Departamento de Estradas de Rodagem – DER
 Para: UO: 22.101 – Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal
 UG: 190.101 - Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Descentralização de créditos orçamentários destinados a custear despesas com a contratação das obras de construção de Ponte sobre o Córrego Monjolo, localizada no Núcleo Rural Monjolo, Recanto das Emas/DF, cuja meta é a construção de 101 m².

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 5%. Obra paralisada pela NOVACAP para aguardar Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA) do projeto de reforço da estrutura.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 5%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
5%	%	%	%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída
