


Relatório de Acompanhamento Governamental 5º Bimestre/2016

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO

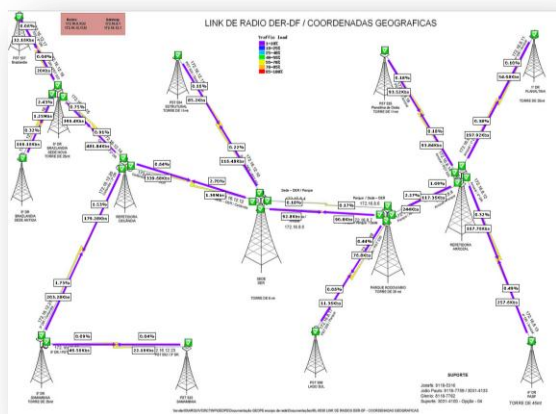

Programas de Trabalho:

26.122.2800.8517.0014 (2011)

26.122.6010.2557.2569 (2013/2014/2015)

26.126.6001.2557.2569 (2016)

Etapa 6 SAG 2016

Nº do Processo: 113.000.559/2011

Nº do Contrato: 025/2011

Empresa: Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda.

Data de início: 21/11/2011

Data prevista de conclusão: 20/11/2016

(Sexto Aditivo)

Valor: R\$ 306.175,68 (Quarto Aditivo)

Recurso: Fonte 100 e 237 (Sétimo Aditivo)

Executor: Thiago Vinícius de Melo Almeida

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços especializados de engenharia, contemplando a manutenção de sistema de comunicação de dados com todos os equipamentos de infraestrutura e serviços necessários para interligação das Unidades que compõem o complexo administrativo do DER/DF e BPRv (Batalhão de Policiamento Rodoviário). Farão parte da prestação dos serviços a manutenção, inspeção periódica dos rádios e switches e manutenção das torres de comunicação de micro-ondas que interligam os 5 Distritos Rodoviários e os postos do BPRv com a sede do Órgão.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

Andamento normal. Foi realizada manutenção da conexão nos equipamentos do 4ºDR, 3ºDR e Transitolândia.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Andamento normal. Foi realizada manutenção da conexão nos equipamentos do 1ºDR, 3ºDR, 4ºDR e na repetidora Arrozal.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	%

Avanço Físico Bimestral

16,67%	33,34%	50,01%	66,68%	83,35%	%
--------	--------	--------	--------	--------	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO



Programas de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0004 (Quinto Aditivo)
 Etapa 12 SAG 2015
 26.782.6217.2541.0004
 Etapa 16 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.008.698/2011
 Contrato: 027/2011
 Empresa: Gráfica e Editora Movimento
 Data de Início: 19/12/2011
 Data prevista de conclusão: 18/12/2016 (Sexto aditivo)
 Valor Anual: R\$ 1.700.000,00 (Quinto Aditivo)
 Recurso: Fonte 237, 220 e/ou 100 (Quinto Aditivo)
 Executor: Fábio Vargas Mendes (IS de 07/08/2015)


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços gráficos e diagramação de campanhas educativas de trânsito e meio ambiente, por meio de confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços gráficos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

Durante o período de julho e agosto, o DER/DF utilizou o contrato no valor de R\$ 31.298,50. A Diretoria de Educação, por meio de suas Gerências, realizou as Campanhas de Educação “Moto Capital”, “Campanha do Farol”, “Transitolândia Itinerante na Praça do Buriti” e “Blitzen Educativas”, que atingiram cerca de 37.519 pessoas, sendo destas 2.919 pedestres, 12.000 motociclistas e 22.600 motoristas.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Durante o período de setembro e outubro, o DER/DF utilizou o contrato no valor de R\$ 166.926,81. A Diretoria de Educação, por meio de suas Gerências, realizou as Campanhas de Educação “Semana Nacional de Trânsito”, “Exposição no Congresso Multidisciplinar de Ciência e Tecnologia”, participação no Encontro Nacional de Conservação Rodoviária “ENACOR”, “Ação Escola Compartilhada no Varjão”, “Palestras a Escolas e Empresas”, “Capacitação para Motociclistas”, que atingiram cerca de 9.027 pessoas.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001 – Etapa 11 SAG 2015
 26.782.6217.2541.0001 – Etapa 15 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.001.225/2008
 Nº do Contrato: 028/2011
 Empresa: Engebrás S/A Indústria, Comércio e Tecnologia de Informática
 Data de Início: 23/12/2011
 Data prevista de conclusão: 23/12/2016 (Quinto Aditivo)
 Valor: R\$ 21.979.430,01 (Quinto Aditivo)
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Eng.º Murilo de Melo Santos

DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO: Monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:
 Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 66,4%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:
 Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 83%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	16,6%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,6%	33,2%	49,8%	66,4%	83%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP



Programa de Trabalho:

26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo) - Etapa 12 SAG 2015

26.782.6217.2541.0001 – Etapa 16 SAG 2016

Nº do Processo: 113.003.563/2014

Nº do Contrato: 060/2014

Empresa: Lig Móvel Telecomunicações Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 29/09/2014

Data prevista de conclusão: 28/09/2017

(Quarto Aditivo)

Valor dos Serviços: R\$ 1.146.696,00

Recurso: Fonte 237

Executor: Rafael Modé Luma

Substituto: Daniel dos Santos Sampaio

(IS, 03/03/2016)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de serviço móvel especializado (SME) do tipo sistema troncalizado digital tecnologia tetra para locação de equipamentos para Gerência de Controle Operacional da Diretoria de Fiscalização de Trânsito da Superintendência de Trânsito do DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

Total pago neste bimestre foi de R\$ 92.950,00 (referente ao mês de julho)

O acumulado pago referente aos meses de janeiro a julho é R\$ 650.650,00.


Obs.: Processo encaminhado à DIOFI para liquidação da fatura referente ao mês de agosto.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Total pago em setembro foi R\$ 92.950,00 (processo em andamento para liquidação da fatura).
Aguardando seu retorno para envio da fatura relativa ao mês de outubro.

O acumulado pago referente aos meses de janeiro a agosto é R\$ 743.600,00.

Obs.: Processo em andamento para emissão de nota de empenho para os meses de novembro e dezembro.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SITEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF



Programa de Trabalho:
26.782.6215.2541.0001
Etapa 11 SAG 2015/ Etapa 15 SAG 2016
Nº do Processo: 054.001.403/2011-113.001.179/2011
Nº do Convênio: 001/2012
Conveniado: Polícia Militar do Distrito Federal
Data de Início: 11/05/2012
Data prevista de conclusão: 21/05/2017
Recurso: Fontes 237, 437, 331 (Primeira Apostila)
Executor: Eng.º Márcio Corrêa Soares

Programa de Trabalho da Descentralização:
06.181.6217.3029.9511 (UO 24.103)
Data de Início da Vigência: 01/09/2016
Data do término da vigência: 31/12/2016
Valor: R\$ 1.283.163,40
Recurso: Fonte 331


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 66,4%.


AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Executado 16,6% no bimestre. Acumulado 83%.

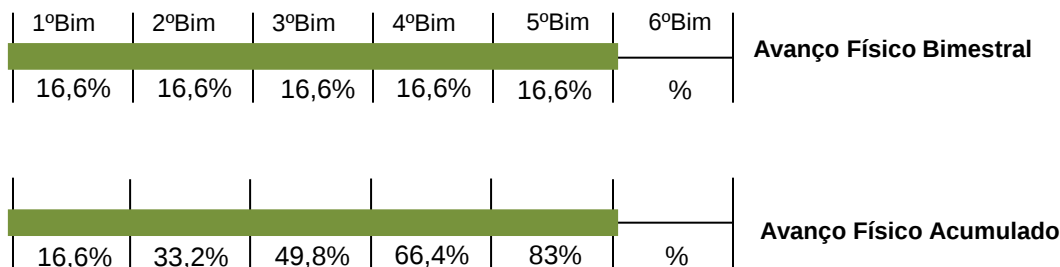

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SERVIÇO INTEGRADO MÓVEL PARA GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0004 (Segundo Aditivo)
 Etapa 12 SAG 2015
 26.782.6217.2541.0004 – Etapa 16 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.011.356/2013
 Nº do Contrato: 014/2014
 Empresa: OI Móvel S.A (Primeiro Aditivo)
 Data da Assinatura do Contrato: 28/03/2014
 Data prevista de conclusão: 10/06/2017
 (Terceiro Aditivo)
 Valor anual: R\$ 1.398.795,84 (Terceiro Aditivo)
 Recurso: Fonte 237/437
 Executor: Afonso Guilherme Dutra

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Serviço Integrado Móvel para Gestão de Trânsito e Mobilidade – SIMGTM, incluindo serviços de instalação, suporte técnico e repasse de conhecimentos para atender a necessidade do DER/DF. Equipamento do tipo celular que utiliza rede de telefonia e de internet para comunicação interna, consulta de veículo e habilitação, registro de infrações de trânsito (on line), registro de ocorrência de acidente de trânsito, emissão de ficha de missão e relatórios voltados para a fiscalização de trânsito e demais funções afins à autarquia.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:


Julho – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

Agosto – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Setembro – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

Outubro – Prestação dos serviços dentro da normalidade.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MONITORAMENTO E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO



Programa de Trabalho:

26.782.6215.2541.0001 - Etapa 11 SAG 2015

26.782.6217.2541.0001 Etapa 15 SAG 2016

Nº do Processo: 113.001.811/2009

Nº do Contrato: 041/2014

Empresa: Eliseu Kopp & Cia. Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2014

Data prevista de conclusão: 24/12/2016

Valor inicial: R\$ 6.445.569,64

Recurso: Fonte 237

Executor: Eng.º Darione José Maria Cavalcanti de Oliveira


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços de monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos instalados em pontos definidos no Edital da Concorrência nº 008/2010. Complementarmente, deverão ser elaborados inventários, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos, com expedição concomitante de relatório individual para emissão de autos de infração e notificação, utilizando medidores eletrônicos de velocidade fixos de operação autônoma.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

Andamento normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Andamento normal.

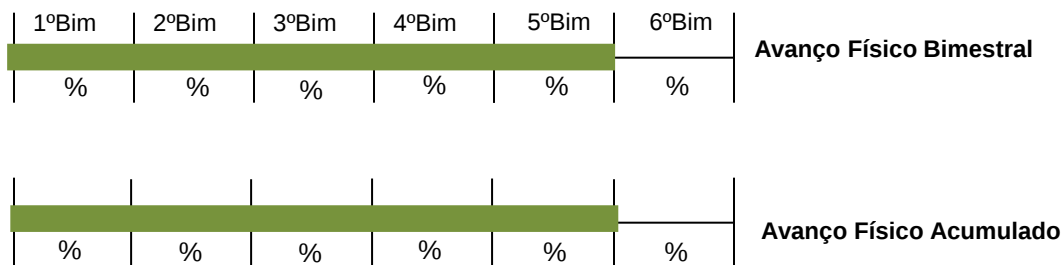

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS



DETRAN-DF

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO DISTRITO FEDERAL



Programa de Trabalho:
26.782.6217.2541.0001

Etapa 15 SAG 2016

Nº do Processo: 113.017.091/2015

Nº do Convênio de Cooperação: 002/2015

Conveniado: Departamento de Trânsito do
Distrito Federal - DETRAN/DF

Data da Assinatura do Convênio: 24/11/2015

Data prevista de conclusão: 14/05/2018

Recurso: Fontes 237, 437

Executor: Juliana Soares das Neves

DESCRIÇÃO DO OBJETO: O presente Convênio de Cooperação Recíproca tem por objetivo a execução pelo DER/DF e pelo DETRAN/DF das atividades de Fiscalização de Trânsito nas rodovias integrantes do Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF e nas vias urbanas, bem como atividades de Educação de Trânsito, Engenharia de Tráfego, Estatísticas de Acidentes de Trânsito, Monitoramento Aéreo das Rodovias, Processamento Eletrônico de Multas, visando a aumentar a segurança e a melhoria das condições de trânsito no Distrito Federal, observando-se as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e demais normas pertinentes.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

Executado 18,22% no bimestre. Acumulado 73,93%. As atividades realizadas foram:

- Fiscalizações de Trânsito (Remoção de Veículos): **Julho:** Quant. = 174 e Valor = R\$ 52.200,00/ **Agosto:** Quant. = 198 e Valor = R\$ 59.004,00.
- Fiscalizações de Trânsito (Processamento Eletrônico de Multas): **Julho:** Quant. = 72.407 e Valor = R\$ 1.049.901,00/ **Agosto:** Quant. = 53.459 e Valor = R\$ 1.025.878,21.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Executado 21,15% no bimestre. Acumulado 95,08%. As atividades realizadas foram:

- Fiscalizações de Trânsito (Remoção de Veículos): **Setembro:** Quant. = 152 e Valor = R\$ 46.500,00/ **Outubro:** Quant. = 170 e Valor = R\$ 50.660,00.
- Fiscalizações de Trânsito (Processamento Eletrônico de Multas): **Setembro:** Quant. = 81008 e Valor = R\$ 1.175.776,00/ **Outubro:** Quant. = 87294 e Valor = R\$ 1.265.763,00.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
19,99%	17,70%	18,02%	18,22%	21,15%	%	Avanço Físico Bimestral

19,99%	37,69%	55,71%	73,93%	95,08%	%	Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programas de Trabalho:

26.782.6215.2904.0001 (2012) - Etapa 14 SAG 2015

26.782.6217.2904.0001 (2016)

Nº do Processo: 113.005.681/2010

Nº do Contrato: 011/2011

Empresa: Hot Cozinha Industrial

Data de Início: Março/ 2011

Data prevista de conclusão: 31/05/2016 (Quinto Aditivo)

Valor: R\$ 166.658,02 (Quinto Aditivo)

Recursos: Fonte 237

Executor: Hendrigo Samagaio de Abreu

Substituto (a): Clênia Gomes Pereira de Sousa (IS de 24/11/2015)


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Lanche para as crianças das Escolas Públicas, que são levadas nos períodos matutino e vespertino, no Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o Trânsito, para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2016:

No 2º Bimestre, referente aos meses de março e abril, foram recebidas na Transitolândia 2.142 crianças e 155 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 23 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. A escola forneceu a todas as crianças um lanche, utilizando o contrato no valor de R\$ 8.627,32.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2016:

No 3º Bimestre, referente aos meses de maio e junho, foram atendidas pela Transitolândia 2.780 crianças e 211 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 17 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. A escola forneceu a todas as crianças um lanche, utilizando o contrato no valor de R\$ 10.558,23.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programas de Trabalho: 26.782.6217.2904.0001
 Nº do Processo: 113.003.588/2016
 Nº do Contrato: 021/2016
 Empresa: Hot Cozinha Industrial Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 11/07/2016
 Data prevista de conclusão: 11/07/2017
 Valor: R\$ 153.600,00
 Recursos: Fonte 237
 Executora: Jucianne Batista Nogueira de Oliveira
 Substituto (a): Kein Yon Ko
 IS de 18/07/2016

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de lanche para a Escola Vivencial de Trânsito – Transitolândia, com entregas diárias de segunda-feira à sexta-feira, a critério do DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

No 4º Bimestre foram atendidas pela Transitolândia 2.769 crianças e 260 professores, que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 17 escolas receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo DER para viabilizar a chegada dessas crianças aos locais em que a Transitolândia se encontrava, utilizando o contrato no valor de R\$ 11.612,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

No 5º Bimestre foram atendidas pela Transitolândia 4.254 crianças e 399 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 28 escolas receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo DER para viabilizar a chegada dessas crianças aos locais em que a Transitolândia se encontrava, utilizando o contrato no valor de R\$ 18.612,00.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%
---	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programa de Trabalho:

26.782.6215.2904.0001 - Etapa 14 SAG 2015

26.782.6217.2904.0001 - 2016

Nº do Processo: 113.012.201/2013

Nº do Contrato: 012/2014

Empresa: Travel Bus Ltda - Me

Data de Início: 24/03/2014

Data prevista de conclusão: 23/03/2017

(Segundo Aditivo)

Valor: R\$ 626.740,35 (Segundo Aditivo)

Recurso: Fonte 237

Executor: Jucianne Batista Nogueira de Oliveira

Substituto: Kein Yon Ko


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviço de transporte de crianças a serem atendidas pela Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia) do DER-DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

No 4º Bimestre foram atendidas pela Transitolândia 2.769 crianças e 260 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 17 escolas receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo DER para viabilizar a chegada dessas crianças aos locais em que a Transitolândia se encontrava, utilizando o contrato no valor de R\$ 50.463,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

No 5º Bimestre foram atendidas pela Transitolândia 4.254 crianças e 399 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 28 escolas receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo DER para viabilizar a chegada dessas crianças aos locais em que a Transitolândia se encontrava, utilizando o contrato no valor de R\$ 55.926,00.




Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TRECHOS DO SRDF – LOTE 1

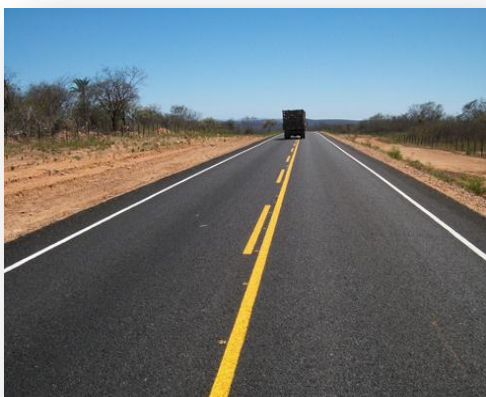

Programa de Trabalho:

26.782.6217.4197.0001 – Etapa SAG 17 2016

Nº do Processo: 113.007.572/2013

Nº do Contrato: 001/2016

Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 25/01/2016

Data do Recebimento da IS: 11/02/2016

Data prevista de conclusão: 10/03/2017

Valor: R\$ 3.043.293,27

Recurso: Fonte 237

Executor Titular: Eng.º Guilherme José da Fonseca Berniz

Executor Substituto: Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva (IS, 11/02/2016)



DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução da sinalização horizontal, em, vários trechos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, definido como Lote 1 – 1º Distrito Rodoviário, 4º Distrito Rodoviário e 5º Distrito Rodoviário, tudo conforme especificações nos termos do Edital de Concorrência nº 006/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

Executado 8,3% no bimestre. Acumulado 20%. Continuação da sinalização horizontal na **DF-250**, DF-330/DF-100; término da sinalização na **DF-355**, DF-130/DF-120; início e término da sinalização na **DF-128**, BR-020/DF-230; início e término da sinalização na **DF-120**, DF-455/DF-355; início e término da sinalização na **DF-445**, BR-080/DF-430.


AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Executado 10%. Acumulado 30%. Continuação da sinalização horizontal na **DF-250**, DF-330/DF-100; início e término da sinalização horizontal na **DF-473**, DF-463/BR-251; início e término da sinalização na **DF-285**, DF-285/BR-251; início da sinalização na **DF-205**, DGO/DGO.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TRECHOS DO SRDF LOTE 2

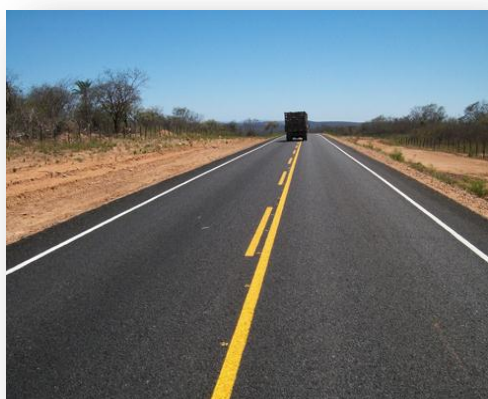

Programa de Trabalho:
26.782.6217.4197.0001 - Etapa SAG 17 2016
Nº do Processo: 113.000.864/2016
Nº do Contrato: 002/2016
Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
Data da Assinatura do Contrato: 25/01/2016
Data do Recebimento da IS: 11/02/2016
Data prevista de conclusão: 10/03/2017
Valor: R\$ 5.688.920,63 + R\$ 1.028.292,56
(Primeiro Aditivo) = R\$ 6.717.213,19
Recurso: Fonte 237
Executor Titular: Eng.º Guilherme José da Fonseca Berniz
Executor Substituto: Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva (IS, 11/02/2016)



DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução da sinalização horizontal, em, vários trechos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, definido como Lote 2 – 2º Distrito Rodoviário, 3º Distrito Rodoviário, tudo conforme especificações nos termos do Edital de Concorrência nº 006/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

Executado 8,94%. Acumulado 20%. Término da sinalização na **DF-001 (EPCT)**, DF-027/DF-025; Término da sinalização na **DF-001 (EPCT)**, BR-040/DF-140; Término da sinalização na **DF-190**, DF-180/DF-280; Término da sinalização na **DF-055**, DF-045/DF-003 (EPIA); término da sinalização **DF-495**, BR-040-até o final; término da sinalização na **DF-001 (EPCT)**, BR-060/DF-065; início da sinalização na **DF-003 (EPIA)**, DF-007/BR-040; início da sinalização na **DF-079 (EPVP)**, DF-075 (EPNB)/DF-085 (EPTG); início e término da sinalização na **DF-001 (EPCT)**, BR-060/DF-075 (EPNB); início e término da sinalização na **DF-475**, DF-001 (EPCT)/RA II.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Executado 15% no bimestre. Acumulado 35%. Continuação da sinalização horizontal na **DF-250**, DF-330/DF-001 (EPCT); início da sinalização na **DF-205**, DF-150/DF-201; início da sinalização na **DF-205**, DF-150/km 16; continuação da sinalização da **DF-079 (EPVP)**, DF-075 (EPNB)/DF-085 (EPTG); continuação da sinalização na **DF-003 (EPIA)**, DF-007 (EPTT)/BR-040.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO DO DER-DF



Programa de Trabalho:

26.782.6215.4198.0001 – Etapa 13 SAG 2015

Nº do Processo: 113.012.589/2015

Nº do Contrato Emergencial: 017/2015

Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 04/09/2015

Data prevista de conclusão: 02/03/2016

Valor inicial: R\$ 808.758,48

Recurso: Fonte 237

Executor: Eng.º Carlos Alberto Mundim Pena



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e, assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico do DER-DF, instalados em diversos pontos do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2015:

Executado 33% no bimestre. Acumulado 66%. Andamento Normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2016:

Executado 34% no bimestre. Acumulado 100%. Contrato encerrado.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO OPERADO PELO DER-DF



Programa de Trabalho:

26.782.6217.4198.0001 - Etapa 18 SAG 2016

Nº do Processo: 113.002.002/2016

Nº do Contrato Emergencial: 005/2016

Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 02/03/2016

Data prevista de conclusão: 29/08/2016

Valor: R\$ 808.758,48

Recurso: Fonte 237

Executor: Eng.º Carlos Alberto Mundim Pena



DESCRIÇÃO DO OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico operados pelo DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2016:

Executado 33% no bimestre. Acumulado 66%. Andamento Normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

Executado 34% no bimestre. Acumulado 100%. Contrato concluído.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO OPERADO PELO DER-DF



Programa de Trabalho:
 26.782.6217.4198.0001 - Etapa 18 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.013.854/2016
 Nº do Contrato Emergencial: 024/2016
 Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 01/09/2016
 Data prevista de conclusão: 28/02/2017
 Valor: R\$ 808.758,48
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Eng.º Carlos Alberto Mundim Pena

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico operados pelo DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:
 Executado 33% no bimestre. Acumulado 33%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	33%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	33%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE PAINÉIS DE MENSAGENS MÓVEIS



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.3209.0001 (Segundo Aditivo)
 Etapa 12 SAG 2015
 26.782.6217.3209.0001 – Etapa 41 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.009.643/2013
 Nº do Contrato: 066/2014
 Empresa: Talentech-Tecnologia Ltda.
 Data de Início: 15/12/2014
 Data prevista de conclusão: 15/12/2016 (Segundo Aditivo)
 Valor Anual: R\$ 3.291.836,40 (Segundo Aditivo)
 Recurso: Fonte 237 (Segundo Aditivo)
 Executora: Tainá de Aguiar Botelho


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento, implantação, manutenção e suporte técnico de painéis de mensagens variáveis e sistema de informação e orientação aos usuários, em tempo real e repasse de conhecimento para atender às necessidades do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:


Em julho operaram 30 painéis com gasto de R\$ 274.319,70. Em agosto operaram 30 painéis com gasto de R\$ 274.319,70.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Em setembro operaram 30 painéis com gasto de R\$ 274.319,70. Em outubro operaram 30 painéis com gasto de R\$ 274.319,70.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL



Programa de Trabalho:

26.782.6217.3209.0001 - Etapa 41 SAG 2016

Nº do Processo: 113.002.964/2014

Nº do Contrato: 011/2016

Empresa: SINASC – Sinalização e Construção de Rodovias Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 29/04/2016

Data do recebimento da IS: 11/05/2016

Data prevista de conclusão: 08/12/2016

Valor: R\$ 2.457.298,59

Recurso: Fonte 237

Executor: Eng.º Guilherme José da Fonseca Berniz

Substituto: Eng.ª Tainá de Aguiar Botelho

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução da instalação de sinalização vertical do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Cc nº 001/2015.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

Executado 57% no bimestre. Acumulado 57%. Executados os serviços de administração local, obras complementares nos 2º e 3º Distritos Rodoviários, referentes às defensas metálicas, sinalização nos 2º e 3º Distritos Rodoviários, referentes às placas, pórticos e semipórticos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Executado 40% no bimestre. Acumulado 97%. Executados os serviços de administração local, obras complementares nos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Distritos Rodoviários, referentes às defensas metálicas, sinalização nos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Distritos Rodoviários, referentes às placas, pórticos e semipórticos.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	0%	57%	40%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	0%	57%	97%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PAVIMENTAÇÃO VC-533, LIGAÇÃO DE BRAZLÂNDIA A PADRE LÚCIO



Programa de Trabalho:
 28.782.6216.1475.1199
 Etapa 30 SAG 2015/Etapa 28 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.005.439/2012
 Nº do Contrato: 039/2013
 Empresa: NG Engenharia e Construções Ltda.
 Data da assinatura do contrato: 22/11/2013
 Data do recebimento da IS: 26/09/2014
 Data prevista de conclusão: 19/01/2017
 (Décimo Primeiro Aditivo)
 Valor: R\$ 5.405.070,40 +
 R\$ 1.299.126,98 (Quarto Aditivo) +
 R\$ 561.300,44 (Nono Aditivo)
 = R\$ 7.265.497,82
 Recurso: Fonte 100, 135 (Terceiro Aditivo), 335
 (Oitavo Aditivo)
 Executor: Engº Antônio Gomes da Silva Filho
 População da RA IV: 50.490

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de obras para pavimentação de toda a extensão da rodovia vicinal VC-533, além de implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre o seu entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF/180 e a divisa com estado do Goiás (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio). Extensão de 3,852 km. Cc nº 005/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 75%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 75%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0%	5%	0%	0%	0%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
70%	75%	75%	75%	75%	%

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

DUPLICAÇÃO DA DF-463




Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1475.1199
 Etapa 28 SAG 2015/Etapa 26 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.005.051/2010
 Nº do Contrato: 043/2014
 Empresa: Serterra Transportes Escavações
 Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
 Data do Início: 10/07/2014
 Data prevista de conclusão: 08/02/2017 (Décimo
 Sexto Aditivo)
 Valor: R\$ 6.552.350,76 (Sexto Aditivo)+
 R\$ 666.984,73 (Décimo Primeiro Aditivo) +
 R\$ 7.724,13 (Décimo Segundo Aditivo) +
 939.084,88 (Décimo Quinto Aditivo)=R\$
 8.166.144,50.
 Recurso: Fonte 100, 135 (Quinto Aditivo), 335
 (Décimo Aditivo)
 Executor: Engº Guilherme José da Fonseca Berniz
 População das RA's XXVII e XIV: 123.455


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Execução das obras de duplicação da rodovia DF-463, adequação da rodovia e acessos aos Setores Habitacionais Mangueiral e Jardim Botânico. Extensão de 3,9 km. Cc nº 001/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:
 Executado 0%. Acumulado 85%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:
 Executado 4%. Acumulado 89%. Reiniciados os serviços de drenagem.

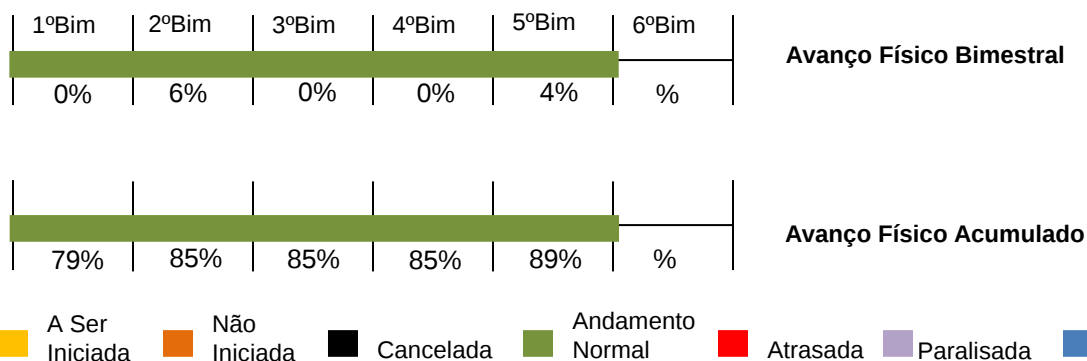

IMPLANTAÇÃO DA MARGINAL DA DF-480

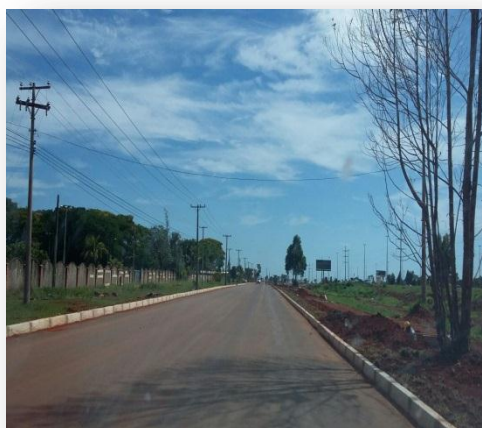

Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1475.1199
 Etapa 29 SAG 2015/ Etapa 27 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.001.927/2014
 Nº do Contrato: 046/2014
 Empresa: GW Construções e Incorporações Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 22/07/2014
 Data prevista de conclusão: 30/04/2016 (Oitavo Aditivo)
 Valor inicial: R\$ 4.459.511,78 + R\$ 256.916,64 (Décimo Aditivo)
 Recurso: Fonte 100, 135 (Sexto Aditivo), 335 (Nono Aditivo)
 Executor: Engº Eli Câmara
 População das RA's II e XIII: 256.851



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução das obras de implantação da marginal da rodovia DF-480, trecho entre a DF-001 e a UNB, com extensão de 6.001,24 m, compreendendo eixo principal e acessos. Cc nº 003/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2016:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 99%. Os serviços da obra já foram executados. Aguardando aprovação de reajustamento de valores solicitado.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2016:

Executado 1%. Acumulado 100%. Obra concluída. Reajustamento de valores pago.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

RESTAURAÇÃO DA DF-035 (EPCV)



Programa de Trabalho:
26.782.6216.1475.1199
Etapa 44 SAG 2015/ Etapa 29 SAG 2016
Nº do Processo: 113.003.227/2014
Nº do Contrato: 005/2015
Empresa: JM Terraplenagem e Construções Ltda.
Data da Assinatura do Contrato: 28/04/2015
Data prevista de conclusão: 30/03/2016 (Quarto Aditivo)
Valor inicial: R\$ 3.679.562,85 + R\$ 48.482,26 = R\$ 3.728.045,11 (Segundo Aditivo)
Recurso: Fonte 135, 100
Executor: Eng.º Mozer Teixeira de Castro
Substituto: Eng.º Geraldo Jacinto da Silva Filho
População da RA XXVII: 25.335



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução das obras de restauração da rodovia DF-035 (EPCV), no trecho compreendido entre a DF-025 (EPDB) e o entroncamento com a DF-001 (EPCT) com extensão aproximada de 4,0 Km, incluindo serviços de sinalização horizontal, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 008/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2016:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 98%. Foi solicitado um aditivo de prazo com o objetivo de tramitar a medição final e outras documentações. Deu-se início a elaboração da medição final (trechos convencionais e de LED).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2016:

Executado 2% no bimestre. Acumulado 100%. Última medição paga. Obra concluída.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-001 (EPCT), TRECHO KM 119,3 AO KM 131,8 – LAGO OESTE





Programa de Trabalho:
26.782.6216.1475.1199
Etapa 35 SAG 2016
Nº do Processo: 113.011.751/2014
Nº do Contrato: 003/2016
Empresa: EPC Projetos e Construções Ltda.
Data da Assinatura do Contrato: 16/02/2016
Data prevista de conclusão: 28/01/2017
(Terceiro Aditivo)
Valor inicial: R\$ 6.753.902,84
Recurso: Fontes 148 e 348 (Primeiro Aditivo)
Executor: Eng.º Paulo Robert Santos Machado

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução das obras de restauração da rodovia DF-001 (EPCT), entroncamento da DF-170 ao entroncamento BR-010/020/030/450/DF-001/003/150-Parque Rodoviário do DER/DF, trecho compreendido do km 119,3 ao km 131,8 (Lago Oeste – 1ª Etapa), incluídos os serviços de sinalização vertical e horizontal, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 11/2014. Extensão de 12,52 km.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:
Executado 23% no bimestre. Acumulado 98%. Foram concluídos os serviços de pavimentação em 12,52 km e foram realizadas as sinalizações horizontais e verticais.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:
Executado 0%. Acumulado 98%. A documentação necessária para alteração do Programa de Trabalho para uso dos recursos da CIDE foi enviada ao Ministério dos Transportes.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

RESTAURAÇÃO DA DF-440, TRECHO ENTRE A DF-263 E BR-020 – LOTE 01



Programa de Trabalho:
26.782.6216.1475.1199
Etapa 46 SAG 2015/ Etapa 30 SAG 2016
Nº do Processo: 113.007.456/2013
Nº do Contrato: 068/2014
Empresa: NG Engenharia e Construções Ltda.
Data da Assinatura do Contrato: 30/12/2014
Data prevista de conclusão: 13/05/2016
(Quarto Aditivo)
Valor: R\$ 1.242.554,42
Recurso: Fontes 100, 348
Executor: Eng.º Kênio Márcio Avelar
Substituto: Eng.º Geraldo Jacinto da Silva
Filho
População das RA's V, XXVI e XXVIII: 221.522



DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução das obras de restauração da rodovia DF-440, no trecho compreendido entre a VC-263 e BR-020 (próximo a Sobradinho), do km 15,4 ao km 21,1, denominado Lote 01. Extensão de 5,7 km. Cc nº 011/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2016:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 90%.


AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2016:

Executado 10% no bimestre. Acumulado 100%. Obra concluída.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

**PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE EIA/RIMA, DESTINADOS À
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS ENTRE
AS CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E PLANO PILOTO – CORREDOR EIXO
NORTE.**

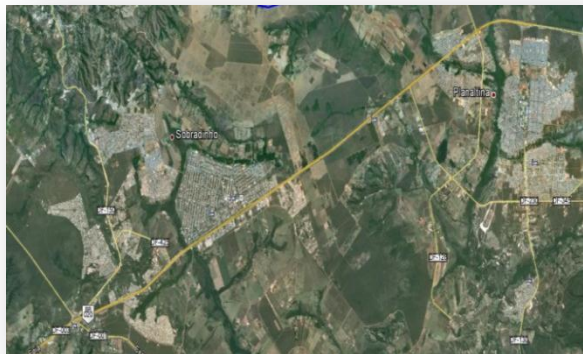


Programa de Trabalho:
26.782.6216.1968.0013 (2012)
Etapa 31 SAG 2015/Etapa 31 SAG 2016
Nº do Processo: 113.009.340/2011
Nº do Contrato: 063/2012
Empresa: Consórcio DF Interligado
Data de Início: 26/11/2012
Data prevista de conclusão: 28/11/2016
(Décimo Terceiro Aditivo)
Valor: R\$ 12.251.695,70 +
R\$ 233.714,04 (Terceiro Aditivo)+
R\$ R\$ 147.853,46 (Nono Aditivo)
= R\$ 12.633.263,20+ R\$ 2.586.081,78 (Décimo
Aditivo)=R\$ 15.219.344,98
Recurso: Fonte 100, 135 (Quarto Aditivo)
Executora: Eng.^a Ery do Nascimento Brandi de
Oliveira (Instrução de Serviço de 18/03/2015)
População das RA's VI, V,XXVI e I: 563.648


DESCRIÇÃO DA OBRA: Projeto Executivo de Engenharia e de EIA/RIMA, destinados à implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto – Corredor Eixo Norte. Cc nº 008/2011.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2016:
Executado 3,77% no bimestre. Acumulado 98%. Foram realizadas correções e ajustes dos projetos executivos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2016:
Executado 2% no bimestre. Acumulado 100%. Os projetos, objetos do contrato, foram 100% concluídos. Foram realizados ajustes na apresentação e codificação dos projetos executivos e correção de índices de reajustamento do orçamento para atendimento das análises da Caixa Econômica Federal.



Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EIA/RIMA, DESTINADO AO CORREDOR EIXO SUDOESTE.




Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1968.0013
 Etapa 32 SAG 2015/ Etapa 32 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.001.608/2013
 Nº do Contrato: 036/2013
 Empresa: ITEC Infra Tech Engenharia e Consultoria S.A
 Data da assinatura: 17/10/2013
 Data prevista de conclusão: 31/07/2016
 (Sétimo Aditivo)
 Valor: R\$ 9.681.024,81
 Recurso: Fontes 100, 235 (Primeiro Aditivo), 135 (Segundo Aditivo), 335 (Sexto Aditivo)
 Executores: Arqt. Fabrício Ferreira Faiad, Eng.º Elcy Ozório dos Santos, Arqt. Wilson Eulálio Porto, Geo. Luciano dos Santos (Instrução de Serviço de 15/06/2014)
 População das RA's XV, XVII, XXI, XII, III, VIII e I: 896.378


DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração de projeto executivo de engenharia e EIA/RIMA, destinado a implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Taguatinga, Núcleo Bandeirantes e o Plano Piloto – Corredor Eixo Sudoeste.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 68,24%. Não houve avanço físico-financeiro dos serviços.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 68,24%. Foi autorizada a penalização da Empresa.




Avanço Físico Bimestral



Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DA DF-250

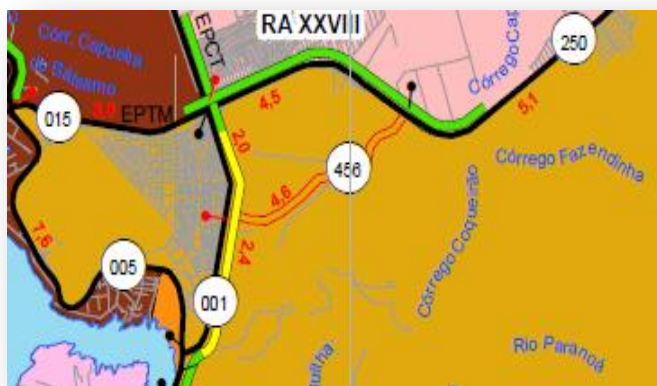

Programa de Trabalho:

26.782.6216.1968.0013

Etapa 34 SAG 2015/Etapa 33 SAG 2016

Nº do Processo: 113.013.987/2013

Nº do Contrato: 023/2014

Empresa: STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A.

Data de Início: 20/05/2014

Data prevista de conclusão: 30/01/2015
(Terceiro Aditivo)

Valor: R\$ 492.214,41 + R\$ 112.645,13 =
R\$ 604.859,54 (Segundo Aditivo)

Recurso: Fonte 100

Executor: Engº Willkerson Victor da Silva

População da RA XXVIII: 59.772

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração de projeto executivo de engenharia para duplicação da DF-250, no seguimento compreendido do entroncamento com a DF- 001 (EPCT) e DF- 015 (EPTM) até o acesso a Sobradinho dos Melos, com extensão aproximada de 5,3 km.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2014:

Executado 21% no bimestre. Acumulado 90%. A Empresa entregou os produtos referentes ao contrato, foram analisados e foram devolvidos com as ponderações do executor para que possam ser feitos os ajustes e complementos necessários.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:

Obra 100% concluída no 6º bimestre. Último pagamento inserido em Reconhecimento de Dívida.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%


Avanço Físico Bimestral

100%	%	%	%	%	%
------	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONSULTORIA EM ENGENHARIA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

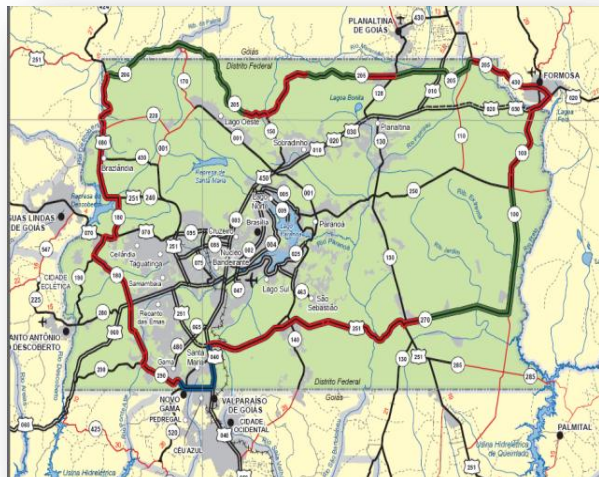

Programa de Trabalho: 26.782.6216.1968.0013
 Etapa 49 SAG 2015/Etapa 34 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.000.942/2014
 Nº do Contrato: 006/2015
 Empresa: Strata Engenharia EIRELI
 (Segundo Aditivo)
 Data da Assinatura do Contrato: 15/06/2015
 Data do Recebimento da IS: 29/06/2015
 Data prevista de conclusão: 04/01/2017
 (Terceiro Aditivo)
 Valor inicial: R\$ 7.151.845,29
 Recurso: Fonte 135
 Executores: Geol. Wellington Rodrigues dos Santos,
 Eng.º Stênio Fonseca da Costa e Eng.º Willkerson
 Victor da Silva (Instrução de Serviço nº 136,
 22/07/2015)
 População das RA's VI, VII, XIV, XIII, II, XV, XII,
 IX, IV, V e XXVI: 1.620.965


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa de consultoria em engenharia para análise e adequações nos produtos oriundos do contrato 040/2008 e a elaboração dos projetos básico e executivo para implantação do Anel Viário do Distrito Federal conforme Edital de Concorrência nº 002/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 32,48%. A contratada apresentou os seguintes produtos: Caderno de Resposta ao Parecer Técnico nº 005/2016 – CCA referente ao Relatório dos Estudos Preliminares (Produto C1 da Fase C); Relatório do Projeto Básico de Implantação da rodovia “Contorno de Formosa” (Produto C2 da Fase C); Relatório do Projeto Básico de Duplicação e Restauração da rodovia DF-001 (Produto C2 da Fase C).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 32,48%. A contratada apresentou os seguintes produtos: Relatório do Projeto Básico de Restauração e Melhoramentos da rodovia GO-430; Relatório do Projeto Básico de Restauração do Pavimento da rodovia BR-070; Relatório do Projeto Básico de Restauração do Pavimento da rodovia BR-251 (Produtos C2 da Fase C). A Comissão Executiva emitiu parecer favorável a aprovação, com ressalvas, do Relatório do Projeto Básico de Implantação da rodovia Contorno de Formosa (Produto C2 da Fase C).

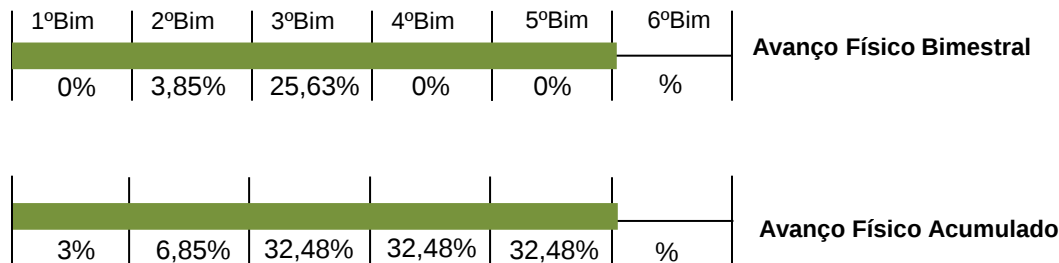

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA PAVIMENTAÇÃO DA DF-285, TRECHO KM 16,3 e KM 27,2




Programa de Trabalho:
26.782.6216.3711.6161
Etapa 10 SAG 2016
Nº do Processo: 113.012.231/2015
Nº do Contrato: 004/2016
Empresa: EXTREMA CONSTRUÇÃO LTDA.
Data da Assinatura do Contrato: 08/03/2016
Data do recebimento da IS: 09/03/2016
Data prevista de conclusão: 09/02/2017 (Segundo Aditivo)
Valor: R\$ 131.554,59
Recurso: Fonte 100
Executores: Geo. Luciano dos Santos, Geol. Maria Dulcineia Xavier Nunes e Eng.^a Patrícia Marc C. M. Milhomem

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Elaboração do Plano de Controle Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD para o obra de pavimentação da DF-285, Trecho: Km 16,3- km 27,2 (Divisa de MG).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:
Executado 0% no bimestre. Acumulado 40%. O PCA foi encaminhado ao IBRAM em 26/07/2016 por meio do OF. Nº 841/2016- DG, órgão ambiental responsável pelo licenciamento ambiental no DF, para ser apreciado e aprovado.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:
Executado 0% no bimestre. Acumulado 40%. Não houve avanço no bimestre, pois o DER aguarda análise do IBRAM para o estudo encaminhado em 26/07/2016.

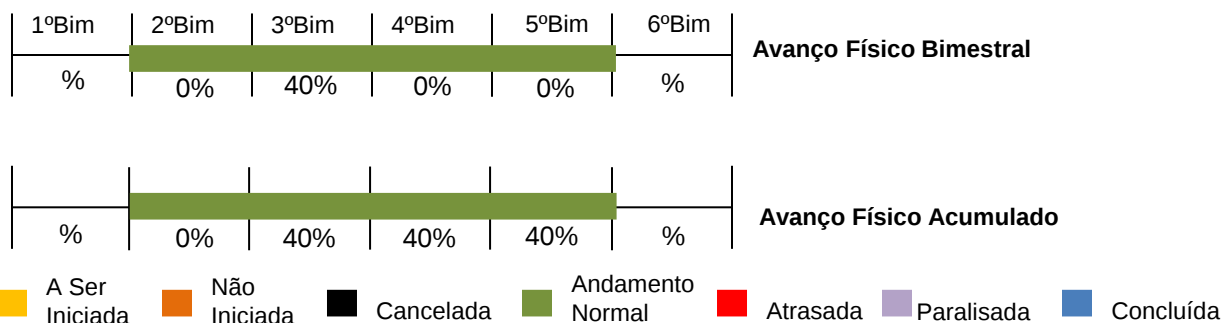

09/12/2016

ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA PAVIMENTAÇÃO DA DF-001 (DF-430/DF-170)



Programa de Trabalho:

26.782.6216.3711.6161 - Etapa 46 SAG 2016

Nº do Processo: 113.018.219/2014

Nº do Contrato: 007/2016

Empresa: ECOTECH Tecnologia Ambiental e Consultoria Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 11/03/2016

Data do recebimento da IS: 04/04/2016

Data prevista de conclusão: 02/01/2017
(Primeiro Aditivo)

Valor: R\$ 68.695,68

Recurso: Fonte 100

Comissão Executora: Geo. Geol. Wellington Rodrigues dos Santos, Geol. Maria Dulcineia Xavier Nunes e Eng.^a Patrícia Marc C. M.

Milhomem (IS nº 137, 27/06/2016- DODF nº 122, 28/06/2016)



DESCRIÇÃO DO OBJETO: Elaboração do Plano de Controle de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD para o obra de pavimentação da DF-001, incluindo a construção de ponte de concreto sobre o Rio da Palma, trecho: DF-430 entr. DF-415/ entr. DF-415 entr./ DF-220 entr. DF-220- entr. DF-170. Convite nº 001/2015.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

Executado 0% no Bimestre. Acumulado 0%. Serviço sem possibilidade de avanço.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Executado 0% no Bimestre. Acumulado 0%. Serviço sem possibilidade de avanço (aguardando elaboração de projeto pelo DER).



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

GERENCIAMENTO AMBIENTAL E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DO CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO EIXO SUL



Programa de Trabalho:
26.782.6216.1226.0001
Etapa 8 SAG 2016
Nº do Processo: 113.005.547/2013
Nº do Contrato: 009/2016
Empresa: STE Serviços Técnicos de Engenharia S/A
Data da Assinatura do Contrato: 07/04/2016
Data de Recebimento da IS: 15/04/2016
Data prevista de conclusão: 05/04/2018
(Segundo Aditivo)
Valor: R\$ 3.658.938,70 – R\$ 1.280.628,55
(Primeiro Aditivo)= R\$ 2.378.310,15 + R\$ 257.803,47 (Segundo Aditivo) = R\$2.636.113,62
Recurso: Fonte 335
Comissão Executora: Eng.^a Patrícia Marc C. M. Milhomem; Geol. Maria Dulcinéia Xavier Nunes e Eng.^o Paulo Roberto da Silva (IS, 12/04/2016)


DESCRIÇÃO DO OBJETO: Gerenciamento Ambiental dos Programas Ambientais do Corredor de Transporte Público Coletivo Eixo Sul, ligação das cidades do Gama e Santa Maria ao Plano Piloto, na DF-480/DF-065/DF-040/DF-003/DF-025/DF-047 e acesso ao Terminal Asa Sul. Tudo conforme os anexos do Edital da Concorrência Nº 009/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

Executado 10,8% no bimestre. Acumulado 10,8%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Executado 2,4% no bimestre. Acumulado 13,2%.

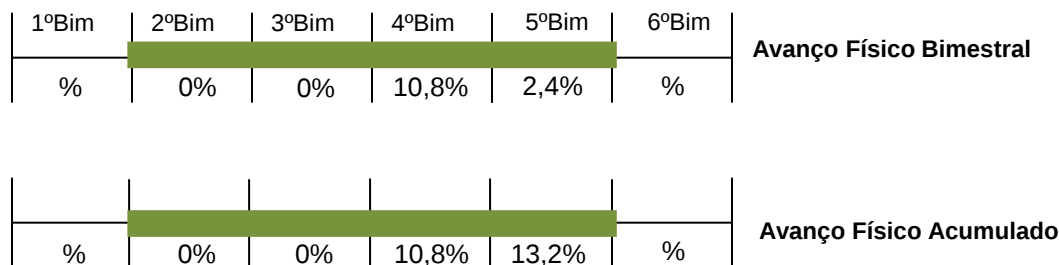

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E ENCARREGADO




Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001
 Etapa 17 SAG 2015/Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.000.098/2013
 Nº do Contrato: 045/2014
 Empresa: Interativa Dedetização, Higienização e Conservação Ltda.
 Data de Início: 22/07/2014
 Data prevista de conclusão: 21/01/2017
 (Quinto Aditivo)
 Valor estimado: R\$ 2.612.403,66
 (Quinto Aditivo)
 Recurso: Fonte 100, 237, 437 (Terceiro Aditivo), 220 e 420 (Primeira Apostila)
 Executor: Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva
 Executor Substituto: Eng.º Bruno Sousa Almeida
 (IS nº 164, 15/07/2016)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação dos serviços especializados de conservação, limpeza e manutenção simples das rodovias do Distrito Federal, nos Distritos Rodoviários, unidades Administrativas e nas Regiões de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, sob a supervisão do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:
 O Contrato é renovado por um período de 6 meses. Para essa nova renovação, o avanço do bimestre é de 34% e o acumulado é de 34%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:
 Executado 33% no bimestre. Acumulado 67%. Prestação dos serviços dentro da normalidade.

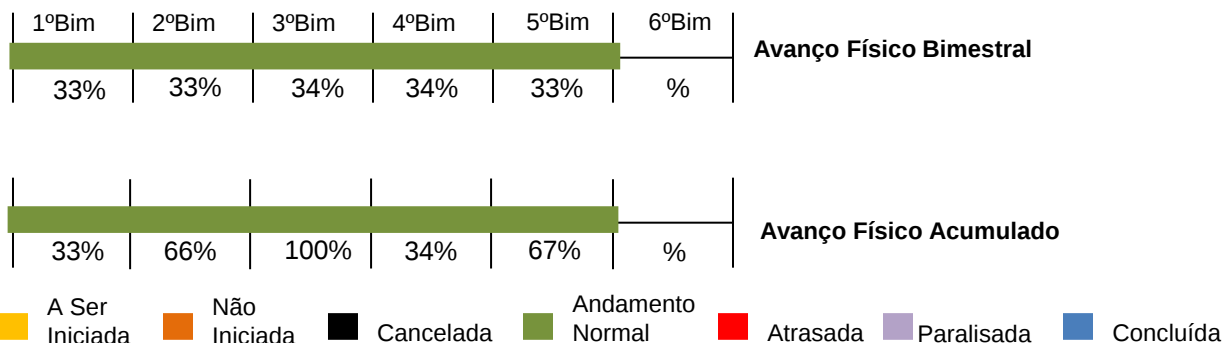

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA





Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001
 Etapa 17 SAG 2015/Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.002.159/2014
 Nº do Contrato: 004/2015
 Empresa: Distribuidora Brasileira de Asfalto S/A-
 DISBRAL
 Data da Assinatura do Contrato: 28/04/2015
 Data prevista de conclusão: 30/04/2016
 Valor Inicial: R\$ 158.869,00
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Eng.º Luiz Geraldo Rangel Vilela

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento parcelado de 100 toneladas de emulsão asfáltica para imprimação, fabricação produto ecológico, diluição através de água. Não utilização de solventes e nem produtos químicos, tais como derivados de petróleo.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2016:
 Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação – 0% neste bimestre.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2016:
 Contrato concluído.



A Ser Iniciada
Não Iniciada
Cancelada
Andamento Normal
Atrasada
Paralisada
Concluída

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA



Programa de Trabalho:

26.782.6216.4195.0001

Etapa 17 SAG 2015/Etapa 12 SAG 2016

Nº do Processo: 113.004.578/2015

Nº do Contrato: 007/2015

Empresa: Petrobrás Distribuidora S/A

Data de início: 22/07/2015

Data prevista de conclusão: 22/07/2016

Valor Inicial: R\$ 247.900,00

Recurso: Fonte 100



Executor: Eng.º Luiz Geraldo Rangel Vilela

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento parcelado de 160 toneladas de Emulsão Asfáltica Catiônica de ruptura média, tipo RM-1C.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2016:
Fornecimento de asfalto diluído RM-1C – 0% no bimestre.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2016:
Fornecimento de asfalto diluído RM-1C – 0% no bimestre.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:
Contrato concluído.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA




Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001
 Etapa 17 SAG 2015/Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.004.578/2015
 Nº do Contrato: 009/2015
 Empresa: Centro Oeste Asfalto Ltda.
 Data de início: 16/07/2015
 Data prevista de conclusão: 16/07/2017
 (Terceiro Aditivo)
 Valor Inicial: R\$ 190.999,90 (Terceiro Aditivo)
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Eng.º Luiz Geraldo Rangel Vilela

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento parcelado de 100 toneladas de Emulsão Asfáltica Catiônica de Ruptura Rápida, tipo RR-2C.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:
 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C – 13,38% em volume no bimestre.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:
 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C – 19,75% em volume no bimestre.

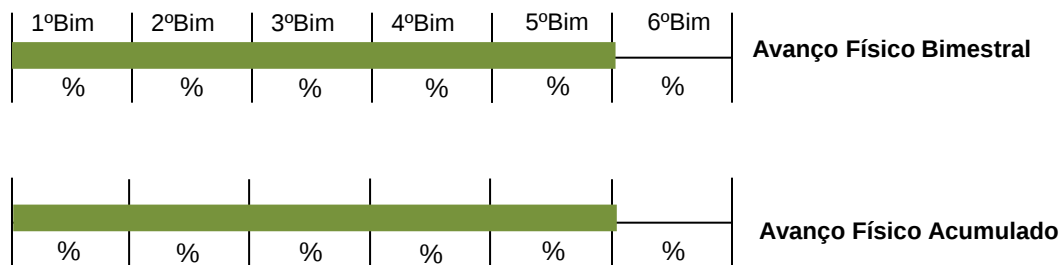

A Ser Iniciada	Não Iniciada	Cancelada	Andamento Normal	Atrasada	Paralisada	Concluída
---	---	--	---	---	---	--

FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE





Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001 - Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.006.861/2015
 Nº do Contrato: 022/2016
 Empresa: HL Terraplenagem Ltda - EPP
 Data da Assinatura do Contrato: 29/07/2016
 Data prevista de conclusão: 31/07/2017
 Valor Inicial: R\$ 2.240.000,00
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Eng.º Mozer Teixeira de Castro
 Suplente: Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de 10.000 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ para atender às demandas emergências de tapa-buracos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:
 O fornecimento de massa asfáltica teve início no dia 22/08/2016. Prestação de serviços normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:
 Executado 15% no bimestre. Acumulado 15%. Andamento normal. Foi realizada a primeira medição do contrato.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001 - Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.007.779/2016
 Nº do Contrato: 023/2016
 Empresa: Centro Oeste Asfalto Ltda.
 Data de início: 05/09/2016
 Data prevista de conclusão: 04/09/2017
 Valor Inicial: R\$ 215.950,00
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Eng.º Luiz Geraldo Rangel Vilela

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento parcelado de 100 toneladas de Emulsão Asfáltica para imprimação (EAI) e impermeabilização de trechos a se recuperar e/ou pavimentar, de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal –SRDF, a ser utilizado pelo DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:
 Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação – 7,76% em volume no bimestre.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001 - Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.010.837/2016
 Nº do Contrato: 025/2016
 Empresa: Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda.
 Data de início: 30/09/2016
 Data prevista de conclusão: 29/09/2017
 Valor Inicial: R\$ 297.438,40
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº. Luiz Geraldo Rangel Vilela

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento parcelado de 160 toneladas de Emulsão Asfáltica tipo ruptura média RM -1C.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RM-1C – 15,98% (em volume).

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

REMOÇÃO DE ENGENHOS PUBLICITÁRIOS E OCUPAÇÕES IRREGULARES DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS DO DF E DA RIDE



Programa de Trabalho:
26.782.6216.4195.0001
Etapa 17 SAG 2015/Etapa 12 SAG 2016
Nº do Processo: 113.005.021/2013
Nº do Contrato: 012/2015
Empresa: GB da Silva – Esquadrias & Equipamentos de Sinalização-EPP
Data da Assinatura do Contrato: 03/08/2015
Data prevista de conclusão: 28/07/2017
(Primeiro Aditivo)
Valor inicial: R\$ 953.610,96
Recurso: Fonte 100, 220 ou 420 (Primeiro Aditivo)
Executor: Hans Fernandes de Lemos


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços do tipo remoção de engenhos publicitários e ocupações irregulares das faixas de domínio das rodovias do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno-RIDE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Edital de Pregão nº 042/2015.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

Nesse bimestre foram apreendidos/recolhidos 50 outdoors, 34 front-light, 03 triedros, 13.978 faixas, 975 banners, 1.263 placas, 3.400 metros lineares de cerca/muro, interdição de 02 acessos, 07 quiosques, 504 barracas, 161 produtos comercializados irregularmente em veículos, 439 produtos comercializados à margem da rodovia e 17 trailer/reboques.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Nesse bimestre foram apreendidos/recolhidos 40 outdoors, 25 front-light, 13.351 faixas, 824 banners, 889 placas, 2.220 metros lineares de cerca/muro, interdição de 13 acessos, 02 quiosques, 512 barracas, 173 produtos comercializados irregularmente em veículos, 440 produtos comercializados à margem da rodovia, 09 depósitos de materiais para construção e 10 trailer/reboques.

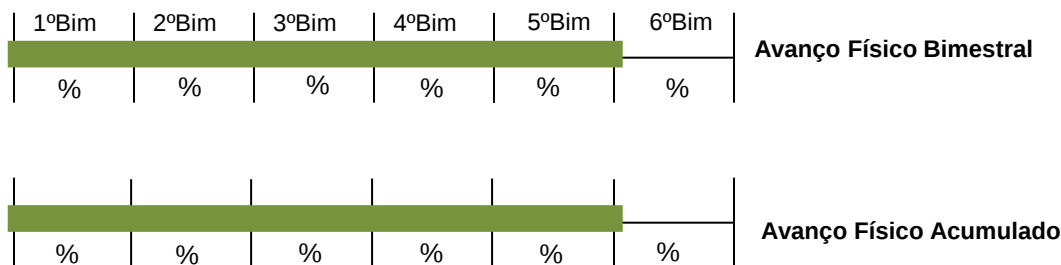

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ALAMBRADO E MURO DE DIVISA DO 5º DISTRITO RODOVIÁRIO DO DER-DF




Programa de Trabalho:
 26.451.6010.1984.9792 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 24 SAG 2015/Etapa 36 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.010.563/2011
 Nº do Contrato: 042/2013
 Empresa: Mendonça Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP
 Data de Início: 11/12/2013
 Data prevista de conclusão: 02/11/2015 (Oitavo Aditivo)
 Valor: R\$ 309.242,70
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº Sérgio Henrique Rezende Valle

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução das obras de reforma e acabamento da Nova Sede do 5º Distrito Rodoviário do DER-DF, localizado na Vila São José DF-180, Km 19 – Brazlândia-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 73,2%. Obra paralisada.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 73,2%. Obra paralisada.

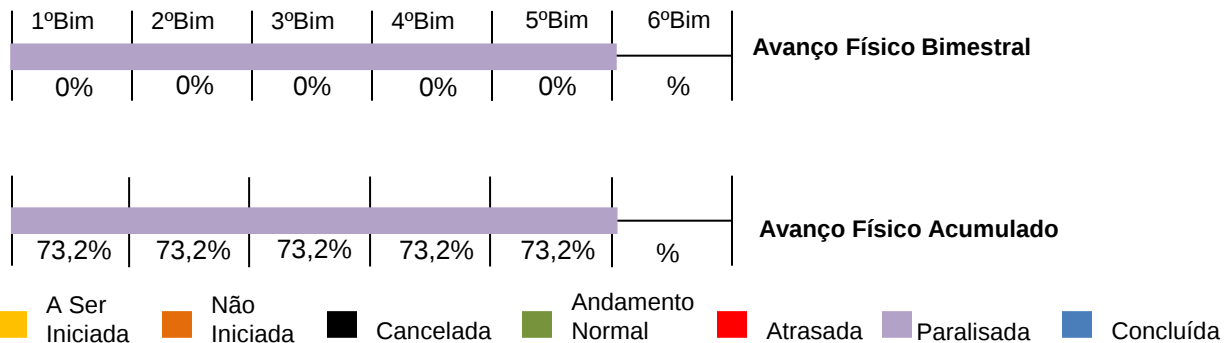

CONSTRUÇÃO DA SEDE E ILUMINAÇÃO EXTERNA DO 4º DISTRITO RODOVIÁRIO DO DER/DF




Programas de Trabalho:
 26.451.6216.3197.0001 (2013)
 26.451.6010.1984.9792 (Primeiro Aditivo)
 Etapa 25 SAG 2015/Etapa 37 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.002.641/2010
 Nº do Contrato: 043/2013
 Empresa: Mendonça Construtora e Incorporadora Ltda. – EPP
 Data de Início: 11/12/2013
 Data prevista de conclusão: 09/11/2015
 (Oitavo Aditivo)
 Valor: R\$ 408.254,65
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº Cyrino Flávio Ferreira Silva
 (Instrução de Serviço, 19/01/2015)

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de reforma e acabamento na nova Sede do 4º Distrito Rodoviário do DER/DF localizado no Setor de Área Especial nº 02, rodovia DF-130, km 53 – Paranoá.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2015:
 Executado 0%. Acumulado 55%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2015:
 Rescindido unilateralmente.

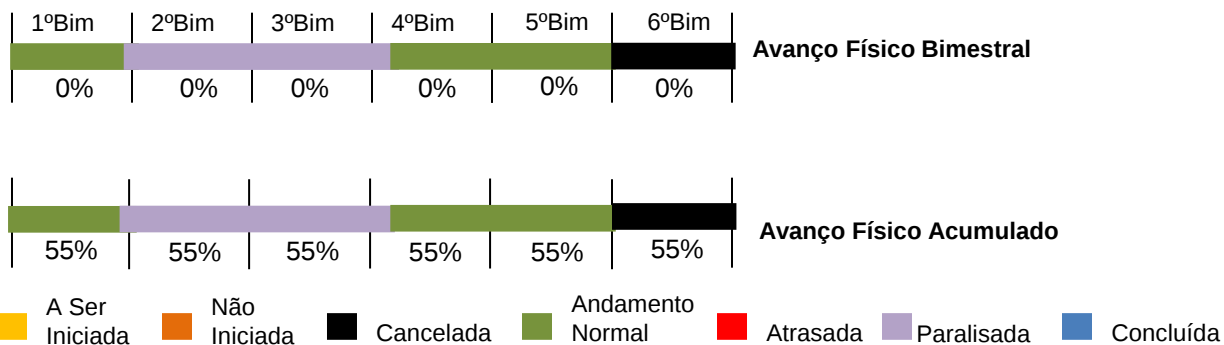

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA GERÊNCIA DE CONTROLE OPERACIONAL (GECOP) – SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO DER




Programa de Trabalho:
 26.451.6001.1984.9792
 Etapa 23 SAG 2015/Etapa 22 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.003.265/2011
 Nº do Contrato: 008/2014
 Empresa: Titan Construções e Investimentos Imobiliários Ltda.
 Data de Início: 27/02/2014
 Data prevista de conclusão: Paralisado até 21/03/2015 (Segundo Aditivo)
 Valor: R\$ 934.540,32
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº Darione José Maria Cavalcanti de Oliveira

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução das obras de construção do Edifício Sede da Gerência de Controle Operacional – GECOP da Superintendência de Trânsito.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 50%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2015:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 50%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 3º BIM. 2015:
 Rescindido unilateralmente.

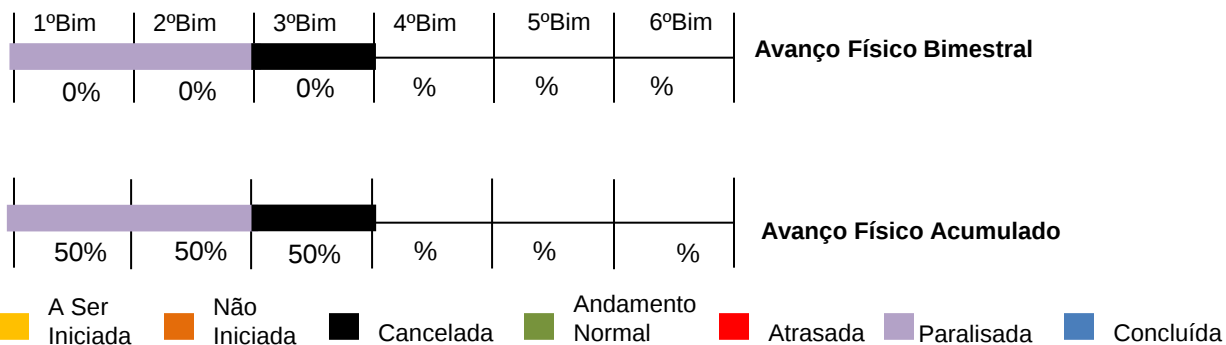

REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA GETEC/SUTEC



Programa de Trabalho:

26.451.6010.3903.9710 – Etapa 36 SAG 2015

26.451.6001.3903.9710 – Etapa 7 SAG 2016

Nº do Processo: 113.008.694/2010

Nº do Contrato: 014/2015

Empresa: MULTICON Engenharia Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 24/08/2015

Data do recebimento da IS: 08/09/2015

Data prevista de conclusão: 31/12/2016

(Segundo Aditivo)

Valor: R\$ 621.938,62 + R\$ 136.515,53 = R\$ 758.454,15

Recurso: Fontes 100 e 420

Executor: Eng.º Elcy Ozório dos Santos

Substituto: Eng.º Fabrício Ferreira Faiad


DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução das obras de restauração de reforma do Edifício Sede da GETEC, localizado no Parque Rodoviário do DER-DF, Rodovia DF-001, km 0, Sobradinho-DF. TP nº 006/2011.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

Executado 20% no bimestre. Acumulado 38,29%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 38,29%.

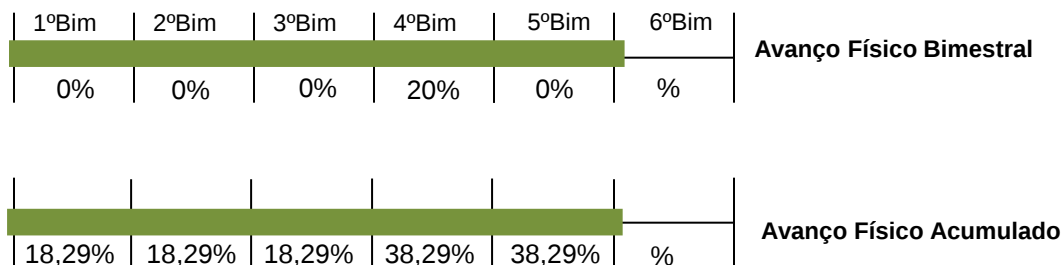

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 01



Programa de Trabalho:

26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)

Etapa 26 SAG 2015/Etapa 24 SAG 2016

Nº do Processo: 113.007.877/2012

Nº do Contrato: 018/2014

Empresa: Trier Engenharia Ltda.

Data de Início: 13/05/2014

Data prevista de conclusão: Reativado a partir de 25/04/2016 (14º Aditivo)

Valor: R\$ 32.679.197,28 + R\$ 655.000,00 (4º Aditivo)+ R\$ 6.568.563,91 (14º Aditivo) = R\$ 39.902.761,19

Recurso: Fontes 135, 100 (2º Aditivo), 231 (3º Aditivo), 900, 100 e 335 (14º Aditivo)

Executores: Eng.º Bruno Sousa Almeida, Eng.º Geraldo Jacinto da Silva Filho e Eng.º Elcy Ozório dos Santos (Instrução nº 115, 20/05/2016, DODF nº 99, 25/05/2016)

População da RA V: 63.050



DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 0,0 ao km 2,5, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

Executado 2,94% no bimestre. Acumulado 5,94%. Executado terraplenagem, escavação, carga e transporte, sinalização provisória da obra, sondagem de reconhecimento do subsolo.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 5,94%. Aguardando definição do projeto de drenagem e de contenções.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 02



Programa de Trabalho:

26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)

Etapa 27 SAG 2015/Etapa 25 SAG 2016

Nº do Processo: 113.004.262/2014

Nº do Contrato: 021/2014

Empresa: Consórcio JM/Cidade

Data de Início: 14/05/2014

Data prevista de conclusão: Reativado a partir de 25/04/2016 (13º Aditivo)

Valor: R\$ 39.829.963,10 + R\$ 7.815.270,04 (13º Aditivo) + R\$ 5.739.511,71=R\$ 53.384.744,85 (15º Aditivo)

Recurso: Fontes 135, 100 (2º Aditivo), 231 (4º Aditivo), 900, 131 e 335 (13º Aditivo), 231 (1ª Apostila)

Executores: Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva, Eng.º Geraldo Jacinto da Silva Filho e Eng.º Elcy Ozório dos Santos (Instrução nº 116, 20/05/2016, DODF nº 99, 25/05/2016)

Executor Substituto: Eng.º Bruno Sousa Almeida (IS nº 164, 15/07/2016)

População da RA V: 63.050



DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 2,5 ao km 5,2, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

Executado 2% no bimestre. Acumulado 22,1%. Os serviços realizados foram: escavação e aterro com material de 3ª Categoria (detonação de explosivos).


AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Executado 0,5% no bimestre. Acumulado 22,6%. Os serviços realizados foram: detonação de explosivos no Eixo Principal entre as estacas 130 e 140, escavações no Eixo Principal, Ramo D e aterro no Ramo C.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE, REMODELAÇÃO DA PONTE DO BRAGHETTO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DF-002 (ERN) E DF-007 (EPTT)

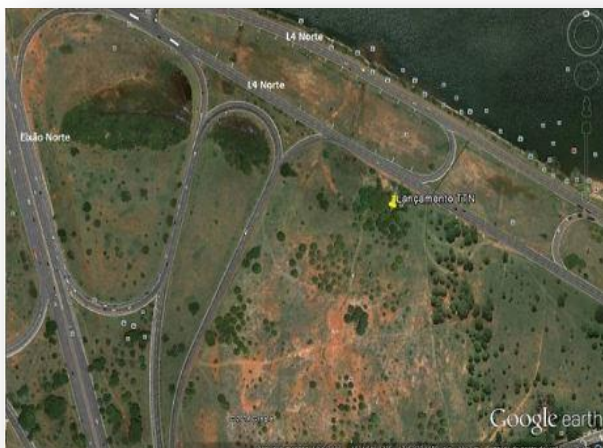

Programa de Trabalho:
 26.782.6216.3056.0004 (10º Aditivo)
 26.782.6216.1475.1199 (1º Aditivo)
 Nº do Processo: 113.007.878/2012
 Nº do Contrato: 025/2014
 Empresa: Consórcio Via Engenharia/Conterc – Construção, Terraplenagem e Consultoria Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 26/05/2014
 Data prevista de conclusão: Reativado a partir de 09/05/2016 (10º Aditivo)
 Valor inicial: R\$ 79.632.741,77+R\$ 14.837.279,45 (10º Aditivo)+ R\$ 2.101.997,67 (11º Aditivo)
 Recurso: Fontes 135, 231 (1º Aditivo), 900, 100 e 335 (10º Aditivo)
 Executores: Eng.º Geraldo Jacinto da Silva Filho , Eng.º Paulo Robert Santos Machado e Eng.ª Patrícia Marc Cristiane de Menezes Milhomem (Instrução nº 117, 20/05/2016, DODF nº 99, 25/05/2016) (Instrução nº 181, 16/08/2016, DODF nº 155, 17/08/2016)
 População das RA's XVIII e I: 250.607


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução de obras para Implantação do Trevo de Triagem Norte (TTN), remodelação da Ponte do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego em 2,1 km da rodovia DF-007 (EPTT), no trecho compreendido entre a DF-002 e o entroncamento com a DF-003/BR-450 (Balão do Torto), e em 0,4 km da rodovia DF-002 (ERN), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-007 (ponte do Braghetto) até o acesso às vias W1/W3, execução de estrutura cicloviária, bem como a elaboração dos projetos executivos decorrentes das obras de artes especiais a serem implantadas e remodeladas. Cc nº 002/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

Executado 2% no bimestre. Acumulado 2,5%. Foram efetuadas as limpezas das camadas vegetais com retirada da vegetação de acordo com a Licença Ambiental nas vias projetadas, conclusão do canteiro de obras, escavação e sondagem.


AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Executado 2% Bimestre. Acumulado 4,5%. Foram iniciados os serviços de estaca raiz nas Obas de Arte Especiais (OAE) 9L e 9W, execução de terraplenagem e desvios em redes de águas pluviais e nas vias.

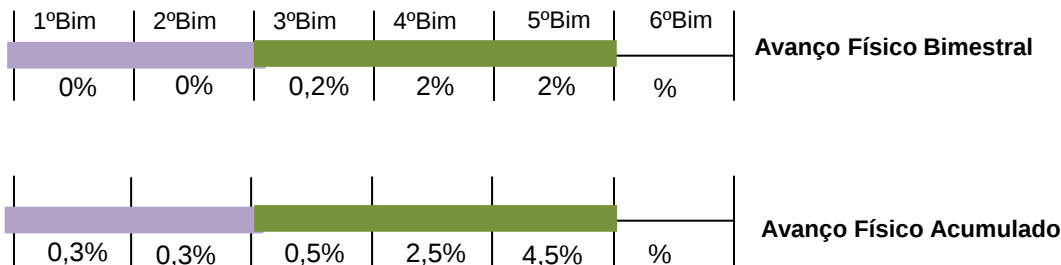

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE, REMODELAÇÃO DA PONTE DO BRAGHETTO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DF-002 (ERN) E DF-007 (EPTT)

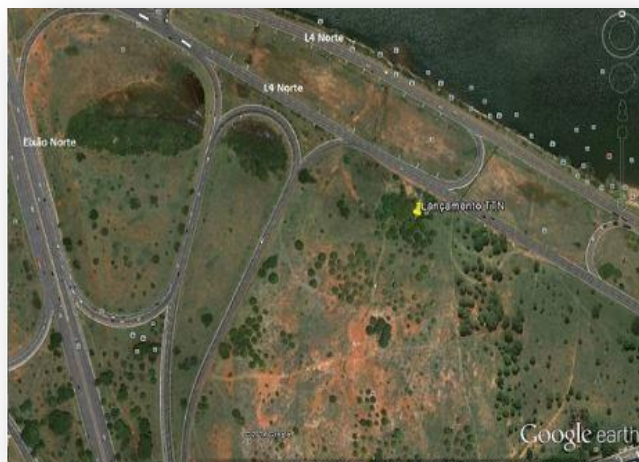

Programa de Trabalho:

26.782.6216.3056.0004

Nº do Processo: 113.005.297/2013

Nº do Contrato: 010/2016

Empresa: STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A

Data da Assinatura do Contrato: 14/04/2016

Data do Recebimento da IS: 02/05/2016

Data prevista de conclusão: 20/11/2018

Valor inicial: R\$ 7.993.852,19

Recurso: Fonte 100

Executor: Eng.º Antônio Gomes da Silva Filho

Substituto: Eng.º Kênio Márcio Avelar

(Instrução de Serviço de 05/05/2016)



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Supervisão das obras de implantação do Trevo de Triagem Norte (TTN), remodelação da ponte do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego nas rodovias DF-002 (ERN) e DF-007 (EPTT). Cc nº 008/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 4º BIM. 2016:

Os serviços acompanhados foram: serviços topográficos, laboratório, projetos de remanejamento de rede e questões relativas ao meio ambiente.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 5º BIM. 2016:

Continua o acompanhamento dos serviços topográficos, laboratório, projetos de remanejamento de rede e questões relativas ao meio ambiente.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída
