


SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO

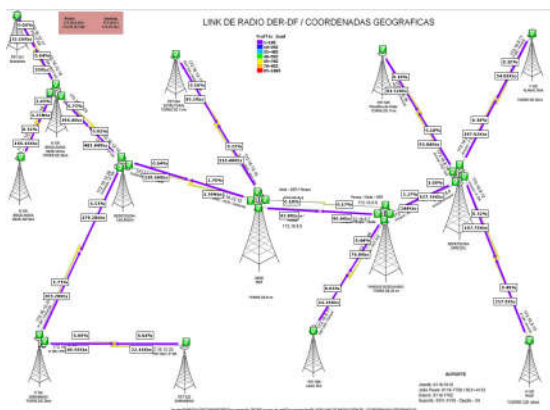

Programas de Trabalho:

26.122.2800.8517.0014 (2011)

26.122.6010.2557.2569 (2013/2014/2015)

26.126.6001.2557.2569 (2016)

Etapa 6 SAG 2016

Nº do Processo: 113.000.559/2011

Nº do Contrato: 025/2011

Empresa: Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda.

Data de início: 21/11/2011

Data prevista de conclusão: 20/11/2017

(Oitavo Aditivo)

Valor: R\$ 306.175,68 (Quarto Aditivo)

Recurso: Fonte 100 e 237 (Sétimo Aditivo)

Executor: Thiago Vinícius de Melo Almeida

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços especializados de engenharia, contemplando a manutenção de sistema de comunicação de dados com todos os equipamentos de infraestrutura e serviços necessários para interligação das Unidades que compõem o complexo administrativo do DER/DF e BPRv (Batalhão de Policiamento Rodoviário). Farão parte da prestação dos serviços a manutenção, inspeção periódica dos rádios e switches e manutenção das torres de comunicação de micro-ondas que interligam os 5 Distritos Rodoviários e os postos do BPRv com a sede do Órgão.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:

Foi realizada manutenção da conexão nos equipamentos do 1ºDR, repetidora Ceilândia e na repetidora Arrozal. Concluída Etapa 2016.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Foram realizados os seguintes serviços:

- Upgrade dos equipamentos de rádio frequência das unidades 1DR, 4DR e Posto policial 535.
- Manutenção dos serviços de comunicação das unidades 1DR, 3DR e 5DR e posto policial 534.
- Realização de monitoramento de performance da comunicação nas unidades 1DR, 4DR e Posto policial 534.
- Habilitação do serviço de monitoramento nos equipamentos do 1DR, 4DR e Posto policial 535.
- Inclusão do posto do BPTRAN localizado na DF-010.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,67%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,67%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída





Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001 – Etapa 11 SAG 2015
 26.782.6217.2541.0001 – Etapa 15 SAG 2016
 N° do Processo: 113.001.225/2008
 N° do Contrato: 028/2011
 Empresa: Engebrás S/A Indústria, Comércio e Tecnologia de Informática
 Data de Início: 23/12/2011
 Data prevista de conclusão: 23/12/2017 (Oitavo Aditivo)
 Valor: R\$ 21.979.430,01 (Quinto Aditivo) + R\$ 982. 174,71 (Oitavo Aditivo).
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Eng.º Murilo de Melo Santos

DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO: Monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:
 Executado 17% no bimestre. Acumulado 100%. Concluída Etapa 2016.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Andamento normal



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo) - Etapa 12 SAG 2015
 26.782.6217.2541.0001 – Etapa 16 SAG 2016
 N° do Processo: 113.003.563/2014
 N° do Contrato: 060/2014
 Empresa: Lig Móvil Telecomunicações Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 29/09/2014
 Data prevista de conclusão: 28/09/2017
 (Quarto Aditivo)
 Valor dos Serviços: R\$ 1.146.696,00
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Rafael Modé Luma e Daniel dos Santos Sampaio (substituto)
 IS, 03/03/2016

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de serviço móvel especializado (SME) do tipo sistema troncalizado digital tecnologia tetra para locação de equipamentos para Gerência de Controle Operacional da Diretoria de Fiscalização de Trânsito da Superintendência de Trânsito do DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM 2016:

Processo na DIOFI para liquidação das faturas de outubro, novembro e dezembro.

Total Geral pago = R\$ 836.550,00 (Referente aos meses de janeiro a setembro de 2016).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM 2017:

(1º Bimestre) Processo encaminhado à DIOFI para quitação da fatura referente ao mês de fevereiro no valor total de R\$ 93.086,00.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%	%	%	%	%

Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%
---	---	---	---	---	---

Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0001
 Etapa 11 SAG 2015/ Etapa 15 SAG 2016
 Nº do Processo: 054.001.403/2011-113.001.179/2011
 Nº do Convênio: 001/2012
 Conveniado: Polícia Militar do Distrito Federal
 Data de Início: 11/05/2012
 Data prevista de conclusão: 21/05/2017
 Recurso: Fontes 237, 437, 331 (Primeira Apostila)
 Programa de Trabalho da Descentralização:
 06.181.6217.3029.9511 (UO 24.103)
 Data de Início da Vigência: 01/09/2016
 Data do término da vigência: 31/12/2016
 Valor: R\$ 1.283.163,40
 Recurso: Fonte 331
 Executor: Márcio Corrêa Soares

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:
 Executado 17% no bimestre. Acumulado 100%. Concluída Etapa 2016.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Serviços de fiscalizações de Trânsito e apoio nas atividades operacionais nas rodovias distritais na modalidade Cooperação recíproca sem ônus para os convenientes, ficando apenas repasse dos valores arrecadados com multas na proporção de 50% descontados os encargos e despesas diversas.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
17 %	%	%	%	%	%	Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
17%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

SERVIÇO INTEGRADO MÓVEL PARA GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2541.0004 (Terceiro Aditivo)
 26.782.6217.2541.0004 – Etapa 16 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.011.356/2013
 Nº do Contrato: 014/2014
 Empresa: OI Móvel S.A (Primeiro Aditivo)
 Data da Assinatura do Contrato: 28/03/2014
 Data prevista de conclusão: 10/06/2017
 (Terceiro Aditivo)
 Valor anual: R\$ 1.398.795,84 (Terceiro Aditivo)
 Recurso: Fonte 237/437
 Executor: Afonso Guilherme Dutra

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Serviço Integrado Móvel para Gestão de Trânsito e Mobilidade – SIMGT, incluindo serviços de instalação, suporte técnico e repasse de conhecimentos para atender a necessidade do DER/DF. Equipamento do tipo celular que utiliza rede de telefonia e de internet para comunicação interna, consulta de veículo e habilitação, registro de infrações de trânsito (on line), registro de ocorrência de acidente de trânsito, emissão de ficha de missão e relatórios voltados para a fiscalização de trânsito e demais funções afins à autarquia.


AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:

Novembro – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

Dezembro – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Prestação dos serviços dentro da normalidade.

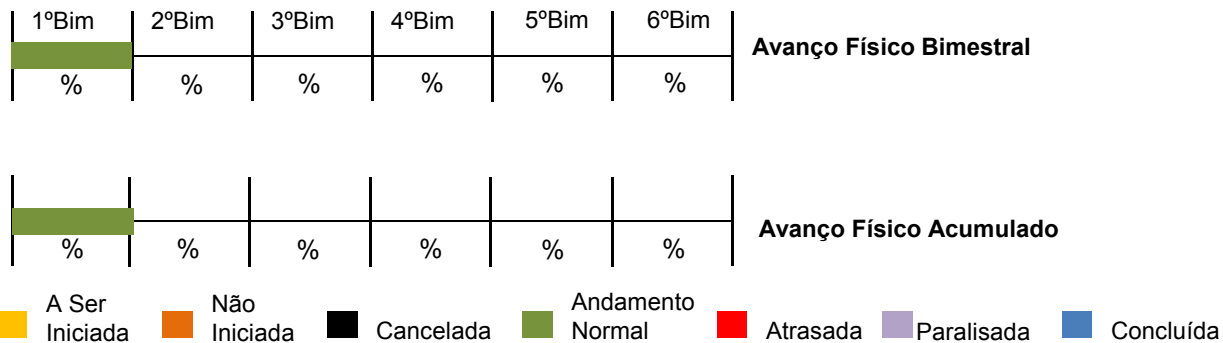

MONITORAMENTO E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO



Programa de Trabalho:

26.782.6215.2541.0001 - Etapa 11 SAG 2015

26.782.6217.2541.0001 Etapa 15 SAG 2016

Nº do Processo: 113.001.811/2009

Nº do Contrato: 041/2014

Empresa: Eliseu Kopp & Cia. Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2014

Data prevista de conclusão: 24/06/2019 (Quarto Aditivo)

Valor estimado para novo período: R\$ 8.163.308,40 (Quarto Aditivo)

Recurso: Fonte 237

Executor: Eng.º Darione José Maria Cavalcanti de Oliveira


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços de monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos instalados em pontos definidos no Edital da Concorrência nº 008/2010. Complementarmente, deverão ser elaborados inventários, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos, com expedição concomitante de relatório individual para emissão de autos de infração e notificação, utilizando medidores eletrônicos de velocidade fixos de operação autônoma.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:

Andamento normal.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Andamento normal.

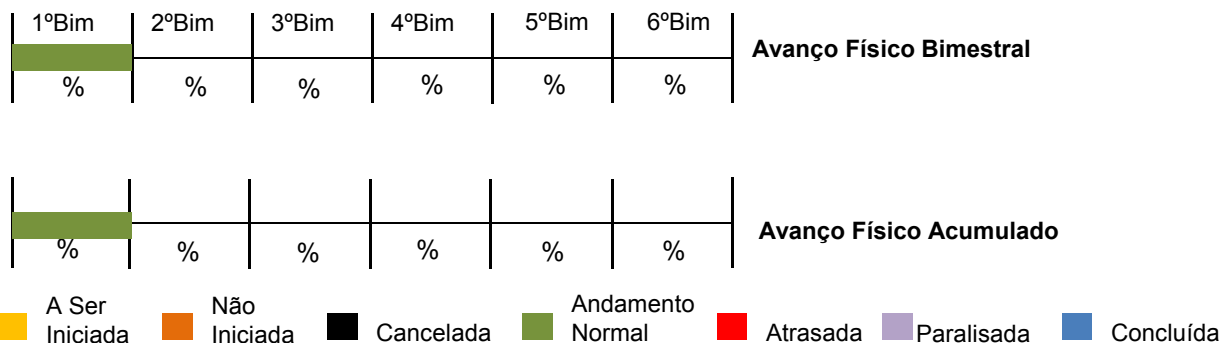

**PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO,
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE
ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS**



Programa de Trabalho:
26.782.6217.2541.0001
Nº do Processo: 113.017.091/2015
Nº do Convênio de Cooperação: 002/2015
Conveniado: Departamento de Trânsito do
Distrito Federal - DETRAN/DF
Data da Assinatura do Convênio: 24/11/2015
Data prevista de conclusão: 14/05/2018
Recurso: Fontes 237, 437
Executor: Eng.º Juliana Soares das Neves

DESCRIÇÃO DO OBJETO: O presente Convênio de Cooperação Recíproca tem por objetivo a execução pelo DER/DF e pelo DETRAN/DF das atividades de Fiscalização de Trânsito nas rodovias integrantes do Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF e nas vias urbanas, bem como atividades de Educação de Trânsito, Engenharia de Tráfego, Estatísticas de Acidentes de Trânsito, Monitoramento Aéreo das Rodovias, Processamento Eletrônico de Multas, visando a aumentar a segurança e a melhoria das condições de trânsito no Distrito Federal, observando-se as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e demais normas pertinentes.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:

Executado 23,92% no bimestre. Acumulado 119%. As atividades realizadas foram:

- Fiscalização de Trânsito (Remoção de Veículos): **Novembro:** Quant = 0; Valor = R\$ 0,00. **Dezembro:** Quant. = 0; Valor = R\$ 0,00.
- Processamento Eletrônico de Multas: **Novembro:** Quant = 82.879,00; Valor = R\$ 1.201.745,50. **Dezembro:** Quant = 91.263; Valor = R\$ 1.323.316,20. Valor final do Convênio em 2016: R\$ 14.556.478,20 (O valor inicial previsto era de R\$ 12.000.000,00). Concluída Etapa 2016.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Executado 14,70% no bimestre. Acumulado 14,70%. As atividades realizadas foram:

Fiscalização de Trânsito (Remoção de Veículos): Janeiro: Quant = 21; Valor = R\$ 17.222,00. Fevereiro: Quant. = 91; Valor = R\$ 35.694,00.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
14,70 %	%	%	%	%	%	Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
14,7%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO



Programas de Trabalho: 26.782.6217.2541.0001

Nº do Processo: 113.002.947/2016

Nº do Contrato: 036/2016

Empresa: Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

Data de início: 28/12/2016

Data prevista de conclusão: 28/06/2019

Valor: R\$ 10.800.000,00

Recurso: Fonte 237 e/ou 437

Executor: Eng.º Cristiano Alves Cavalcante

(Titular), Eng.º Viviane Coelho de Castro



(Suplente) e Jesse Gouvea de Oliveira (Suplente)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços especializados de tecnologia da informação para provimento da Solução Integrada de Gestão de Infrações de Trânsito – RADAR.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Realizado 17% no 1º Bimestre.

Processo de pagamento encaminhado para DIOFI referente aos períodos de 01/01/2017 a 20/01/2017, no valor de R\$ 144.702,00, e 21/01/2017 a 20/02/2017 no valor de R\$ 917.622,00.



■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programas de Trabalho:
 26.782.6217.2904.0001
 Nº do Processo: 113.003.588/2016
 Nº do Contrato: 021/2016
 Empresa: Hot Cozinha Industrial Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 11/07/2016
 Data prevista de conclusão: 12 meses
 Valor: R\$ 153.600,00
 Recursos: Fonte 237
 Executora: Jucianne Batista Nogueira de Oliveira
 e Kein Yon Ko (suplente)
 IS de 18/07/2016



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de lanche para a Escola Vivencial de Trânsito – Transitolândia, com entregas diárias de segunda-feira à sexta-feira, a critério do DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:

No 6º Bimestre, referente aos meses de novembro e dezembro, foram atendidas pela Transitolândia 4.035 crianças e 305 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 38 escolas receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo DER para viabilizar a chegada dessas crianças aos locais em que a Transitolândia se encontrava, utilizando o contrato no valor de R\$ 16.464,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

No 1º Bimestre, referente aos meses de janeiro e fevereiro não houve atendimento na Transitolândia.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.2904.0001 - Etapa 14 SAG 2015
 26.782.6217.2904.0001 - 2016
 Nº do Processo: 113.012.201/2013
 Nº do Contrato: 012/2014
 Empresa: Travel Bus Ltda - Me
 Data de Início: 24/03/2014
 Data prevista de conclusão: 23/03/2017
 (Segundo Aditivo)
 Valor: R\$ 626.740,35 (Segundo Aditivo)
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Jucianne Batista Nogueira de Oliveira
 Kein Yon Ko (suplente)
 (IS de 24/11/2015)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviço de transporte de crianças a serem atendidas pela Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia) do DER-DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:

No 6º Bimestre, referente aos meses de novembro e dezembro, foram atendidas pela Transitolândia 4.035 crianças e 305 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 38 escolas receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo DER para viabilizar a chegada dessas crianças aos locais em que a Transitolândia se encontrava, utilizando o contrato no valor de R\$ 53.973,00.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:


No 1º Bimestre, referente aos meses de janeiro e fevereiro não houve atendimento na Transitolândia.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
0%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
0%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TRECHOS DO SRDF – LOTE 1

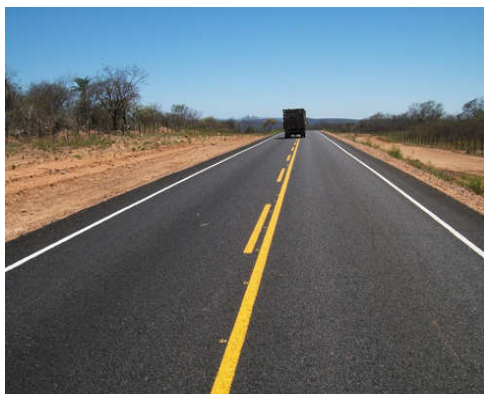

Programa de Trabalho:
 26.782.6217.4197.0001 – Etapa SAG 17 2016
 Nº do Processo: 113.007.572/2013
 Nº do Contrato: 001/2016
 Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 25/01/2016
 Data do Recebimento da IS: 11/02/2016
 Data prevista de conclusão: 06/05/2017
 (1º Termo Aditivo)
 Valor: R\$ 3.043.293,27
 Recurso: Fonte 237
 Executor Titular: Eng.º Guilherme José da Fonseca Berniz e Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva (suplente)
 IS, 11/02/2016

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução da sinalização horizontal, em, vários trechos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, definido como Lote 1 – 1º Distrito Rodoviário, 4º Distrito Rodoviário e 5º Distrito Rodoviário, tudo conforme especificações nos termos do Edital de Concorrência nº 006/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 30%.


AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Executado 6,5% no bimestre. Acumulado 36,5%. Início da revitalização da sinalização horizontal da DF-130, Trecho DF-250/BR-251. Colocação de tachinhas na DF-128, Trecho BR-020/DF-230. Colocação de tachinhas na DF-205, Trecho DGO/DGO. Início e Término da revitalização da sinalização horizontal na DF-442, Trecho DF-440/DF-001.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
6,5%	%	%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
36,5%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TRECHOS DO SRDF LOTE 2

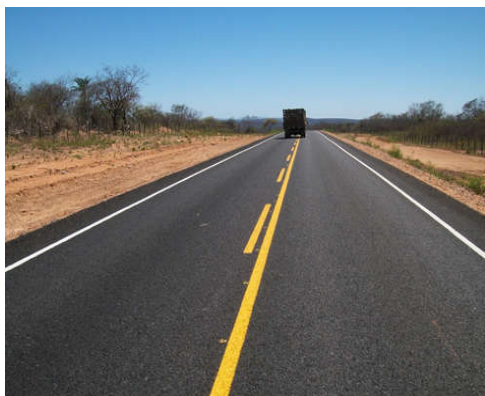

Programa de Trabalho:
26.782.6217.4197.0001
Nº do Processo: 113.000.864/2016
Nº do Contrato: 002/2016
Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
Data da Assinatura do Contrato: 25/01/2016
Data do Recebimento da IS: 11/02/2016
Data prevista de conclusão: 06/05/2017 – Segundo Termo Aditivo)
Valor: R\$ 5.688.920,63 + R\$ 1.028.292,56 (Primeiro Aditivo) = R\$ 6.717.213,19
Recurso: Fonte 237
Executor Titular: Eng.º Guilherme José da Fonseca Berniz e Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva (suplente)
IS, 11/02/2016

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução da sinalização horizontal, em, vários trechos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, definido como Lote 2 – 2º Distrito Rodoviário, 3º Distrito Rodoviário, tudo conforme especificações nos termos do Edital de Concorrência nº 006/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:
Executado 0%. Acumulado 35%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
Executado 1,5%. Acumulado 36,5%.
Colocação de tachinhas na DF-205, Trecho DF250/DF-201 e Trecho DF-150/Km 16. Continuação da remoção na DF-003 (EPIA), Trecho DF-051/BR-040.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
1,5%	%	%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
36,5%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO OPERADO PELO DER-DF



Programa de Trabalho:
 26.782.6217.4198.0001
 Nº do Processo: 113.013.854/2016
 Nº do Contrato Emergencial: 024/2016
 Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 01/09/2016
 Data prevista de conclusão: 28/02/2017
 Valor: R\$ 808.758,48
 Recurso: Fonte 237
 Executor: Eng.º Carlos Alberto Mundim Pena

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico operados pelo DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:
 Executado 33% no bimestre. Acumulado 66%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Executado 34% no bimestre. Acumulado 100%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
34 %	%	%	%	%	%	Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
100 %	%	%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE PAINÉIS DE MENSAGENS MÓVEIS



Programa de Trabalho:
 26.782.6215.3209.0001 (Segundo Aditivo)
 Etapa 12 SAG 2015
 26.782.6217.3209.0001 – Etapa 41 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.009.643/2013
 Nº do Contrato: 066/2014
 Empresa: Talentech-Tecnologia Ltda.
 Data de Início: 15/12/2014
 Data prevista de conclusão: 15/12/2017 (Terceiro Aditivo)
 Valor Anual: R\$ 3.291.836,40 (Segundo Aditivo)
 Recurso: Fonte 237 (Segundo Aditivo)
 Executora: Eng.º Tainá de Aguiar Botelho

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento, implantação, manutenção e suporte técnico de painéis de mensagens variáveis e sistema de informação e orientação aos usuários, em tempo real e repasse de conhecimento para atender às necessidades do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:

Em novembro operaram 30 painéis com gasto de R\$ 272.576,50. Em dezembro operaram 30 painéis com gastos de R\$ 274.319,70.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Em janeiro operaram 30 painéis com gasto de R\$ 301,567,43. Em fevereiro operaram 30 painéis com gastos de R\$ 304.532,25.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL



Programa de Trabalho:

26.782.6217.3209.0001 - Etapa 41 SAG 2016

Nº do Processo: 113.002.964/2014

Nº do Contrato: 011/2016

Empresa: SINASC – Sinalização e Construção de Rodovias Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 29/04/2016

Data do recebimento da IS: 11/05/2016

Data prevista de conclusão: 09/03/2017 (Segundo Aditivo)

Valor: R\$ 2.457.298,59

Recurso: Fonte 237

Executor: Eng.º Guilherme José da Fonseca Berniz

Substituto: Eng.ª Tainá de Aguiar Botelho

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução da instalação de sinalização vertical do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Cc nº 001/2015.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:

Executado 2% no bimestre. Acumulado 99%. Executados os serviços de administração local, obras complementares nos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Distritos Rodoviários, referentes às defensas metálicas, sinalização nos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Distritos Rodoviários, referentes às placas, pórticos e semipórticos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:


Executado 0% no bimestre. Acumulado 99%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
0 %	%	%	%	%	%	Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
99%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

PAVIMENTAÇÃO VC-533, LIGAÇÃO DE BRAZLÂNDIA A PADRE LÚCIO

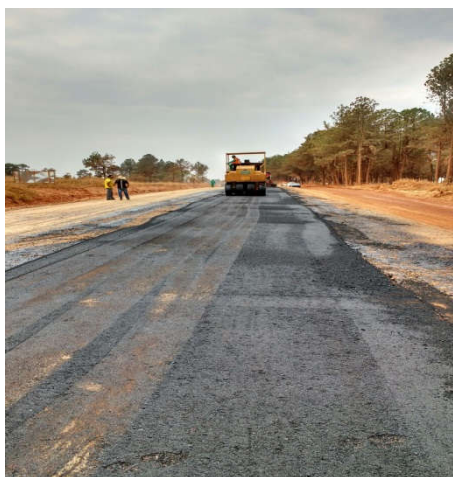

Programa de Trabalho:

28.782.6216.1475.1199

Etapa 16 SAG 2017/Etapa 28 SAG 2016

Nº do Processo: 113.005.439/2012

Nº do Contrato: 039/2013

Empresa: NG Engenharia e Construções Ltda.

Data da assinatura do contrato: 22/11/2013

Data do recebimento da IS: 26/09/2014

Data prevista de conclusão: Paralisado até 14/04/2017 (Décimo Quarto Aditivo)

Valor: R\$ 5.405.070,40 +

R\$ 1.299.126,98 (Quarto Aditivo) +

R\$ 561.300,44 (Nono Aditivo) + R\$ 723.900,89 (12º Aditivo) = R\$ 7.989.398,71

Recurso: Fonte 100, 135 (Terceiro Aditivo), 335 (Oitavo Aditivo)

Executor: Engº Antônio Gomes da Silva Filho

População da RA IV: 50.490

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução de obras para pavimentação de toda a extensão da rodovia vicinal VC-533, além de implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre o seu entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF/180 e a divisa com estado do Goiás (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio). Extensão de 3,852 km. Cc nº 005/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 75%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Obra paralisada a espera da construção de Ponte sobre o Rio Descoberto na VC-533 Brazlândia - Divisa DF/GO.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Bimestral

%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-001 (EPCT), TRECHO KM 119,3 AO KM 131,8 – LAGO OESTE



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1475.1199
 Etapa 29 SAG 2017/Etapa 35 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.011.751/2014
 Nº do Contrato: 003/2016
 Empresa: EPC Projetos e Construções Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 16/02/2016
 Data prevista de conclusão: 28/01/2017
 (Terceiro Aditivo)
 Valor inicial: R\$ 6.753.902,84 + R\$ 2.624.908,10
 (quarto Termo Aditivo) = R\$ 9.378.810,94
 Recurso: Fontes 148 e 348 (Primeiro Aditivo)
 Executor: Eng.º Paulo Robert Santos Machado

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução das obras de restauração da rodovia DF-001 (EPCT), entroncamento da DF-170 ao entroncamento BR-010/020/030/450/DF-001/003/150-Parque Rodoviário do DER/DF, trecho compreendido do km 119,3 ao km 131,8 (Lago Oeste – 1ª Etapa), incluídos os serviços de sinalização vertical e horizontal, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 11/2014. Extensão de 12,52 km.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:
 Executado 1%. Acumulado 99%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Aguardando entrega do Termo Definitivo da obra.


1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
0 %	%	%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
99 %	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

CONSULTORIA EM ENGENHARIA

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

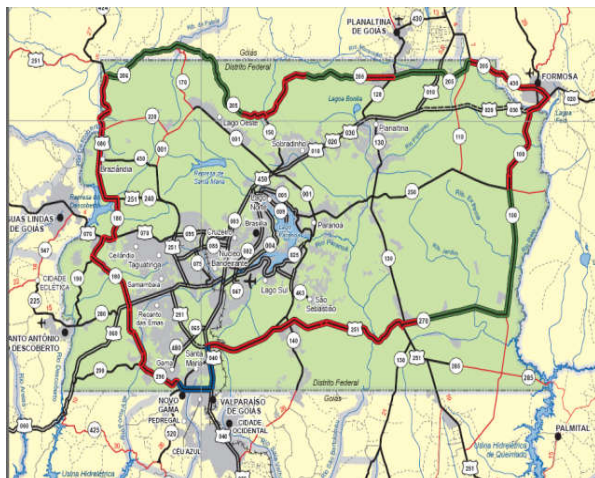

Programa de Trabalho: 26.782.6216.1968.0013
 Etapa 34 SAG 2017/Etapa 34 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.000.942/2014
 Nº do Contrato: 006/2015
 Empresa: Strata Engenharia EIRELI
 (Segundo Aditivo)
 Data da Assinatura do Contrato: 15/06/2015
 Data do Recebimento da IS: 29/06/2015
 Data prevista de conclusão: 03/07/2017 (Quarto Aditivo)
 Valor inicial: R\$ 7.151.845,29
 Recurso: Fonte 135, 335 (Apostila)
 Executores: Geol. Wellington Rodrigues dos Santos,
 Eng.º Stênio Fonseca da Costa e Eng.º Willkerson
 Victor da Silva (Instrução de Serviço nº 136,
 22/07/2015)
 População das RA's VI, VII, XIV, XIII, II, XV, XII,
 IX, IV, V e XXVI: 1.620.965

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Contratação de empresa de consultoria em engenharia para análise e adequações nos produtos oriundos do contrato 040/2008 e a elaboração dos projetos básico e executivo para implantação do Anel Viário do Distrito Federal conforme Edital de Concorrência nº 002/2014.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 32,48%. Serviço sem possibilidade de avanço, pois a Comissão Executora aguarda a apresentação do Relatório do Projeto Básico de Implantação da rodovia Contorno de Formosa (Produto C2 da Fase C), de modo a possibilitar nova apreciação do Produto, com vistas a aprovação integral. A Comissão Executora emitiu parecer favorável a aprovação com ressalvas do Volume 3 - Orçamento Básico das Obras das Rodovias Contorno de Formosa; DF-001; GO-430; BR-070 e BR-251.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 32,48%. A empresa Contratada apresentou os Relatórios dos Projetos Básicos de Melhoramentos e Adequações das Rodovias DF-100, DF-270 e Contorno de Formosa para reavaliação da Comissão Executora, com vistas à aprovação integral dos Produtos. A Comissão Executora solicitou um valor de empenho/2017 de R\$ 4.829.577,43.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
0%	%	%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
32,48%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA PAVIMENTAÇÃO DA DF-285, TRECHO KM 16,3 e KM 27,2



Programa de Trabalho:
26.782.6216.3711.6161
Etapa 37 SAG 2017/Etapa 10 SAG 2016
Nº do Processo: 113.012.231/2015
Nº do Contrato: 004/2016
Empresa: EXTREMA CONSTRUÇÃO LTDA.
Data da Assinatura do Contrato: 08/03/2016
Data do recebimento da IS: 09/03/2016
Data prevista de conclusão: 09/02/2017 (Segundo Aditivo)
Valor: R\$ 131.554,59
Recurso: Fonte 100
Executores: Geo. Luciano dos Santos, Geol. Maria Dulcineia Xavier Nunes e Eng.^a Patrícia Marc C. M. Milhomem


DESCRIÇÃO DO OBJETO: Elaboração do Plano de Controle Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD para o obra de pavimentação da DF-285, Trecho: Km 16,3- km 27,2 (Divisa de MG).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 40%. Não houve avanço físico no bimestre, pois o DER aguarda análise do IBRAM para o estudo encaminhado em 26/07/2016.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Não houve avanço físico no bimestre, pois se aguarda análise do IBRAM para o Estudo encaminhado em 26/07/2016. Reiterado o pedido de análise, por meio do Ofício Nº 112/2017 – DG (Sisdoc Nº 2248/17).

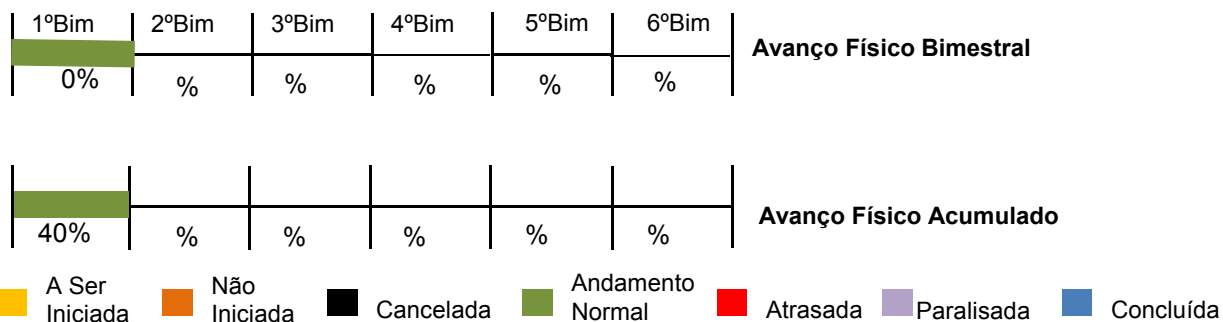

ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA PAVIMENTAÇÃO DA DF-001 (DF-430/DF-170)



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.3711.6161
 Etapa 38 SAG 2017/Etapa 46 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.018.219/2014
 Nº do Contrato: 007/2016
 Empresa: ECOTECH Tecnologia Ambiental e Consultoria Ltda.
 Data da Assinatura do Contrato: 11/03/2016
 Data do recebimento da IS: 04/04/2016
 Data prevista de conclusão: Paralisado até 23/03/2017 (Segundo Aditivo)
 Valor: R\$ 68.695,68
 Recurso: Fonte 100
 Comissão Executora: Geo. Geol. Wellington Rodrigues dos Santos, Geol. Maria Dulcineia Xavier Nunes e Eng.^a Patrícia Marc C. M. Milhomem (IS nº 137, 27/06/2016- DODF nº 122, 28/06/2016)

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Elaboração do Plano de Controle de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD para o obra de pavimentação da DF-001, incluindo a construção de ponte de concreto sobre o Rio da Palma, trecho: DF-430 entr. DF-415/ entr. DF-415 entr./ DF-220 entr. DF-220- entr. DF-170. Convite nº 001/2015.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:

Executado 0% no Bimestre. Acumulado 0%. Serviço sem possibilidade de avanço (aguardando elaboração de projeto pelo DER).

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Executado 0% no Bimestre. Serviço sem possibilidade de avanço (aguardando elaboração de projeto pelo DER).

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
0%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Bimestral

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
0%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

GERENCIAMENTO AMBIENTAL E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DO CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO EIXO SUL



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.1226.0001
 Etapa 8 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.005.547/2013
 Nº do Contrato: 009/2016
 Empresa: STE Serviços Técnicos de Engenharia S/A
 Data da Assinatura do Contrato: 07/04/2016
 Data de Recebimento da IS: 15/04/2016
 Data prevista de conclusão: 05/04/2018
 (Segundo Aditivo)
 Valor: R\$ 3.658.938,70 – R\$ 1.280.628,55
 (Primeiro Aditivo)= R\$ 2.378.310,15 + R\$ 257.803,47 (Segundo Aditivo) = R\$2.636.113,62
 Recurso: Fonte 335
 Comissão Executora: Eng.^a Patrícia Marc C. M. Milhomem; Geol. Maria Dulcinéia Xavier Nunes e Eng.^o Paulo Roberto da Silva (IS, 12/04/2016)

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Gerenciamento Ambiental dos Programas Ambientais do Corredor de Transporte Público Coletivo Eixo Sul, ligação das cidades do Gama e Santa Maria ao Plano Piloto, na DF-480/DF-065/DF-040/DF-003/DF-025/DF-047 e acesso ao Terminal Asa Sul. Tudo conforme os anexos do Edital da Concorrência Nº 009/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:
 Executado 12,4% no bimestre. Acumulado 25,6%.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Executado 0,0 % do Serviço no 1º Bimestre de 2017, permanecendo 25,6%, o mesmo do 6º Bimestre de 2016.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
25,6%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E ENCARREGADO



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001
 Etapa 17 SAG 2015/Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.000.098/2013
 Nº do Contrato: 045/2014
 Empresa: Interativa Dedetização, Higienização e Conservação Ltda.
 Data de Início: 22/07/2014
 Data prevista de conclusão: 21/07/2017 (Sexto Aditivo)
 Valor estimado: R\$ 2.612.403,66 (Quinto Aditivo)
 Recurso: Fonte 100, 237, 437 (Terceiro Aditivo), 220 e 420 (Primeira Apostila)
 Executor: Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva
 Executor Substituto: Eng.º Bruno Sousa Almeida (IS nº 164, 15/07/2016)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação dos serviços especializados de conservação, limpeza e manutenção simples das rodovias do Distrito Federal, nos Distritos Rodoviários, unidades Administrativas e nas Regiões de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, sob a supervisão do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:
 Prestação de serviços em andamento normal..

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Renovação do Contrato por mais 6 (seis) meses, devendo encerrar-se em julho/2017.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
33%	%	%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
33%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001
 Etapa 17 SAG 2015/Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.004.578/2015
 Nº do Contrato: 009/2015
 Empresa: Centro Oeste Asfalto Ltda.
 Data de início: 16/07/2015
 Data prevista de conclusão: 16/07/2017
 (Terceiro Aditivo)
 Valor Inicial: R\$ 190.999,90 (Terceiro Aditivo)
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Eng.º Luiz Geraldo Rangel Vilela

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento parcelado de 100 toneladas de Emulsão Asfáltica Catiônica de Ruptura Rápida, tipo RR-2C.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:
 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C – 7,10%% em volume no bimestre.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-2C – 1,99% em volume no bimestre.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
1,99%	%	%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
1,99%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE




Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001 - Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.006.861/2015
 Nº do Contrato: 022/2016
 Empresa: HL Terraplenagem Ltda - EPP
 Data da Assinatura do Contrato: 29/07/2016
 Data prevista de conclusão: 31/07/2017
 Valor Inicial: R\$ 2.240.000,00
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Eng.º Mozer Teixeira de Castro e
 Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva (suplente).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento de 10.000 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ para atender às demandas emergências de tapa-buracos.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:
 Executado 20% no bimestre. Acumulado 35%. Fornecimento normal de massa asfáltica.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Houve o fornecimento normal de massa asfáltica por parte da contratada.

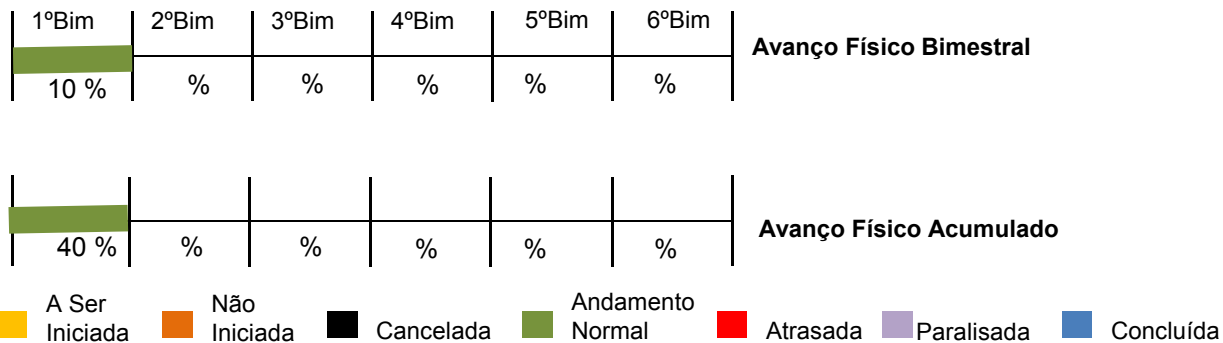

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001 - Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.007.779/2016
 Nº do Contrato: 023/2016
 Empresa: Centro Oeste Asfalto Ltda.
 Data de início: 05/09/2016
 Data prevista de conclusão: 04/09/2017
 Valor Inicial: R\$ 215.950,00
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Eng.º Luiz Geraldo Rangel Vilela

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento parcelado de 100 toneladas de Emulsão Asfáltica para imprimação (EAI) e impermeabilização de trechos a se recuperar e/ou pavimentar, de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal –SRDF, a ser utilizado pelo DER-DF.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:

Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação – 29,30% em volume no bimestre.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação (EAI). 0% (em volume).

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001 - Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.010.837/2016
 Nº do Contrato: 025/2016
 Empresa: Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda.
 Data de início: 30/09/2017
 Data prevista de conclusão: 29/09/2017
 Valor Inicial: R\$ 297.438,40
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Engº. Luiz Geraldo Rangel Vilela

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fornecimento parcelado de 160 toneladas de Emulsão Asfáltica tipo ruptura média RM -1C.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RM-1C – 15,84% em volume.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RM- 1C – 0% em volume.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

REMOÇÃO DE ENGENHOS PUBLICITÁRIOS E OCUPAÇÕES IRREGULARES DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS DO DF E DA RIDE



Programa de Trabalho:
 26.782.6216.4195.0001
 Etapa 17 SAG 2015/Etapa 12 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.005.021/2013
 Nº do Contrato: 012/2015
 Empresa: GB da Silva – Esquadrias & Equipamentos de Sinalização-EPP
 Data da Assinatura do Contrato: 03/08/2015
 Data prevista de conclusão: 28/07/2017
 (Primeiro Aditivo)
 Valor inicial: R\$ 953.610,96
 Recurso: Fonte 100, 220 ou 420 (Primeiro Aditivo)
 Executor: Hans Fernandes de Lemos



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Prestação de serviços do tipo remoção de engenhos publicitários e ocupações irregulares das faixas de domínio das rodovias do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno-RIDE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Edital de Pregão nº 042/2015.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:

Nesse bimestre foram apreendidos/recolhidos 17 outdoors, 08 front-light, 04 back-light, 02 triedros, 6.236 faixas, 345 banners, 08 mobiliários urbanos, 375 placas, 500 metros lineares de cerca/muro, interdição de 08 acessos, 02 quiosques, 233 barracas, 88 produtos comercializados irregularmente em veículos, 225 produtos comercializados à margem da rodovia, 03 depósito de materiais para construção e 02 trailer/reboques.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Durante esse bimestre foram apreendidos/recolhidos 14 outdoors, 01 front light, 8.682 faixas, 81 banners, 311 placas, 25 barracas e 146 produtos comercializados à margem da rodovia e 02 reboques.



A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA GETEC/SUTEC



Programa de Trabalho:

26.451.6010.3903.9710 – Etapa 36 SAG 2015

26.451.6001.3903.9710 – Etapa 23 SAG 2016

26.451.6001.3903.9710 – Etapa 10 SAG 2017

Nº do Processo: 113.008.694/2010

Nº do Contrato: 014/2015

Empresa: MULTICON Engenharia Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 24/08/2015

Data do recebimento da IS: 08/09/2015

Data prevista de conclusão: 30/04/2017 (Quarto Aditivo)

Valor: R\$ 621.938,62 + R\$ 136.515,53 = R\$ 758.454,15 + R\$ 161.023,64 (Terceiro Aditivo) = 919.477,79

Recurso: Fontes 100 , 420 e 220

Executor: Eng.º Elcy Ozório dos Santos

Substituto: Arq. Fabrício Ferreira Faiad

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução das obras de restauração de reforma do Edifício Sede da GETEC, localizado no Parque Rodoviário do DER-DF, Rodovia DF-001, km 0, Sobradinho-DF. TP nº 006/2011.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:

Executado 32% no bimestre. Acumulado 63,12%. (considerando 3º Termo Aditivo)

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 63,12%.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	
0%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Bimestral

63,12%	%	%	%	%	%	Avanço Físico Acumulado

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

**REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA
DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A
DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 01**



Programa de Trabalho:
26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)
Etapa 26 SAG 2015/Etapa 24 SAG 2016
Nº do Processo: 113.007.877/2012
Nº do Contrato: 018/2014
Empresa: Trier Engenharia Ltda.
Data de Início: 13/05/2014
Data prevista de conclusão: Reativado a partir de 25/04/2016 (14º Aditivo)
Valor: R\$ 32.679.197,28 + R\$ 655.000,00 (4º Aditivo)+ R\$ 6.568.563,91 (14º Aditivo) = R\$ 39.902.761,19
Recurso: Fontes 135, 100 (2º Aditivo), 231 (3º Aditivo), 900, 100 e 335 (14º Aditivo)
Executores: Eng.º Bruno Sousa Almeida, Eng.º. Geraldo Jacinto da Silva Filho e Eng.º Elcy Ozório dos Santos (Instrução nº 115, 20/05/2016, DODF nº 99, 25/05/2016)
População da RA V: 63.050

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 0,0 ao km 2,5, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 5,94%. Obra sem movimentação, aguardando projeto de drenagem, definição da quantidade de material de 2ª e 3ª categoria e da contenção que será usada no retorno.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Executado 1% no Bimestre, Acumulado 6,94%. Obra retornou a execução. Escavação e preparação da OAE 7 e 8. Compra dos semáforos para instalação dos desvios. Aguardando projeto de Drenagem. Autorização de escavação de material de 2ª categoria.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
1%	%	%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
6,94%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

**REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA
DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A
DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 02**



Programa de Trabalho:
26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)
Etapa 13 SAG 2017/Etapa 25 SAG 2016
Nº do Processo: 113.004.262/2014
Nº do Contrato: 021/2014
Empresa: Consórcio JM/Cidade
Data de Início: 14/05/2014
Data prevista de conclusão: Reativado a partir de 25/04/2016 (13º Aditivo)
Valor: R\$ 39.829.963,10 + R\$ 7.815.270,04 (13º Aditivo) + R\$ 5.739.511,71 (15º Aditivo) - R\$ 2.373.212,63 (16º Aditivo) = R\$ 51.011.532,22
Recurso: Fontes 135, 100 (2º Aditivo), 231 (4º Aditivo), 900, 131 e 335 (13º Aditivo), 231 (1ª Apostila)
Executores: Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva, Eng.º Geraldo Jacinto da Silva Filho e Eng.º Elcy Ozório dos Santos (Instrução nº 116, 20/05/2016, DODF nº 99, 25/05/2016)
Executor Substituto: Eng.º Bruno Sousa Almeida (IS nº 164, 15/07/2016)
População da RA V: 63.050

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 2,5 ao km 5,2, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 22,6% Devido às chuvas e indefinição de projetos executivos, as obras ficaram com ritmo lento.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:


Executado 0,3% no bimestre. Acumulado 22,9%. Reinstalação do canteiro de obras; Início da execução dos blocos de ancoragem da adutora da CAESB. Continuidade das fundações da OAE – 02 (Ribeirão do Torto).

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
0,3%	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
22,9%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída

IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE, REMODELAÇÃO DA PONTE DO BRAGHETTO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DF-002 (ERN) E DF-007 (EPTT)

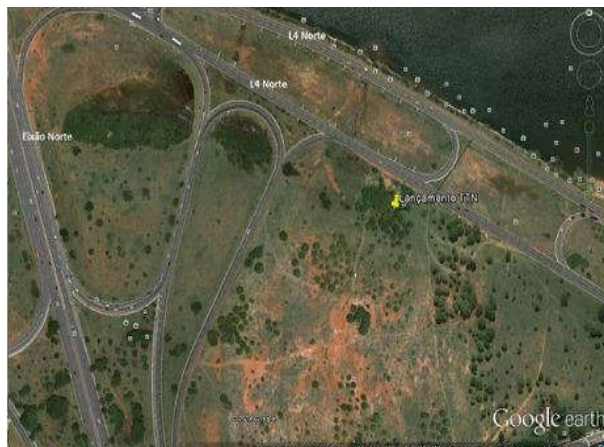

Programa de Trabalho:

26.782.6216.3056.0004 (10º Aditivo)

26.782.6216.1475.1199 (1º Aditivo)

Etapa 35 SAG 2017/Etapa 45 SAG 2016

Nº do Processo: 113.007.878/2012

Nº do Contrato: 025/2014

Empresa: Consórcio Via Engenharia/Conterc – Construção, Terraplenagem e Consultoria Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 26/05/2014

Data prevista de conclusão: Reativado a partir de 09/05/2016 (10º Aditivo)

Valor inicial: R\$ 79.632.741,77+R\$ 14.837.279,45 (10º Aditivo)+ R\$ 2.101.997,67 (11º Aditivo) = R\$ 96.572.018,08

Recurso: Fontes 135, 231 (1º Aditivo), 900, 100 e 335 (10º Aditivo)

Executores: Eng.º Geraldo Jacinto da Silva Filho , Eng.º Paulo Robert Santos Machado e Eng.ª Patrícia Marc Cristiane de Menezes Milhomem (Instrução nº 117, 20/05/2016, DODF nº 99, 25/05/2016) (Instrução nº 181, 16/08/2016, DODF nº 155, 17/08/2016)

População das RA's XVIII e I: 250.607

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução de obras para Implantação do Trevo de Triagem Norte (TTN), remodelação da Ponte do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego em 2,1 km da rodovia DF-007 (EPTT), no trecho compreendido entre a DF-002 e o entroncamento com a DF-003/BR-450 (Balão do Torto), e em 0,4 km da rodovia DF-002 (ERN), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-007 (ponte do Braghetto) até o acesso às vias W1/W3, execução de estrutura cicloviária, bem como a elaboração dos projetos executivos decorrentes das obras de artes especiais a serem implantadas e remodeladas. Cc nº 002/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:

Executado 2,7% no Bimestre. Acumulado 7,2%. Foi executada a OAE 9, 70% da OAE, iniciando OAE 10 e executando os serviços de terraplenagem das vias.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:


Executado 2,5% no Bimestre. Acumulado 11%. Execução da OAE 9W e OAE 9L, 50% executado OAE 10.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
2,5%	%	%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
11%	%	%	%	%	%	

■ A Ser Iniciada
 ■ Não Iniciada
 ■ Cancelada
 ■ Andamento Normal
 ■ Atrasada
 ■ Paralisada
 ■ Concluída

SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE, REMODELAÇÃO DA PONTE DO BRAGHETTO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DF-002 (ERN) E DF-007 (EPTT)

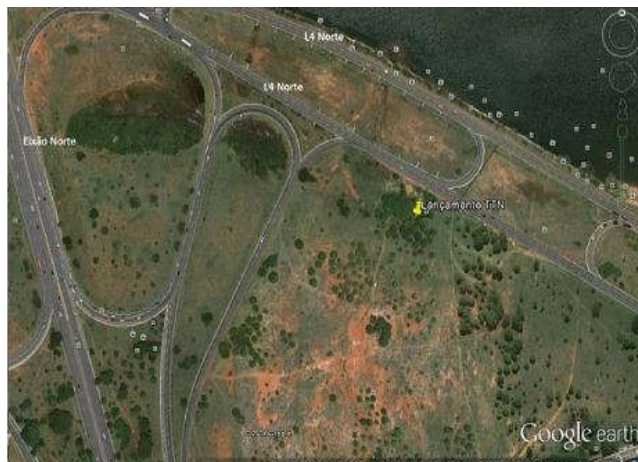

Programa de Trabalho:
 26.782.6216.3056.0004
 Etapa 36 SAG 2017/Etapa 55 SAG 2016
 Nº do Processo: 113.005.297/2013
 Nº do Contrato: 010/2016
 Empresa: STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A
 Data da Assinatura do Contrato: 14/04/2016
 Data do Recebimento da IS: 02/05/2016
 Data prevista de conclusão: 20/11/2018
 Valor inicial: R\$ 7.993.852,19
 Recurso: Fonte 100
 Executor: Eng.º Antônio Gomes da Silva Filho
 e Eng.º Kênio Márcio Avelar (suplente)
 IS 05/05/2016)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Supervisão das obras de implantação do Trevo de Triagem Norte (TTN), remodelação da ponte do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego nas rodovias DF-002 (ERN) e DF-007 (EPTT). Cc nº 008/2013.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:

Continua o acompanhamento dos serviços topográficos, laboratório, projetos de remanejamento de rede e questões relativas ao meio ambiente.

AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Andamento normal.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

						Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada
 Não Iniciada
 Cancelada
 Andamento Normal
 Atrasada
 Paralisada
 Concluída
