





Departamento de Estradas de Rodagem  
do Distrito Federal

GOVERNO DE  
BRASÍLIA



## Relatório de Atividades 2º Bimestre/2017

## SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO

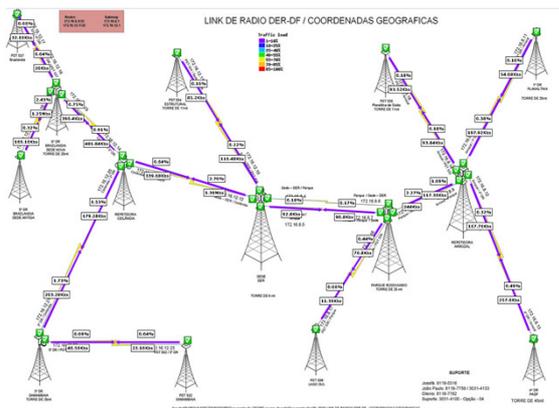

Programas de Trabalho:  
 26.122.2800.8517.0014 (2011)  
 26.122.6010.2557.2569 (2013/2014/2015)  
 26.126.6001.2557.2569 (2016)  
 Etapa 7 SAG 2017  
 Nº do Processo: 113.000.559/2011  
 Nº do Contrato: 025/2011  
 Empresa: Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda.  
 Data de início: 21/11/2011  
 Data prevista de conclusão: 20/11/2017  
 (Oitavo Aditivo)  
 Valor: R\$ 306.175,68 (Quarto Aditivo)  
 Recurso: Fonte 100 e 237 (Sétimo Aditivo)  
 Executor: Thiago Vinícius de Melo Almeida

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Serviços especializados de engenharia, contemplando a manutenção de sistema de comunicação de dados com todos os equipamentos de infraestrutura e serviços necessários para interligação das Unidades que compõem o complexo administrativo do DER/DF e BPRv (Batalhão de Policiamento Rodoviário). Farão parte da prestação dos serviços a manutenção, inspeção periódica dos rádios e switches e manutenção das torres de comunicação de micro-ondas que interligam os 5 Distritos Rodoviários e os postos do BPRv com a sede do Órgão.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Foram realizados os seguintes serviços:

- Upgrade dos equipamentos de rádio frequência das unidades 1DR, 4DR e Posto policial 535.
- Manutenção dos serviços de comunicação das unidades 1DR, 3DR e 5DR e posto policial 534.
- Realização de monitoramento de performance da comunicação nas unidades 1DR, 4DR e Posto policial 534.
- Habilitação do serviço de monitoramento nos equipamentos do 1DR, 4DR e Posto policial 535.
- Inclusão do posto do BPTRAN localizado na DF-010.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Foram realizados os seguintes serviços:

- Manutenção dos equipamentos de rádio transmissão do 1DR, PST 534 e PST535.
- Foi habilitado o protocolo de tempo para redes (NTP).
- Monitoramento do serviço de comunicação
- Testes de performance

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,67%	16,65%	%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
16,67%	33,32 %	%	%	%	%

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**


## RESTAURAÇÃO DA DF-001(EPCT) "CAMINHO PARA BRAZLÂNDIA"




Programas de Trabalho: 26.782.6216.1475.1199  
 Nº do Processo: 113.004.490/2017  
 Nº do Contrato: 006/2017  
 Empresa: HL Terraplenagem  
 Data de início: 23.03.2017  
 Data prevista de conclusão: 19.09.2017 (180 dias)  
 Valor: R\$ 11.649.997,42  
 Recurso: CIDE  
 Executor: Antônio Gomes da Silva Filho e Maria Luzia Ferreira (suplente)

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** execução das obras de restauração a rodovia distrital DF-001 (EPCT) - "Caminho de Brazlândia", no trecho compreendido entre o entroncamento BR-070/DF-095 (EPCL), até o entroncamento BR-080/BR-251 (B), com extensão aproximada de 9.070,00 m, sendo 540,00 m de trecho em pista dupla e 7.760,00 m em pista simples e, ainda 770,00 m de 03 (três) alças existentes: alça de ligação da DF-001 para a BR-070; alça de ligação da DF-095 para a DF-001 e alça de ligação da DF-001 para a DF-095 (operação de reversão da EPCL), incluindo acostamento em toda a extensão do trecho, em ambos os sentidos (exceto nas alças), abrangendo também os serviços de drenagem, baias de parada de ônibus e a sinalização horizontal e vertical.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Executado 10% no bimestre. Acumulado 10%.



**Avanço Físico Bimestral**



**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída


**RESTAURAÇÃO DA DF-001(EPCT) "CAMINHO PARA BRAZLÂNDIA**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

Continuação da terraplenagem e pavimentação.

## EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO ÀS ESCOLAS RURAIS

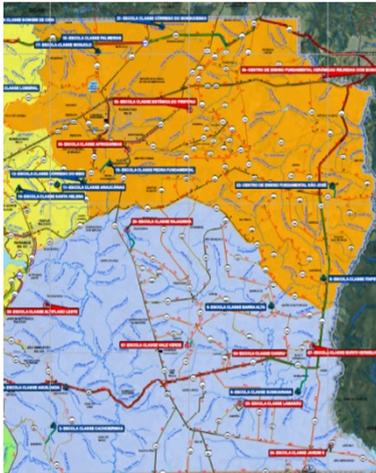


Programas de Trabalho: 26.782.6216.1968.0013  
 Nº do Processo: 113.013.043/14  
 Nº do Contrato: 028/2016  
 Empresa: GEOSERV Serviços de Geotecnia e Construção LTDA  
 Data de início: 14/12/2016  
 Data prevista de conclusão: 10/10/2017 (300 dias)  
 Valor: R\$ 3.264.008,36  
 Recurso: Fonte: 335  
 Executor: Ery do Nascimento Brandi, José Ricardo Almeida, Dan Imbroise Brant.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para execução da pavimentação de vias de acesso às Escolas Rurais “ Caminho das Escolas” (várias Rodovias Distritais e Vicinais do SRDF) - Lote 1.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Início dos serviços.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Fase inicial – Entrega de novo cronograma priorizando a entrega de rodovias por conjunto de escolas conforme orientação da Comissão Executora;  
 Elaboração dos estudos preliminares – Em elaboração.



**Avanço Físico Bimestral**



**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO ÀS ESCOLAS RURAIS

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 2º Bimestre de 2017:


- Nota de empenho foi emitida somente no dia 29/03/2017 – o que impossibilitou o andamento do projeto.
- A empresa esta solicitando aditivo de prazo para compensar os 112 dias parados devido a não consolidação do Empenho.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Aprovação de novo Cronograma.

Aguardamos manifestação do IBRAM quanto aos Termos de Referências para as rodovias constantes do Programa. O DER/DF já solicitou e reiterou estes pedidos.

## EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO ÀS ESCOLAS RURAIS

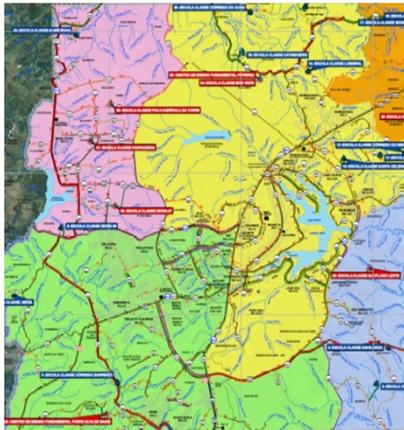

Programas de Trabalho: 26.782.6216.1968.0013  
 Nº do Processo: 113.013.043/14  
 Nº do Contrato: 029/2016  
 Empresa: ASTEC Engenharia Ltda  
 Data de início: 06/01/2017  
 Data prevista de conclusão: 17/11/2017 (315 dias)  
 Valor: R\$ 3.049.016,92  
 Recurso: Fonte: 335  
 Executor: Ery do Nascimento Brandi, José Ricardo Almeida, Dan Imbroise Brant.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para execução da pavimentação de vias de acesso às Escolas Rurais “ Caminho das Escolas” (várias Rodovias Distritais e Vicinais do SRDF) - Lote 2

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Início dos serviços.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Fase inicial – Entrega de novo cronograma priorizando a entrega de rodovias por conjunto de escolas conforme orientação da Comissão Executora;  
 Elaboração dos estudos preliminares – Em elaboração, material em análise.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
0 %	0 %	%	%	%	%

**Avanço Físico Bimestral**

0 %	0 %	%	%	%	%
-----	-----	---	---	---	---

**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE ACESSO ÀS ESCOLAS RURAIS

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 2º Bimestre de 2017:


- Nota de empenho emitida somente no dia 29/03/2017 – o que impossibilitou o andamento do projeto.
- Empresa aguardando aprovação do cronograma para solicitar aditivo de prazo.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Aprovação de novo Cronograma e avaliação dos produtos referentes aos Estudos Preliminares;

Aguardamos manifestação do IBRAM quanto aos Termos de Referências para as rodovias constantes do Programa. O DER/DF já solicitou e reiterou estes pedidos.

## CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA BR-020

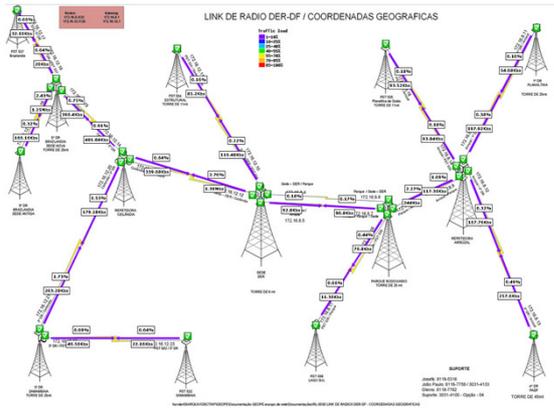

Programas de Trabalho: 26.782.6216.1347.9481  
 26.782.6216.1347.0002 (EP)  
 Nº do Processo: 113.008.665/2016  
 Nº do Contrato: 05/2017  
 Empresa: JPPP CONSTRUTORA LTDA  
 Data de início: 31/03/2017  
 Data prevista de conclusão: 28.08.2017 (150 dias)  
 Valor: R\$ 2.275.877,00  
 Recurso: Fonte: 100  
 Executor: Fábio Cardoso da Silva, Kênio Avelar

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Construção da Passarela em estrutura mista, a ser implantada na Rodovia BR-020, próximo ao Setor Habitacional Nova Colina – Sobradinho/DF.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Não houve avanço físico. Aguardando adequação do Projeto de Fundação.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim
%	%				

**Avanço Físico Bimestral**

%	%				
---	---	--	--	--	--

**Avanço Físico Acumulado**


A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

**CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA BR-020**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**


## CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO DESCOBERTO VC-533

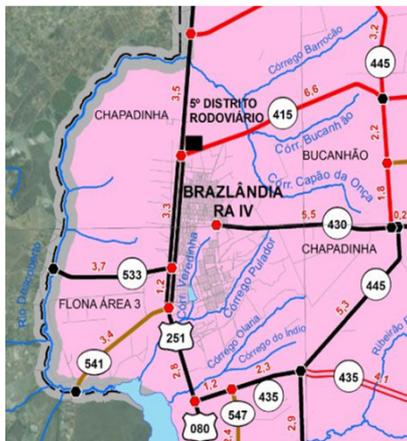


Programas de Trabalho: 26.782.6216.3361.4359  
 Nº do Processo: 113.013.549/2016  
 Nº do Contrato: 001/2017  
 Empresa: LEO & BORBA ENGENHARIA  
 Data de início: 01/03/2017  
 Data prevista de conclusão: 29/06/2017 (120 DIAS)  
 Valor: R\$ 1.300.131,23  
 Recurso: Fonte: CIDE  
 Executor: Antonio Gomes (Titular) e Maria Luzia (Suplente).

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** execução das obras para Construção de Ponte sobre o Rio Descoberto na VC-533 Brazlândia - Divisa DF/GO. Entroncamento BR-080/BR-251.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Executado 10,84% no bimestre. Acumulado 10,84%.



**Avanço Físico Bimestral**



**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO DESCOBERTO VC-533

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 2ª Bimestre de 2017: Publicação de Extrato de início de serviço, DODF nº 59, pág. 49, de 27/03/2017.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Conclusão da Infraestrutura e da Mesoestrutura.


## RESTAURAÇÃO DA DF-001(EPCT) "CAMINHO PARA BRAZLÂNDIA"



Programas de Trabalho: 26.782.6216.1475.1199  
 Nº do Processo: 113.004.490/2017  
 Nº do Contrato: 006/2017  
 Empresa: HL Terraplenagem  
 Data de início: 23.03.2017  
 Data prevista de conclusão: 19.09.2017 (180 dias)  
 Valor: R\$ 11.649.997,42  
 Recurso: CIDE  
 Executor: Antônio Gomes da Silva Filho e Maria Luzia Ferreira (suplente)

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** execução das obras de restauração a rodovia distrital DF-001 (EPCT) - "Caminho de Brazlândia", no trecho compreendido entre o entroncamento BR-070/DF-095 (EPCL), até o entroncamento BR-080/BR-251 (B), com extensão aproximada de 9.070,00 m, sendo 540,00 m de trecho em pista dupla e 7.760,00 m em pista simples e, ainda 770,00 m de 03 (três) alças existentes: alça de ligação da DF-001 para a BR-070; alça de ligação da DF-095 para a DF-001 e alça de ligação da DF-001 para a DF-095 (operação de reversão da EPCL), incluindo acostamento em toda a extensão do trecho, em ambos os sentidos (exceto nas alças), abrangendo também os serviços de drenagem, baias de parada de ônibus e a sinalização horizontal e vertical.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:** Executado 10% no bimestre. Acumulado 10% no bimestre. Execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação.



**Avanço Físico Bimestral**



**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada    
  Não Iniciada    
  Cancelada    
  Andamento Normal    
  Atrasada    
  Paralisada    
  Concluída

**RESTAURAÇÃO DA DF-001(EPCT)“CAMINHO PARA BRAZLÂNDIA”**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**  
Continuação da terraplenagem e pavimentação.

## SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 6º Bimestre de 2016:

- Reajuste contratual, no percentual de 7,8739%- IPCA. (DODF 237, pág. 51 de 19/12/2016).
- Renova (excepcionalmente) o contrato para o próximo período, devendo encerrar-se em 20/11/2017 (DODF nº 218, 21/11/2016).

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

I

## ENGEBRAS S/A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA





Programa de Trabalho:  
 26.782.6215.2541.0001 – Etapa 11 SAG 2015  
 26.782.6217.2541.0001 – Etapa 15 SAG 2016  
 N° do Processo: 113.001.225/2008  
 N° do Contrato: 028/2011  
 Empresa: Engebrás S/A Indústria, Comércio e Tecnologia de Informática  
 Data de Início: 23/12/2011  
 Data prevista de conclusão: 23/12/2017 (Oitavo Aditivo)  
 Valor: R\$ 21.979.430,01 (Quinto Aditivo) + R\$ 982. 174,71 (Oitavo Aditivo).  
 Recurso: Fonte 237  
 Executor: Eng.º Murilo de Melo Santos

**DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO:** Monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N).

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Andamento normal

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Andamento normal



A Ser Iniciada    
  Não Iniciada    
  Cancelada    
  Andamento Normal    
  Atrasada    
  Paralisada    
  Concluída

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

Trata-se de serviço de natureza contínua.

- 6º Bimestre de 2016: Renovação do prazo de vigência até doze meses (DODF nº 238, pág. 53, de 20/12/2016). Vencimento previsto para 23/12/17 ou até a data de entrada em vigor do novo contrato objeto da licitação em andamento pregão eletrônico nº 54/2016.
- 1º Bimestre de 2017: a partir de janeiro foi suprimido do objeto do contrato os serviços gráficos de impressão das notificações da autuação/penalidade que será, oportunamente, objeto de termo aditivo contratual.

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP



Programa de Trabalho:  
 26.782.6215.2541.0004 (Primeiro Aditivo) - Etapa 12 SAG 2015  
 26.782.6217.2541.0001 – Etapa 16 SAG 2016  
 Nº do Processo: 113.003.563/2014  
 Nº do Contrato: 060/2014  
 Empresa: Lig MóBILE Telecomunicações Ltda.  
 Data da Assinatura do Contrato: 29/09/2014  
 Data prevista de conclusão: 28/09/2017  
 (Quarto Aditivo)  
 Valor dos Serviços: R\$ 1.146.696,00  
 Recurso: Fonte 237  
 Executor: Rafael Modé Luma e Daniel dos Santos Sampaio (substituto)  
 IS, 03/03/2016

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Contratação de serviço móvel especializado (SME) do tipo sistema troncalizado digital tecnologia tetra para locação de equipamentos para Gerência de Controle Operacional da Diretoria de Fiscalização de Trânsito da Superintendência de Trânsito do DER-DF.


### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM 2017:

Processo encaminhado à DIOFI para quitação da fatura referente ao mês de fevereiro no valor total de R\$ 93.086,00.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM 2017:

Processo na DIFIS para reajustamento do contrato.

Quitação das faturas referentes aos meses de fevereiro no valor total de R\$ 93.086,00 e março no valor total de R\$ 93.086,00.



**Avanço Físico Bimestral**



**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada    
  Não Iniciada    
  Cancelada    
  Andamento Normal    
  Atrasada    
  Paralisada    
  Concluída

## LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 1º Bimestre de 2017: Prestação de serviços dentro da normalidade.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

## FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF



Programa de Trabalho:  
 26.782.6215.2541.0001  
 Etapa 11 SAG 2015/ Etapa 15 SAG 2016  
 Nº do Processo: 054.001.403/2011-113.001.179/2011  
 Nº do Convênio: 001/2012  
 Conveniado: Polícia Militar do Distrito Federal  
 Data de Início: 11/05/2012  
 Data prevista de conclusão: 11/05/2017  
 Recurso: Fontes 237, 437, 331 (Primeira Apostila)  
 Valor: R\$ 1.283.163,40  
 Recurso: Fonte 237, 437 e 331  
 Executor: Márcio Corrêa Soares


**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Serviços de fiscalizações de Trânsito e apoio nas atividades operacionais nas rodovias distritais na modalidade Cooperação recíproca sem ônus para os convenientes, ficando apenas repasse dos valores arrecadados com multas na proporção de 50% descontados os encargos e despesas diversas.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Serviços de fiscalizações de Trânsito e apoio nas atividades operacionais nas rodovias distritais na modalidade Cooperação recíproca sem ônus para os convenientes, ficando apenas repasse dos valores arrecadados com multas na proporção de 50% descontados os encargos e despesas diversas.

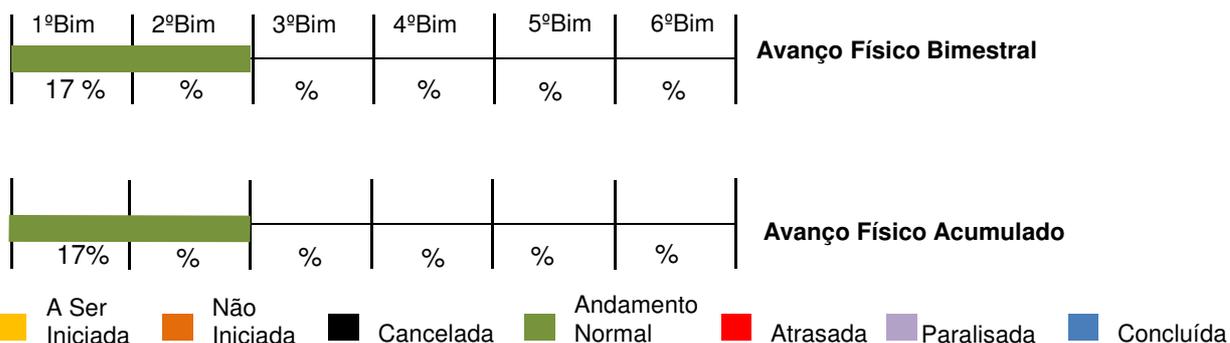

## FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 5º Bimestre de 2016: Publicada Portaria Conjunta nº 02, de 18 de outubro de 2016 para descentralização de crédito para fins de aquisição de material e equipamentos (viaturas operacionais), para o Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar do Distrito Federal, por meio de aditivo de 25% ao processo de aquisição que encontra-se em andamento no Departamento de Estrada e Rodagem - DER/DF, com recursos oriundos deste convênio celebrado entre a Polícia Militar do Distrito Federal e o Departamento de Estrada de Rodagem - DER/DF (DODF nº 198, 19/10/2016).
- 1º Bimestre de 2017: Sem alterações.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Por se tratar em sua maioria o objeto do convênio de Serviço Continuado, torna-se inviável projeção de ações futuras.

## SERVIÇO INTEGRADO MÓVEL PARA GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE



Programa de Trabalho:  
 26.782.6215.2541.0004 (Terceiro Aditivo)  
 Etapa 12 SAG 2015  
 26.782.6217.2541.0004 – Etapa 16 SAG 2016  
 N° do Processo: 113.011.356/2013  
 N° do Contrato: 014/2014  
 Empresa: OI Móvel S.A (Primeiro Aditivo)  
 Data da Assinatura do Contrato: 28/03/2014  
 Data prevista de conclusão: 10/06/2017  
 (Terceiro Aditivo)  
 Valor anual: R\$ 1.398.795,84 (Terceiro Aditivo)  
 Recurso: Fonte 237/437  
 Executor: Afonso Guilherme Dutra



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Serviço Integrado Móvel para Gestão de Trânsito e Mobilidade – SIMGTM, incluindo serviços de instalação, suporte técnico e repasse de conhecimentos para atender a necessidade do DER/DF. Equipamento do tipo celular que utiliza rede de telefonia e de internet para comunicação interna, consulta de veículo e habilitação, registro de infrações de trânsito (on line), registro de ocorrência de acidente de trânsito, emissão de ficha de missão e relatórios voltados para a fiscalização de trânsito e demais funções afins à autarquia.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Prestação dos serviços dentro da normalidade.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**

Março – Prestação dos serviços dentro da normalidade.

Abril – Prestação dos serviços dentro da normalidade.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## SERVIÇO INTEGRADO MÓVEL PARA GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 1º Bimestre de 2017 :

- Pagamentos em dia e prestação de serviços dentro da normalidade.
- Pagamento de janeiro R\$ 116.566,32 (312 licenças).
- Pagamento de fevereiro R\$ 116.566,32 (312 licenças).
- 180 licenças (agentes DER) = R\$ 67.249,80
- 132 licenças (BPRv) = R\$ 49.316,52

➤ 2º Bimestre de 2017 :

Pagamento de Março em dia, pagamento de Abril aguardando empenho para efetuar o pagamento. Prestação de serviços dentro da normalidade.

Pagamento de Março R\$ 116.566,32 (312 licenças).

Pagamento de Abril R\$ 116.566,32 (312 licenças).

→ 180 licenças (agentes DER) = R\$ 67.249,80

→ 132 licenças (BPRv) = R\$ 49.316,52

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

## MONITORAMENTO E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO





**Programa de Trabalho:**  
 26.782.6215.2541.0001 - Etapa 11 SAG 2015  
 26.782.6217.2541.0001 Etapa 15 SAG 2016  
**Nº do Processo:** 113.001.811/2009  
**Nº do Contrato:** 041/2014  
**Empresa:** Eliseu Kopp & Cia. Ltda.  
**Data da Assinatura do Contrato:** 25/06/2014  
**Data prevista de conclusão:** 24/06/2019 (Quarto Aditivo)  
**Valor estimado para novo período:** R\$ 8.163.308,40 (Quarto Aditivo)  
**Recurso:** Fonte 237  
**Executor:** Eng.º Darione José Maria Cavalcanti de Oliveira

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Prestação de serviços de monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos instalados em pontos definidos no Edital da Concorrência nº 008/2010. Complementarmente, deverão ser elaborados inventários, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos, com expedição concomitante de relatório individual para emissão de autos de infração e notificação, utilizando medidores eletrônicos de velocidade fixos de operação autônoma.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Andamento normal.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Andamento normal.



A Ser Iniciada    
  Não Iniciada    
  Cancelada    
  Andamento Normal    
  Atrasada    
  Paralisada    
  Concluída

## MONITORAMENTO E GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DE TRÁFEGO

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 1º Bimestre de 2017:
  - Foi instalada Barreira Eletrônica na DF-005 em frente ao Colégio do Sol.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Esta em análise instalação de nova barreira eletrônica na DF-290 Km 19.

**PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS**



Programa de Trabalho:  
26.782.6217.2541.0001  
Nº do Processo: 113.017.091/2015  
Nº do Convênio de Cooperação: 002/2015  
Conveniada: Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF  
Data da Assinatura do Convênio: 24/11/2015  
Data prevista de conclusão: 14/05/2018  
Recurso: Fontes 237, 437  
Executor: Eng.ª Juliana Soares das Neves

**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** O presente Convênio de Cooperação Recíproca tem por objetivo a execução pelo DER/DF e pelo DETRAN/DF das atividades de Fiscalização de Trânsito nas rodovias integrantes do Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF e nas vias urbanas, bem como atividades de Educação de Trânsito, Engenharia de Tráfego, Estatísticas de Acidentes de Trânsito, Monitoramento Aéreo das Rodovias, Processamento Eletrônico de Multas, visando a aumentar a segurança e a melhoria das condições de trânsito no Distrito Federal, observando-se as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e demais normas pertinentes.



**CORREÇÃO 1º BIMESTRE**

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**

Executado 15,16% no bimestre. Acumulado 15,16%. As atividades realizadas foram:  
Fiscalização de Trânsito (Remoção de Veículos): Janeiro: Quant = 21; Valor = R\$ 17.222,00.  
Fevereiro: Quant. = 91; Valor =R\$ 35.694,00.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**

Executado 18,15% no bimestre. Acumulado 33,31%. As atividades realizadas foram:  
Fiscalização de Trânsito (Remoção de Veículos): Março: Quant = 229; Valor = R\$ 100.283,00.  
Abril: Quant. = 162; Valor =R\$ 61.945,00.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

**PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS, ENGENHARIA DE TRÁFEGO, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ESTATÍSTICA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

- 6º Bimestre de 2016: As atividades de Fiscalização de Trânsito e de Processamento de Dados foram citadas no item anterior por serem atividades que implicam em valores a pagar ou a receber. Contudo devem-se considerar as demais atividades de cooperação, como Educação de Trânsito, Engenharia de Tráfego, Estatísticas de Acidentes de Trânsito, realizadas ao longo de todo o ano de 2016, inclusive no 6º Bimestre. As atividades pertinentes a essas áreas foram enumeradas pelas Diretorias/Gerências competentes nos respectivos relatórios de atividades. Tendo em vista o excesso de autos de infração teve um valor chegando a cento e dezenove por cento.
- 1º Bimestre de 2017: As atividades de Fiscalização de Trânsito foram citadas no item anterior por serem atividades que implicam em valores a receber. As demais atividades de cooperação, como Educação de Trânsito, Engenharia de Tráfego, Estatísticas de Acidentes de Trânsito, também foram realizadas no 1º Bimestre de 2017. Foram enumeradas pelas Diretorias/Gerências competentes nos respectivos relatórios de atividades. As atividades de Processamento de Dados, antes inseridas no Convênio nº 002/2015, a partir do 1º Bimestre de 2017 são objeto de contrato firmado com o SERPRO.

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO



Programas de Trabalho: 26.782.6217.2541.0001  
 Nº do Processo: 113.002.947/2016  
 Nº do Contrato: 036/2016  
 Empresa: Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO  
 Data de início: 28/12/2016  
 Data prevista de conclusão: 28/06/2019  
 Valor: R\$ 10.800.000,00  
 Recurso: Fonte 237 e/ou 437  
 Executor: Eng.º Cristiano Alves Cavalcante (Titular), Eng.º Viviane Coelho de Castro (Suplente) e Jesse Gouvea de Oliveira (Suplente)

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Serviços especializados de tecnologia da informação para provimento da Solução Integrada de Gestão de Infrações de Trânsito – RADAR.


### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Realizado 17% no 1º Bimestre.

Processo de pagamento encaminhado para DIOFI referente aos períodos de 01/01/2017 a 20/01/2017, no valor de R\$ 144.702,00, e 21/01/2017 a 20/02/2017 no valor de R\$ 917.622,00.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017: 17%.

Fatura referente ao período de 21/02/2017 a 20/03/2017 encaminhado para pagamento em 17/04/2017. Ordem bancária :2017OB01039.



**Avanço Físico Bimestral**



**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programas de Trabalho:  
 26.782.6217.2904.0001  
 Nº do Processo: 113.003.588/2016  
 Nº do Contrato: 021/2016  
 Empresa: Hot Cozinha Industrial Ltda.  
 Data da Assinatura do Contrato: 11/07/2016  
 Data prevista de conclusão: 12 meses  
 Valor: R\$ 153.600,00  
 Recursos: Fonte 237  
 Executora: Jucianne Batista Nogueira de Oliveira  
 e Kein Yon Ko (suplente)  
 IS de 18/07/2016


**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Fornecimento de lanche para a Escola Vivencial de Trânsito – Transitolândia, com entregas diárias de segunda-feira à sexta-feira, a critério do DER-DF.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

No 1º Bimestre, referente aos meses de janeiro e fevereiro não houve atendimento na Transitolândia.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

No 2º Bimestre, referente aos meses de março e abril, foram atendidas pela Transitolândia 4.390 crianças e 307 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 31 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. A escola forneceu a todas as crianças um lanche, utilizando o contrato no valor de R\$ 18.788,00.

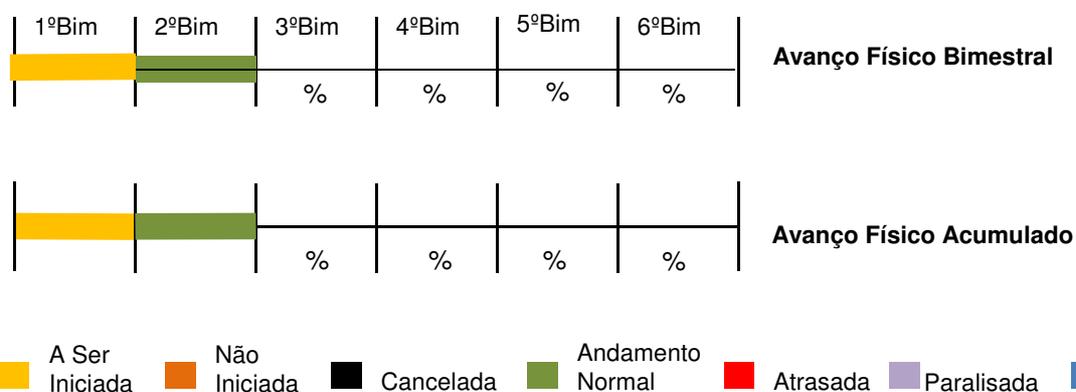

**MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



Programa de Trabalho:  
 26.782.6215.2904.0001 - Etapa 14 SAG 2015  
 26.782.6217.2904.0001 - 2016  
 Nº do Processo: 113.012.201/2013  
 Nº do Contrato: 012/2014  
 Empresa: Travel Bus Ltda - Me  
 Data de Início: 24/03/2014  
 Data prevista de conclusão: 23/03/2018 (3º TA)  
 Valor: R\$ 626.740,35 (Segundo Aditivo)  
 Recurso: Fonte 237  
 Executor: Jucianne Batista Nogueira de Oliveira  
 Kein Yon Ko (suplente)  
 (IS de 24/11/2015)


**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Prestação de serviço de transporte de crianças a serem atendidas pela Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia) do DER-DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 001/2014.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

No 1º Bimestre, referente aos meses de janeiro e fevereiro não houve atendimento na Transitolândia.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

No 2º Bimestre, referente aos meses de março e abril, foram atendidas pela Transitolândia 4.390 crianças e 307 professores que participaram das ações de educação que o DER/DF promove. Alunos de aproximadamente 31 escolas visitaram e receberam palestras do corpo técnico do DER. Neste período foi oferecido transporte pelo DER para viabilizar a chegada dessas crianças à Transitolândia, utilizando o contrato no valor de R\$ 61.767,00.



**Avanço Físico Bimestral**



**Avanço Físico Acumulado**

A Ser Iniciada    
  Não Iniciada    
  Cancelada    
  Andamento Normal    
  Atrasada    
  Paralisada    
  Concluída

**MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

## SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TRECHOS DO SRDF – LOTE 1



Programa de Trabalho:  
 26.782.6217.4197.0001 – Etapa SAG 17 2016  
 Nº do Processo: 113.007.572/2013  
 Nº do Contrato: 001/2016  
 Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.  
 Data da Assinatura do Contrato: 25/01/2016  
 Data do Recebimento da IS: 11/02/2016  
 Data prevista de conclusão: 06/05/2017  
 (1º Termo Aditivo)  
 Valor: R\$ 3.043.293,27  
 Recurso: Fonte 237  
 Executor Titular: Eng.º Guilherme José da Fonseca Berniz e Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva (suplente)  
 IS, 11/02/2016


**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Execução da sinalização horizontal, em, vários trechos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, definido como Lote 1 – 1º Distrito Rodoviário, 4º Distrito Rodoviário e 5º Distrito Rodoviário, tudo conforme especificações nos termos do Edital de Concorrência nº 006/2014.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Executado 6,5% no bimestre. Acumulado 36,5%. Início da revitalização da sinalização horizontal da DF-130, Trecho DF-250/BR-251. Colocação de tachinhas na DF-128, Trecho BR-020/DF-230. Colocação de tachinhas na DF-205, Trecho DGO/DGO. Início e Término da revitalização da sinalização horizontal na DF-442, Trecho DF-440/DF-001.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Executado . Início da Revitalização da sinalização Horizontal na DF-230, Trecho BR-020/DF-345. Continuação da sinalização horizontal na DF-130, Trecho: DF-250/BR-251. Início da sinalização horizontal na DF-128, Trecho:BR-020/Divisa.

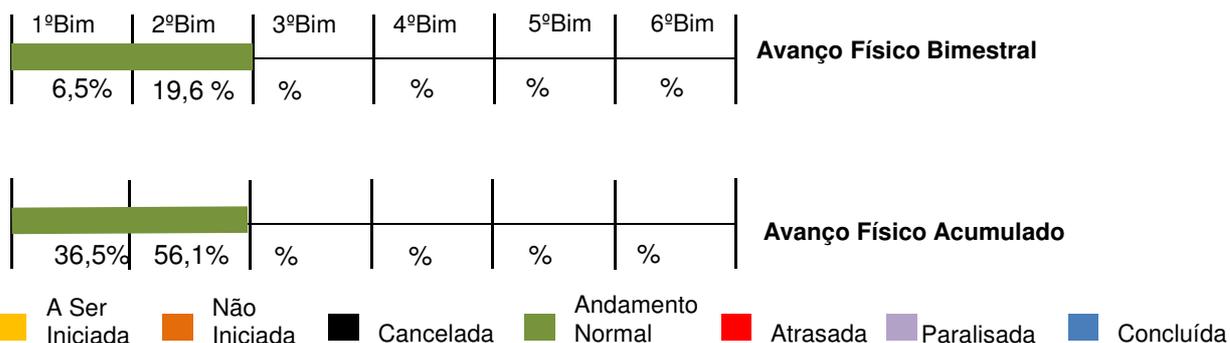

## SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TRECHOS DO SRDF- LOTE 1

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 1º Bimestre de 2017: Prorroga o prazo de execução por 90 dias, encerrando-se em 06/05/2017, DODF nº 33, de 15/02/2017, pág. 31.
- 2º Bimestre de 2017: Aguardando prorrogação de prazo por mais 90 dias.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Dar andamento à sinalização nas rodovias previstas no objeto do contrato.

## SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TRECHOS DO SRDF LOTE 2




Programa de Trabalho:  
26.782.6217.4197.0001  
Nº do Processo: 113.000.864/2016  
Nº do Contrato: 002/2016  
Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.  
Data da Assinatura do Contrato: 25/01/2016  
Data do Recebimento da IS: 11/02/2016  
Data prevista de conclusão: 06/05//2017 – Segundo Termo Aditivo)  
Valor: R\$ 5.688.920,63 + R\$ 1.028.292,56 (Primeiro Aditivo) = R\$ 6.717.213,19  
Recurso: Fonte 237  
Executor Titular: Eng.º Guilherme José da Fonseca Berniz e Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva (suplente)  
IS, 11/02/2016

**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Execução da sinalização horizontal, em, vários trechos de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, definido como Lote 2 – 2º Distrito Rodoviário, 3º Distrito Rodoviário, tudo conforme especificações nos termos do Edital de Concorrência nº 006/2014.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
Executado 1,5%. Acumulado 36,5%.

Colocação de tachinhas na DF-205, Trecho DF250/DF-201 e Trecho DF-150/Km 16.Continuação da remoção na DF-003 (EPIA), Trecho DF-051/BR-040.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
Executado 5,6 % no bimestre. Acumulado %. Conclusão da sinalização horizontal na DF-250, Trecho: DF-330/DF-001 (EPCT); Conclusão da sinalização na DF-205, Trecho: DF-150/DF-201; Conclusão da sinalização na DF-205, Trecho: DF-150/km 16; Conclusão da sinalização da DF-079 (EPVP), Trecho: DF-075 (EPNB)/DF-085 (EPTG); Continuação da sinalização na DF-003 (EPIA), Trecho: DF-007 (EPTT)/DF-251. Continuação da sinalização na DF-003 (EPIA) Trecho: DF-251/BR-040. Início e término da sinalização na DF-442, Trecho DF-440/DF-001.

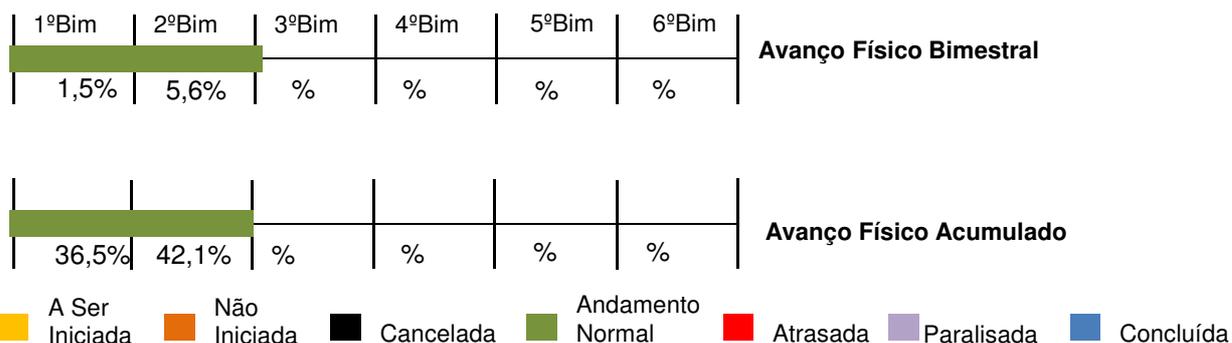

## SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TRECHOS DO SRDF – LOTE 2

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 1º Bimestre de 2017: Prorrogado o prazo de execução do Contrato por 90 dias, encerrando-se em 06/05/2017. Segundo Termo Aditivo DODF nº 33, de 15/02/2017, pág. 31.
- 2º Bimestre de 2017: Aguardando prorrogação de prazo por mais 90 dias.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Dar andamento à sinalização nas rodovias previstas no objeto do contrato.

**MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO OPERADO PELO DER-DF**





Programa de Trabalho:  
 26.782.6217.4198.0001  
 Nº do Processo: 113.003.907/2016  
 Nº do Contrato: 002/2017  
 Empresa: SITRAN – Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda.  
 Data da Assinatura do Contrato: 14/02/2017  
 Data prevista de conclusão: 13/08/2019  
 Valor: R\$ 4.882.728,14  
 Recurso: Fonte 237  
 Executor: Eng.º Carlos Alberto Mundim Pena

**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico operados pelo DER-DF.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Executado 5% no bimestre. Acumulado 5% (início do contrato: 14/02/2017).

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Executado 19% no bimestre. Acumulado 19,5%.



A Ser Iniciada    
  Não Iniciada    
  Cancelada    
  Andamento Normal    
  Atrasada    
  Paralisada    
  Concluída

**MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SEMAFÓRICO OPERADO PELO DER-DF**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

- 1º Bimestre 2017:
  - Serviço de natureza contínua com prazo de execução de 180 dias, ou até assinatura do novo contrato de manutenção.

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE PAINÉIS DE MENSAGENS MÓVEIS



Programa de Trabalho:  
 26.782.6215.3209.0001 (Segundo Aditivo)  
 Etapa 12 SAG 2015  
 26.782.6217.3209.0001 – Etapa 41 SAG 2016  
 Nº do Processo: 113.009.643/2013  
 Nº do Contrato: 066/2014  
 Empresa: Talentech-Tecnologia Ltda.  
 Data de Início: 15/12/2014  
 Data prevista de conclusão: 15/12/2017 (Terceiro Aditivo)  
 Valor Anual: R\$ 3.676.269,60 (Terceiro Aditivo)  
 Recurso: Fonte 237 (Terceiro Aditivo)  
 Executora: Afonso Guilherme Dutra

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Fornecimento, implantação, manutenção e suporte técnico de painéis de mensagens variáveis e sistema de informação e orientação aos usuários, em tempo real e repasse de conhecimento para atender às necessidades do DER/DF.


### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Em janeiro operaram 30 painéis com gasto de R\$ 301,567,43. Em fevereiro operaram 30 painéis com gastos de R\$ 304.532,25.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Em março operaram 30 painéis com gasto de R\$ 297.132,18.  
Em abril operaram 30 painéis com gasto de R\$ 305.284,21.

Obs.: Os pagamentos estão aguardando descontingenciamento de verba orçamentária, de acordo com despacho da DIOFI anexado no processo.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## **FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE PAINÉIS DE MENSAGENS MÓVEIS**

### **COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

- Contrato foi prorrogado pelo prazo de vigência de 12 meses.
- Processo enviado à DIOFI para emissão de nota de empenho para pagamento dos meses de Março e Abril.

### **PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL




Programa de Trabalho:  
 26.782.6217.3209.0001 - Etapa 41 SAG 2016  
 Nº do Processo: 113.002.964/2014  
 Nº do Contrato: 011/2016  
 Empresa: SINASC – Sinalização e Construção de Rodovias Ltda.  
 Data da Assinatura do Contrato: 29/04/2016  
 Data do recebimento da IS: 11/05/2016  
 Data prevista de conclusão: 09/03/2017 (Segundo Aditivo)  
 Valor: R\$ 2.457.298,59  
 Recurso: Fonte 237  
 Executor: Eng.º Guilherme José da Fonseca Berniz  
 Substituto: Eng.ª Tainá de Aguiar Botelho

**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Execução da instalação de sinalização vertical do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Cc nº 001/2015.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 99%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Executado 1% no bimestre. Acumulado 100%.

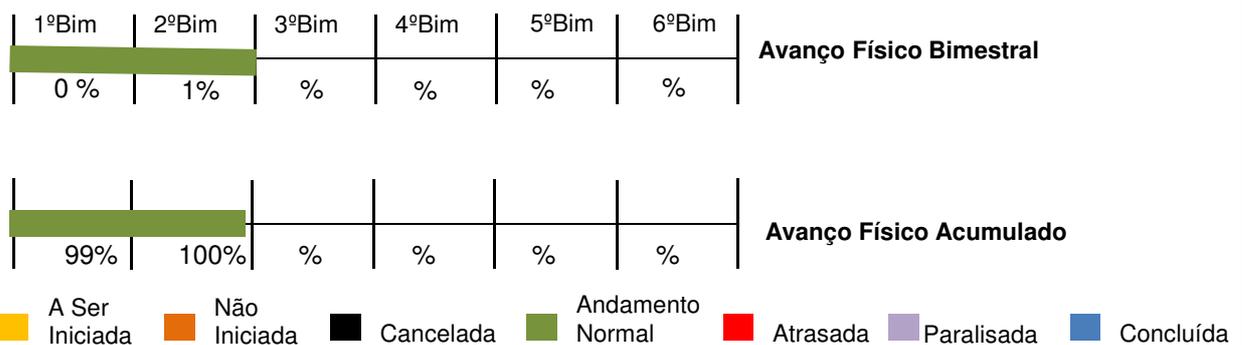

## INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 2º Bimestre de 2017: Prorrogação por 45 dias , devendo expirar-se em 24/04/2017, DODF nº 59, de 27/03/2017, pág. 49.
- Informamos que o solicitado pela fiscalização foi cumprido pela empresa.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Aguardando o Termo de Recebimento Provisório e *As Built*.

## PAVIMENTAÇÃO VC-533, LIGAÇÃO DE BRAZLÂNDIA A PADRE LÚCIO





Programa de Trabalho:  
 28.782.6216.1475.1199  
 Etapa 16 SAG 2017/Etapa 28 SAG 2016  
 Nº do Processo: 113.005.439/2012  
 Nº do Contrato: 039/2013  
 Empresa: NG Engenharia e Construções Ltda.  
 Data da assinatura do contrato: 22/11/2013  
 Data do recebimento da IS: 26/09/2014  
 Data prevista de conclusão: Paralisado até  
 14/04/2017 (Décimo Quarto Aditivo)  
 Valor: R\$ 5.405.070,40 +  
 R\$ 1.299.126,98 (Quarto Aditivo) +  
 R\$ 561.300,44 (Nono Aditivo) + R\$ 723.900,89 (12º  
 Aditivo) = R\$ 7.989.398,71  
 Recurso: Fonte 100, 135 (Terceiro Aditivo), 335  
 (Oitavo Aditivo)  
 Executor: Engº Antônio Gomes da Silva Filho  
 População da RA IV: 50.490

**DESCRIÇÃO DA OBRA:** Execução de obras para pavimentação de toda a extensão da rodovia vicinal VC-533, além de implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre o seu entroncamento com as rodovias BR-080/251/DF/180 e a divisa com estado do Goiás (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio). Extensão de 3,852 km. Cc nº 005/2013.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 6º BIM. 2016:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 75%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Obra paralisada a espera da construção de Ponte sobre o Rio Descoberto na VC-533 Brazlândia - Divisa DF/GO.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Obra paralisada a espera da construção de Ponte sobre o Rio Descoberto na VC-533 Brazlândia - Divisa DF/GO.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## PAVIMENTAÇÃO VC-533, LIGAÇÃO DE BRAZLÂNDIA A PADRE LÚCIO

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 6º Bimestre de 2016:

- Prorrogação do prazo de execução por 120 dias (DODF nº 226, 02/12/2016). Para retomada desta obra é necessário que a Ponte sobre o Rio Descoberto que passa pela VC-533 seja concluída.
- Paralisação do contrato por 120 dias, a partir de 15/12/2016, expirando em 14/04/2017 (DODF nº 245, 29/12/2016).

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

## DUPLICAÇÃO DA DF-463




Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.1475.1199  
 Etapa 15 SAG 2017/Etapa 26 SAG 2016  
 Nº do Processo: 113.005.051/2010  
 Nº do Contrato: 043/2014  
 Empresa: Serterra Transportes Escavações  
 Terraplenagem e Pavimentação Ltda.  
 Data do Início: 10/07/2014  
 Data prevista de conclusão: 10/03/2017 (Décimo  
 Nono Aditivo)  
 Valor: R\$ 6.552.350,76 (6º Aditivo)+  
 R\$ 666.984,73 (11º Aditivo) +  
 R\$ 7.724,13 (12º Aditivo) + 939.084,88 (15º Aditivo)  
 + 1.600.000,00 (17º Aditivo) + 507.150,44 (18º  
 Aditivo) =R\$ 10.273.294,94  
 Recurso: Fonte 100, 135 (Quinto Aditivo), 335  
 (Décimo Aditivo)  
 Executor: Engº Guilherme José da Fonseca Berniz  
 População das RA's XXVII e XIV: 123.455

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Execução das obras de duplicação da rodovia DF-463, adequação da rodovia e acessos aos Setores Habitacionais Mangueiral e Jardim Botânico. Extensão de 3,9 km. Cc nº 001/2014.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 99%.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Executado 0,8% no bimestre. Acumulado 99,8%.



**Avanço Físico Bimestral**



**Avanço Físico Acumulado**

■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## DUPLICAÇÃO DA DF-463

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 6º Bimestre de 2016: Em andamento solicitação de prorrogação por 60 dias.
- 2º Bimestre de 2017: Concluída a pré-marcação da Sinalização Horizontal para dar início à pintura.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Encerramento da obra.

## RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-001 (EPCT), TRECHO KM 119,3 AO KM 131,8 – LAGO OESTE




Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.1475.1199  
 Etapa 29 SAG 2017/Etapa 35 SAG 2016  
 Nº do Processo: 113.011.751/2014  
 Nº do Contrato: 003/2016  
 Empresa: EPC Projetos e Construções Ltda.  
 Data da Assinatura do Contrato: 16/02/2016  
 Data prevista de conclusão: 28/01/2017  
 (Terceiro Aditivo)  
 Valor inicial: R\$ 6.753.902,84 + R\$ 2.624.908,10  
 (quarto Termo Aditivo) = R\$ 9.378.810,94  
 Recurso: Fontes 148 e 348 (Primeiro Aditivo)  
 Executor: Eng.º Paulo Robert Santos Machado

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Execução das obras de restauração da rodovia DF-001 (EPCT), entroncamento da DF-170 ao entroncamento BR-010/020/030/450/DF-001/003/150-Parque Rodoviário do DER/DF, trecho compreendido do km 119,3 ao km 131,8 (Lago Oeste – 1ª Etapa), incluídos os serviços de sinalização vertical e horizontal, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 11/2014. Extensão de 12,52 km.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Aguardando entrega do Termo Definitivo da obra.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Aguardando entrega do Termo Definitivo da obra.

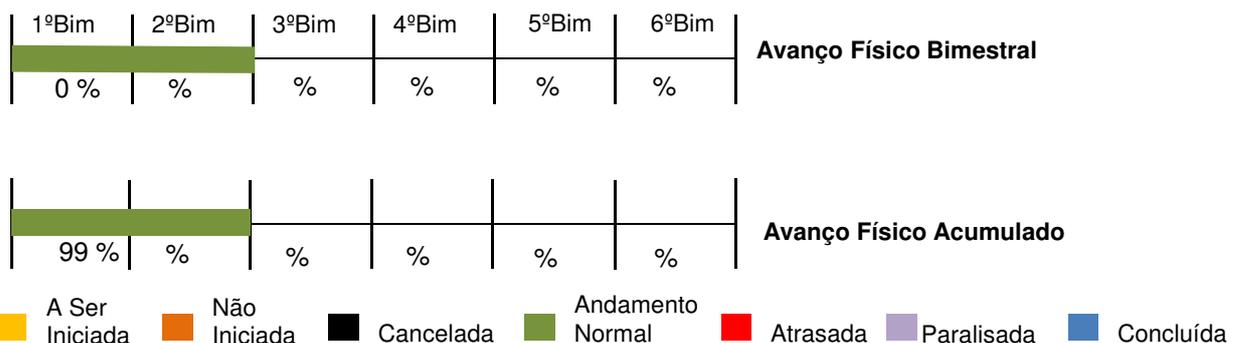

**RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-001 (EPCT), TRECHO KM 119,3 AO KM 131,8 – LAGO OESTE**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

- 6º Bimestre de 2016: Acréscimo de serviços no percentual de 12,47%, suplementação financeira no valor de R\$ 2.674,906,10 – Fonte 148 – 4º Termo Aditivo (DODF nº 233, pág. 50, de 13/12/2016).

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## Restauração da DF-001 (EPCT) - Lago Oeste




Programas de Trabalho:  
 26.782.6216.1475.1199  
 Nº do Processo: 113.011.217/2016  
 Nº do Contrato: 003/2017  
 Empresa: LK Construções e Terraplanagem-  
 EIREILI - ME  
 Data de início: 24/02/2017  
 Data prevista de conclusão: 23/08/2017 (180  
 dias)  
 Valor: R\$ 9.604.026,18  
 Recurso: 248  
 Executor: Kênio Márcio Avelar (Titular) e  
 Eugênio Maracajá de Moraes (Suplente)


**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Restauração da DF-001 (EPCT) - Lago Oeste, entroncamento da DF-170 ao entroncamento da BR-010/020/030/DF-003/DF-150 (Parque Rodoviário do DER/DF) - 2ª Etapa. Extensão de 8,8 km. Cc nº 005/2016.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

O avanço físico do 2º bimestre do contrato 03/2017, restauração do 2º trecho lago oeste, empresa executora LK é de 5,2%.



**Avanço Físico Bimestral**



**Avanço Físico Acumulado**


■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONEXÕES DE RÁDIO**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

**CONSULTORIA EM ENGENHARIA  
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO  
ANEL VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL.**


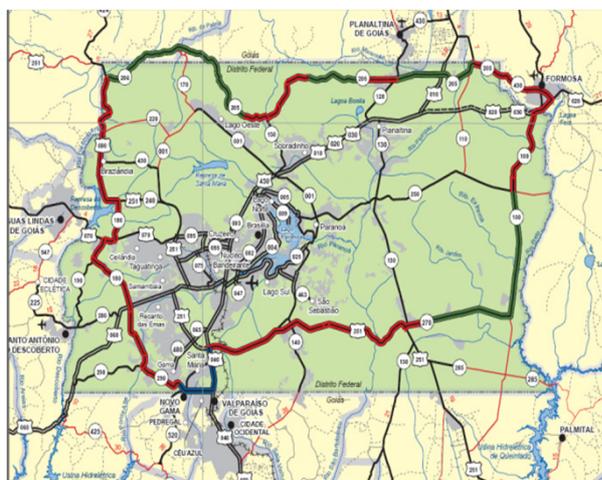


Programa de Trabalho: 26.782.6216.1968.0013  
 Etapa 34 SAG 2017/Etapa 34 SAG 2016  
 Nº do Processo: 113.000.942/2014  
 Nº do Contrato: 006/2015  
 Empresa: Strata Engenharia EIRELI  
 (Segundo Aditivo)  
 Data da Assinatura do Contrato: 15/06/2015  
 Data do Recebimento da IS: 29/06/2015  
 Data prevista de conclusão: 03/07/2017 (Quarto Aditivo)  
 Valor inicial: R\$ 7.151.845,29  
 Recurso: Fonte 135, 335 (Apostila)  
 Executores: Geol. Wellington Rodrigues dos Santos,  
 Eng.º Stênio Fonseca da Costa e Eng.º Willkerson  
 Victor da Silva (Instrução de Serviço nº 136,  
 22/07/2015)  
 População das RA's VI, VII, XIV, XIII, II, XV, XII,  
 IX, IV, V e XXVI: 1.620.965

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Contratação de empresa de consultoria em engenharia para análise e adequações nos produtos oriundos do contrato 040/2008 e a elaboração dos projetos básico e executivo para implantação do Anel Viário do Distrito Federal conforme Edital de Concorrência nº 002/2014.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 32,48%. A empresa Contratada apresentou os Relatórios dos Projetos Básicos de Melhoramentos e Adequações das Rodovias DF-100, DF-270 e Contorno de Formosa para reavaliação da Comissão Executora, com vistas à aprovação integral dos Produtos. A Comissão Executora solicitou um valor de empenho/2017 de R\$ 4.829.577,43.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIMESTRE 2017:**  
 Executado 0% no bimestre. Acumulado 32,48%. A Comissão Executora emitiu pareceres favoráveis a aprovação com ressalvas do Relatório do Projeto Básico de Duplicação e Restauração da Rodovia DF-001 e do Relatório do Projeto Básico de Restauração e Melhoramentos da Rodovia GO-430 (Produtos C2 da Fase C).



A Ser Iniciada    
  Não Iniciada    
  Cancelada    
  Andamento Normal    
  Atrasada    
  Paralisada    
  Concluída

## **CONSULTORIA EM ENGENHARIA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL.**

### ➤ 1º Bimestre 2017:

- Primeira Apostila ao Contrato nº 06/2015, inclusão da Fonte: 335, DODF nº 33, em 15/02/2017, pág. 31.
- No dia 30/12/2016, a empresa Contratada apresentou os Relatórios dos Projetos Básicos de Melhoramentos e Adequações das Rodovias DF-100 e DF-270 para reavaliação da Comissão Executora, com vistas à aprovação integral dos Produtos.
- No dia 31/01/2017, a empresa Contratada protocolizou o Ofício nº GELIC-002/201724, o qual apresenta o Engº Valter Barrueco Filho como novo Coordenador Técnico dos Projetos.
- No dia 07/02/2017, a Comissão Executora solicitou um valor de empenho/2017 de R\$ 4.829.577,43.
- No dia 31/01/2017, a empresa Contratada apresentou o Relatório do Projeto Básico de Melhoramentos e Adequações da Rodovia Contorno de Formosa para reavaliação da Comissão Executora, com vistas à aprovação integral do Produto.

### ➤ 2º Bimestre 2017:

- A Comissão Executora solicitou um valor de Empenho/2017 de R\$ 4.829.577,43.
- A Coordenação de Planejamento, por meio do Despacho nº 026/2017-COPLAN, informou que não há disponibilidade orçamentária no Programa de Trabalho, visto que o repasse do Banco do Brasil para a execução do empreendimento em pauta ocorreu no Exercício de 2016.
- Considerando o Despacho nº 026/2017-COPLAN a Comissão Executora solicitou a suspensão dos prazos de execução dos serviços e de vigência contratual, até que seja viabilizado o valor de empenho.
- A COPLAN, por meio do Despacho nº 049/2017 informou que há disponibilidade orçamentária parcial no Programa de Trabalho no valor de R\$ 486.984,72.
- A Comissão procedeu a avaliação do Produto C-2 da Fase C e emitiu Parecer Técnico nº 01/2017 – CCA/SUTEC/DER/DF, datado de 17/03/2017, que opina de forma favorável a aprovação com ressalvas do Relatório do Projeto Básico de Duplicação e Restauração da Rodovia DF-001.
- A Comissão procedeu a avaliação do Produto C-2 da Fase C e emitiu Parecer Técnico nº 02/2017 – CCA/SUTEC/DER/DF, datado de 17/03/2017, que opina de forma favorável a aprovação com ressalvas do Relatório do Projeto Básico de Restauração e Melhoramentos da Rodovia GO-430.

### **PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

- Reavaliação do Projeto Básico da rodovia DF-100;
- Reavaliação do Projeto Básico da rodovia DF-270;
- Reavaliação do Projeto Básico da rodovia Contorno de Formosa;
- Avaliação do Projeto Básico da rodovia BR-070;
- Avaliação do Projeto Básico da rodovia BR-251.

**ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA PAVIMENTAÇÃO DA DF-285, TRECHO KM 16,3 e KM 27,2**



Programa de Trabalho:  
26.782.6216.3711.6161  
Etapa 37 SAG 2017/Etapa 10 SAG 2016  
Nº do Processo: 113.012.231/2015  
Nº do Contrato: 004/2016  
Empresa: EXTREMA CONSTRUÇÃO LTDA.  
Data da Assinatura do Contrato: 08/03/2016  
Data do recebimento da IS: 09/03/2016  
Data prevista de conclusão: 07/07/2017 (Terceiro Aditivo)  
Valor: R\$ 131.554,59  
Recurso: Fonte 100  
Executores: Geo. Luciano dos Santos, Geol. Maria Dulcineia Xavier Nunes e Eng.<sup>a</sup> Patrícia Marc C. M. Milhomem


**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Elaboração do Plano de Controle Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD para o obra de pavimentação da DF-285, Trecho: Km 16,3- km 27,2 (Divisa de MG).

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**

Não houve avanço físico no bimestre, pois se aguarda análise do IBRAM para o Estudo encaminhado em 26/07/2016. Reiterado o pedido de análise, por meio do Ofício Nº 112/2017 – DG (Sisdoc Nº 2248/17).

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**

Não houve avanço físico no bimestre. Aguardando análise do IBRAM para o Estudo encaminhado em 26/07/2016. Reiterado o pedido de análise, por meio do Ofício Nº 112/2017 – DG (Sisdoc Nº 2248/17).

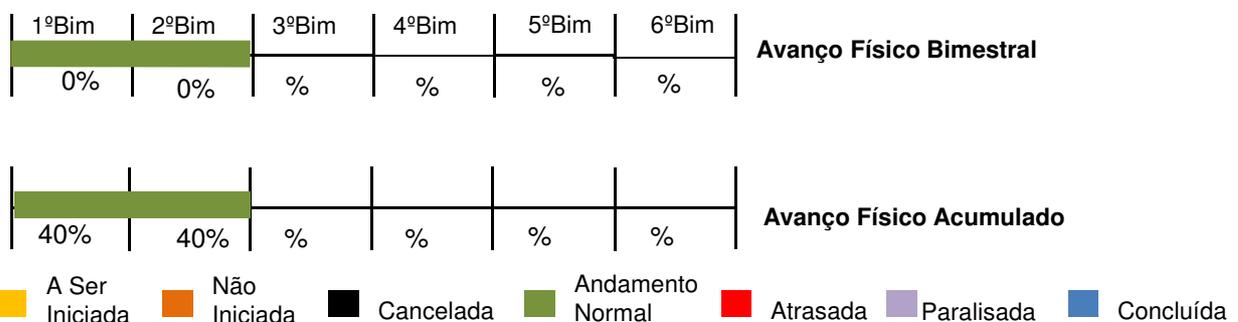

## ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA PAVIMENTAÇÃO DA DF-285, TRECHO KM 16,3 e KM 27,2

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 6º Bimestre de 2016: Não houve manifestação do Órgão Ambiental a respeito da análise do Estudo.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO	
PCA da DF-285	
PRODUTOS	PORCENTAGEM A SER PAGA
PCA – Versão Preliminar (aprovado no DER-DF)	40 %
PCA – Versão Final (aprovado no IBRAM)	40 %
PCA – Versão Final (impressão de todos os volumes)	20 %

- 1º Bimestre de 2017: Não houve manifestação do Órgão Ambiental a respeito da análise do Estudo. Reiterado o pedido de análise, por meio do Ofício Nº 112/2017 – DG (Sisdoc Nº 2248/17).
- 2º Bimestre de 2017: Não houve manifestação do Órgão Ambiental a respeito da análise do Estudo. Assinado o 3º termo aditivo ao contrato, suspendendo o prazo de execução até 07/07/2017 (DODF Nº 058, 24/03/2017).

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Aguardar aprovação do PCA/PRAD pelo IBRAM.

**ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA PAVIMENTAÇÃO DA DF-001 (DF-430/DF-170)**




Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.3711.6161  
 Etapa 38 SAG 2017/Etapa 46 SAG 2016  
 N° do Processo: 113.018.219/2014  
 N° do Contrato: 007/2016  
 Empresa: ECOTECH Tecnologia Ambiental e Consultoria Ltda.  
 Data da Assinatura do Contrato: 11/03/2016  
 Data do recebimento da IS: 04/04/2016  
 Data prevista de conclusão: Paralisado até 23/03/2017 (Segundo Aditivo)  
 Valor: R\$ 68.695,68  
 Recurso: Fonte 100  
 Comissão Executora: Geo. Geol. Wellington Rodrigues dos Santos, Geol. Maria Dulcineia Xavier Nunes e Eng.ª Patrícia Marc C. M. Milhomem (IS nº 137, 27/06/2016- DODF nº 122, 28/06/2016)

**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Elaboração do Plano de Controle de Recuperação de Áreas Degradadas – PCA/PRAD para o obra de pavimentação da DF-001, incluindo a construção de ponte de concreto sobre o Rio da Palma, trecho: DF-430 entr. DF-415/ entr. DF-415 entr./ DF-220 entr. DF-220- entr. DF-170. Convite nº 001/2015.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Executado 0% no Bimestre. Serviço sem possibilidade de avanço (aguardando elaboração de projeto pelo DER).

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Executado 0% no Bimestre. Serviço sem possibilidade de avanço (aguardando elaboração de Projeto pelo DER).



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## **ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA PAVIMENTAÇÃO DA DF-001 (DF-430/DF-170)**

### **COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

#### ➤ 1º Bimestre de 2017:

- Suspende a execução dos serviços por 90 (noventa) dias , encerrando em 26/03/2017, DODF N° 26, de 06/02/2017, pág. 42.
- A Empresa está impossibilitada de avançar nos estudos devido à falta dos projetos de pavimentação do trecho da DF-001, onde está sendo realizado o Estudo.

#### ➤ 2º Bimestre de 2017:

- A Empresa permanece impossibilitada de avançar nos estudos devido à falta dos projetos de pavimentação e drenagem do trecho da DF-001, onde está sendo realizado o Estudo. Diante da data estabelecida pela DIREP, para a disponibilização de tais projetos, foi solicitada a manutenção da suspensão do prazo de execução por mais 150 dias.

### **PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

Aguardar a SUTEC disponibilizar os Projetos necessários à manutenção do Contrato.

## GERENCIAMENTO AMBIENTAL E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DO CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO EIXO SUL



Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.1226.0001  
 Etapa 8 SAG 2016  
 Nº do Processo: 113.005.547/2013  
 Nº do Contrato: 009/2016  
 Empresa: STE Serviços Técnicos de Engenharia S/A  
 Data da Assinatura do Contrato: 07/04/2016  
 Data de Recebimento da IS: 15/04/2016  
 Data prevista de conclusão: 05/04/2018  
 (Segundo Aditivo)  
 Valor: R\$ 3.658.938,70 – R\$ 1.280.628,55  
 (Primeiro Aditivo)= R\$ 2.378.310,15 + R\$ 257.803,47 (Segundo Aditivo) = R\$2.636.113,62  
 Recurso: Fonte 335  
 Comissão Executora: Eng.<sup>a</sup> Patrícia Marc C. M. Milhomem; Geol. Maria Dulcinéia Xavier Nunes e Eng.<sup>o</sup> Paulo Roberto da Silva (IS, 12/04/2016)


**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Gerenciamento Ambiental dos Programas Ambientais do Corredor de Transporte Público Coletivo Eixo Sul, ligação das cidades do Gama e Santa Maria ao Plano Piloto, na DF-480/DF-065/DF-040/DF-003/DF-025/DF-047 e acesso ao Terminal Asa Sul. Tudo conforme os anexos do Edital da Concorrência Nº 009/2013.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Executado 0 % do Serviço no 1º Bimestre de 2017, permanecendo 25,6%, o mesmo do 6º Bimestre de 2016.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Executado 0 % do Serviço no 2º Bimestre de 2017, permanecendo 25,6%, o mesmo do 1º Bimestre de 2017.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## GERENCIAMENTO AMBIENTAL E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DO CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO EIXO SUL

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

#### ➤ 1º Bimestre de 2016:

O processo licitatório previa a realização das seguintes atividades:

1. Gerenciamento ambiental do empreendimento;
2. Execução dos Programas Ambientais detalhados no Plano Básico Ambiental (PBA);
3. Gerenciamento dos Programas Ambientais executados pelo Consórcio Construtor responsável pelas Obras, e
4. Elaboração de Estudos e Projetos estabelecidos no licenciamento ambiental.

Para tanto, foi considerada a realização dos serviços por um prazo de 12 meses durante as obras e de 24 meses durante a operação do empreendimento, totalizando 36 meses de contrato. Tendo em vista que as obras já haviam sido concluídas, o prazo de execução dos serviços foi readequado para 24 meses, sendo realizada a respectiva readequação do valor contratual para R\$ 2.636.113,62.

Foram celebrados 02 (dois) Termos Aditivos ao Contrato, para adequação do valor contratual (correspondente à supressão de 35% do valor inicialmente contratado) e reajustamento do mesmo, bem como para a readequação do prazo contratual para 24 meses.

Já foram apresentados pela empresa contratada e aprovados pelo DER/DF os seguintes Produtos:

- Relatório de Programação;
- Relatórios Mensais 1, 2, 3, 4 e 5, e
- 1º Relatório Semestral.

Estão em fase de análise pelo DER/DF os seguintes relatórios apresentados pela empresa contratada:

- Relatórios Mensais 7, 8 e 9;
- Relatório Especial 1: Projeto Paisagístico de recuperação de áreas com movimentação de terra e Projeto de plantio de espécies nativas no entorno da EPDB/EPAR, e
- Relatório Especial 2: Plano de Segurança para Acidentes de Trânsito.

#### ➤ 2º Bimestre de 2016:

- Estão em fase de análise pelo DER/DF os seguintes relatórios apresentados pela empresa contratada:
- Relatórios Mensais **7, 8, 9, 10 e 11;**
- **2º Relatório Semestral;**
- Relatório Especial 1: Projeto Paisagístico de recuperação de áreas com movimentação de terra e Projeto de plantio de espécies nativas no entorno da EPDB/EPAR, e
- Relatório Especial 2: Plano de Segurança para Acidentes de Trânsito.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Aprovar os relatórios já apresentados e elaborar os Relatórios Mensais 13 e 14.

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E ENCARREGADO




Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.4195.0001  
 Etapa 17 SAG 2015/Etapa 12 SAG 2016  
 Nº do Processo: 113.000.098/2013  
 Nº do Contrato: 045/2014  
 Empresa: Interativa Dedetização, Higienização e Conservação Ltda.  
 Data de Início: 22/07/2014  
 Data prevista de conclusão: 21/07/2017 (Sexto Aditivo)  
 Valor estimado: R\$ 2.612.403,66 (Quinto Aditivo)  
 Recurso: Fonte 100, 237, 437 (Terceiro Aditivo), 220 e 420 (Primeira Apostila)  
 Executor: Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva  
 Executor Substituto: Eng.º Bruno Sousa Almeida (IS nº 164, 15/07/2016)

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Prestação dos serviços especializados de conservação, limpeza e manutenção simples das rodovias do Distrito Federal, nos Distritos Rodoviários, unidades Administrativas e nas Regiões de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, sob a supervisão do DER/DF.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Renovação do Contrato por mais 6 (seis) meses, devendo encerrar-se em julho/2017.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Prestação de serviços em andamento normal.

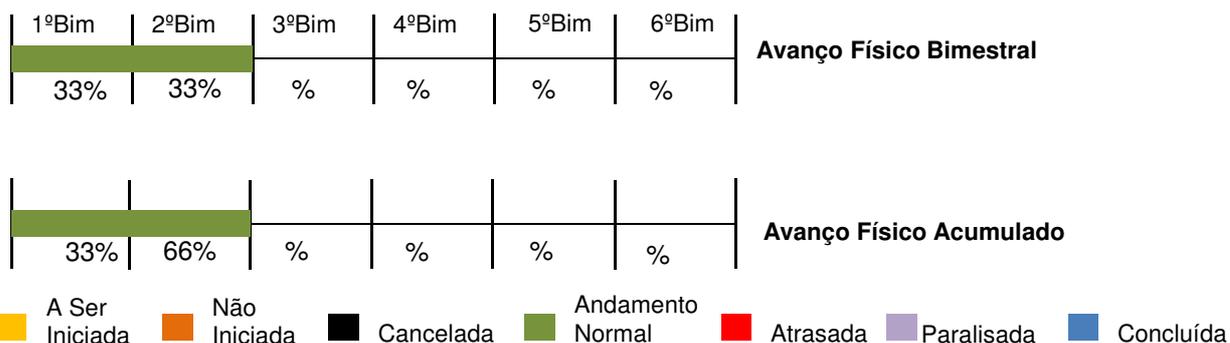

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE E ENCARREGADO

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- 1º Bimestre de 2017:
  - Fica renovado o Contrato por 6 (seis) meses, encerrando-se em 21/07/2017. Sexto Termo Aditivo, DODF nº 33 de 15/02/2017, pág. 31.
- 2º Bimestre de 2017:
  - Andamento normal.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Continuidade na prestação dos serviços.

## FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA




**Programa de Trabalho:**  
 26.782.6216.4195.0001  
 Etapa 17 SAG 2015/Etapa 12 SAG 2016  
 Nº do Processo: 113.004.578/2015  
 Nº do Contrato: 009/2015  
 Empresa: Centro Oeste Asfaltos Ltda.  
 Data de início: 16/07/2015  
 Data prevista de conclusão: 16/07/2017  
 (Terceiro Aditivo)  
 Valor Inicial: R\$ 333.699,00 (R\$ 142.700,00 +  
 R\$ 190.999,00 - Terceiro Aditivo)  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Eng.º Luiz Geraldo Rangel Vilela

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Fornecimento parcelado de 100 toneladas de Emulsão Asfáltica Catiônica de Ruptura Rápida, tipo RR-2C.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-2C – 1,99% em volume no bimestre.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-2C – 1,85% em volume no bimestre. (2,860 ton)



A Ser Iniciada    
  Não Iniciada    
  Cancelada    
  Andamento Normal    
  Atrasada    
  Paralisada    
  Concluída

## FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

4º Bimestre de 2016: Renovação do contrato para o próximo período até 16/07/2017. O valor para o período passa a ser R\$ 190.999,90 (DODF nº 143, 27/07/2016).

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

## FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE




Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.4195.0001 - Etapa 12 SAG 2016  
 Nº do Processo: 113.006.861/2015  
 Nº do Contrato: 022/2016  
 Empresa: HL Terraplenagem Ltda - EPP  
 Data da Assinatura do Contrato: 29/07/2016  
 Data prevista de conclusão: 31/07/2017  
 Valor Inicial: R\$ 2.240.000,00  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Eng.º Mozer Teixeira de Castro e  
 Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva (suplente).

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Fornecimento de 10.000 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ para atender às demandas emergências de tapa-buracos.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Houve o fornecimento normal de massa asfáltica por parte da contratada.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Houve o fornecimento normal de massa asfáltica por parte da contratada.



A Ser Iniciada    
  Não Iniciada    
  Cancelada    
  Andamento Normal    
  Atrasada    
  Paralisada    
  Concluída

## FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

➤ 6º Bimestre de 2016:

- Houve cancelamento de empenho, (CA) R\$ 34.000,00, conforme circular nº 013/2016-DIAFI.

➤ 1º Bimestre de 2017:

- Foi emitida duas notas de empenho na data de 13/01, para continuação dos serviços.

➤ 2º Bimestre de 2017:

- Foi emitido novo empenho na data de 09/03/2017, 2017NE0364, para a continuação dos serviços.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Continuar o fornecimento de massa asfáltica e a operação tapa buraco.

## FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO



Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.4195.0001 - Etapa 12 SAG 2016  
 Nº do Processo: 113.007.779/2016  
 Nº do Contrato: 023/2016  
 Empresa: Centro Oeste Asfalto Ltda.  
 Data de início: 05/09/2016  
 Data prevista de conclusão: 04/09/2017  
 Valor Inicial: R\$ 215.950,00  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Eng.º Luiz Geraldo Rangel Vilela

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Fornecimento parcelado de 100 toneladas de Emulsão Asfáltica para imprimação (EAI) e impermeabilização de trechos a se recuperar e/ou pavimentar, de rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal –SRDF, a ser utilizado pelo DER-DF.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação (EAI). 0% (em volume).

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Fornecimento de emulsão asfáltica para imprimação (EAI). 0% (em volume).

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Bimestral
%	%	%	%	%	%	

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	Avanço Físico Acumulado
%	%	%	%	%	%	

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

**FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO E  
IMPERMEABILIZAÇÃO**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA



Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.4195.0001 - Etapa 12 SAG 2016  
 Nº do Processo: 113.010.837/2016  
 Nº do Contrato: 025/2016  
 Empresa: Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda.  
 Data de início: 30/09/2017  
 Data prevista de conclusão: 29/09/2017  
 Valor Inicial: R\$ 297.438,40  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Engº. Luiz Geraldo Rangel Vilela

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** Fornecimento parcelado de 160 toneladas de Emulsão Asfáltica tipo ruptura média RM -1C.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RM- 1C – 0% em volume.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Fornecimento de emulsão asfáltica tipo RM- 1C – 0% em volume.

1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	<b>Avanço Físico Bimestral</b>
%	%	%	%	%	%	

							<b>Avanço Físico Acumulado</b>
%	%	%	%	%	%		

A Ser Iniciada  
  Não Iniciada  
  Cancelada  
  Andamento Normal  
  Atrasada  
  Paralisada  
  Concluída

## FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

## REMOÇÃO DE ENGENHOS PUBLICITÁRIOS E OCUPAÇÕES IRREGULARES DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS DO DF E DA RIDE



Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.4195.0001  
 Etapa 17 SAG 2015/Etapa 12 SAG 2016  
 Nº do Processo: 113.005.021/2013  
 Nº do Contrato: 012/2015  
 Empresa: GB da Silva – Esquadrias & Equipamentos de Sinalização-EPP  
 Data da Assinatura do Contrato: 03/08/2015  
 Data prevista de conclusão: 28/07/2017  
 (Primeiro Aditivo)  
 Valor inicial: R\$ 953.610,96  
 Recurso: Fonte 100, 220 ou 420 (Primeiro Aditivo)  
 Executor: Hans Fernandes de Lemos



**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Prestação de serviços do tipo remoção de engenhos publicitários e ocupações irregulares das faixas de domínio das rodovias do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno-RIDE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Edital de Pregão nº 042/2015.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Durante esse bimestre foram apreendidos/recolhidos 14 outdoors, 01 front light, 8.682 faixas, 81 banners, 311 placas, 25 barracas e 146 produtos comercializados à margem da rodovia e 02 reboques.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Nesse bimestre foram apreendidos/recolhidos 30 outdoors, 10 front-light, 03 back-light, 13.272 faixas, 706 banners, 13 mobiliários urbanos, 756 placas, demolição de 06 edificações em alvenaria, 1450 metros lineares de cerca/muro, interdição de 08 acessos, 03 quiosques, 471 barracas, 237 produtos comercializados irregularmente em veículos, 460 produtos comercializados à margem da rodovia, e 12 trailer/reboques.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

## **REMOÇÃO DE ENGENHOS PUBLICITÁRIOS E OCUPAÇÕES IRREGULARES DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS DO DF E DA RIDE**

### **COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

- 1º Bimestre de 2017: Durante esse período foram executadas 2 medições, a primeira compreendeu o período de 01/01/2017 a 31/01/2017 e obteve o total a pagar de R\$ 90.000,0; a segunda abrangeu o período de 01/02/2017 a 28/02/2017 com o custo total de R\$ 90.000,00; Os serviços estão sendo executados normalmente.
- 2º Bimestre de 2017: Durante esse período foram executadas 2 medições, a primeira compreendeu o período de 01/03/2017 à 31/03/2017 e obteve o total a pagar de R\$ 79.441,57, a segunda abrangeu o período de 01/04/2017 à 30/04/2017 com o custo total de R\$ 86.112,41. Os serviços estão sendo executados normalmente

### **PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

Continuação dos serviços prestados.

## REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA GETEC/SUTEC



Programa de Trabalho:

26.451.6010.3903.9710 – Etapa 36 SAG 2015

26.451.6001.3903.9710 – Etapa 23 SAG 2016

26.451.6001.3903.9710 – Etapa 10 SAG 2017

Nº do Processo: 113.008.694/2010

Nº do Contrato: 014/2015

Empresa: MULTICON Engenharia Ltda.

Data da Assinatura do Contrato: 24/08/2015

Data do recebimento da IS: 08/09/2015

Data prevista de conclusão: 30/04/2017 (Quarto Aditivo)

Valor: R\$ 621.938,62 + R\$ 136.515,53 = R\$ 758.454,15 + R\$ 161.023,64 (Terceiro Aditivo) = 919.477,79

Recurso: Fontes 100 , 420 e 220

Executor: Eng.º Elcy Ozório dos Santos

Substituto: Arq. Fabrício Ferreira Faiad



**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Execução das obras de restauração de reforma do Edifício Sede da GETEC, localizado no Parque Rodoviário do DER-DF, Rodovia DF-001, km 0, Sobradinho-DF. TP nº 006/2011.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 70,41%.

### AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:

Executado 0% no bimestre. Acumulado 70,41%.



A Ser Iniciada    
  Não Iniciada    
  Cancelada    
  Andamento Normal    
  Atrasada    
  Paralisada    
  Concluída

## REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA GETEC/SUTEC

### COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

- **1º Bimestre de 2017:** Ainda não foi emitida Nota de Empenho para dar andamento à obra.
- **2º Bimestre de 2017:** Ainda não foi emitida Nota de Empenho para dar andamento à obra e foi solicitada a prorrogação de prazo.

### PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:

Conclusão das coberturas, infraestruturas e acabamentos.

**REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 01**



Programa de Trabalho:  
 26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)  
 Etapa 26 SAG 2015/Etapa 24 SAG 2016  
 N° do Processo: 113.007.877/2012  
 N° do Contrato: 018/2014  
 Empresa: Trier Engenharia Ltda.  
 Data de Início: 13/05/2014  
 Data prevista de conclusão: Reativado a partir de 25/04/2016 (14º Aditivo)  
 Valor: R\$ 32.679.197,28 + R\$ 655.000,00 (4º Aditivo)+ R\$ 6.568.563,91 (14º Aditivo) = R\$ 39.902.761,19  
 Recurso: Fontes 135, 100 (2º Aditivo), 231 (3º Aditivo), 900, 100 e 335 (14º Aditivo)  
 Executores: Eng.º Bruno Sousa Almeida, Eng.º Geraldo Jacinto da Silva Filho e Eng.º Elcy Ozório dos Santos (Instrução nº 115, 20/05/2016, DODF nº 99, 25/05/2016)  
 População da RA V: 63.050



**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 0,0 ao km 2,5, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**

Executado 1% no Bimestre, Acumulado 6,94%. Obra retornou a execução. Escavação e preparação da OAE 7 e 8. Compra dos semáforos para instalação dos desvios. Aguardando projeto de Drenagem. Autorização de escavação de material de 2ª categoria.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**

Executado 1,34% no Bimestre, Acumulado 8,28%. Escavação das Obras de Arte 7, 8 e 9, 10. Desvio em operação, elaboração/fiscalização nos Projetos Executivos. Serviços de Terraplenagem.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

**REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 01**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

➤ 2º Bimestre de 2017:

- Aguardando definição de material de 2ª e 3ª Categoria pela Comissão.
- Aguardando da SUTEC a definição com relação ao tipo de contenção que será usado no retorno 2.
- Projeto de drenagem novo elaborado pela SUTEC, aguardando definição de quantitativos.

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

Iniciar obras de drenagem, seguindo o novo Projeto Executivo e Obra de Arte 8 e 9.

**REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 02**





Programa de Trabalho:  
 26.453.6216.3126.0004 (Primeiro Aditivo)  
 Etapa 13 SAG 2017/Etapa 25 SAG 2016  
 Nº do Processo: 113.004.262/2014  
 Nº do Contrato: 021/2014  
 Empresa: Consórcio JM/Cidade  
 Data de Início: 14/05/2014  
 Data prevista de conclusão: Reativado a partir de 25/04/2016 (13º Aditivo)  
 Valor: R\$ 018(15º Aditivo) - R\$ 2.373.212,63 (16º Aditivo) = R\$ 51.011.532,22  
 Recurso: Fontes 135, 100 (2º Aditivo), 231 (4º Aditivo), 900, 131 e 335 (13º Aditivo), 231 (1ª Apostila)  
 Executores: Eng.º Jarbas Alessandro Martins da Silva, Eng.º Geraldo Jacinto da Silva Filho e Eng.º Elcy Ozório dos Santos (Instrução nº 116, 20/05/2016, DODF nº 99, 25/05/2016)  
 Executor Substituto: Eng.º Bruno Sousa Almeida (IS nº 164, 15/07/2016)  
 População da RA V: 63.050

**DESCRIÇÃO DO OBJETO:** Execução de obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da rodovia DF-003 (EPIA), no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto), do km 2,5 ao km 5,2, denominado Ligação Torto-Colorado, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital de Concorrência nº 04/2013.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Executado 0,3% no bimestre. Acumulado 22,9%. Reinstalação do canteiro de obras; Início da execução dos blocos de ancoragem da adutora da CAESB. Continuidade das fundações da OAE – 02 (Ribeirão do Torto).

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Executado 0,3% no bimestre. Acumulado 23,2%. Serviços de Terraplenagem nos ramos “C”, “D” e Eixo Principal. Execução da OAE-02. Blocos de ancoram da adutora da CAESB.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

**REABILITAÇÃO, MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA DF-003 (EPIA), TRECHO ENTRE A DF-001 E A DF-150 AO ENTRONCAMENTO COM A DF-007 (LIGAÇÃO TORTO-COLORADO) – LOTE 02**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**


➤ 2º Bimestre de 2017: Em andamento.

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

Remanejamento da rede elétrica.

Concluir Projeto Executivo de Drenagem e Obras de Artes Especiais.

**IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE, REMODELAÇÃO DA PONTE DO BRAGHETTO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DF-002 (ERN) E DF-007 (EPTT)**


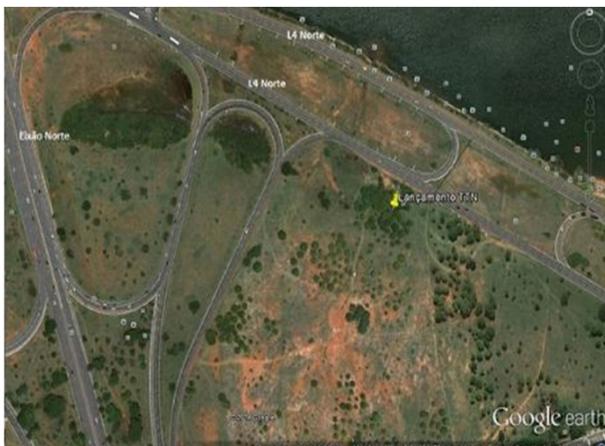


Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.3056.0004 (10º Aditivo)  
 26.782.6216.1475.1199 (1º Aditivo)  
 Etapa 35 SAG 2017/Etapa 45 SAG 2016  
 Nº do Processo: 113.007.878/2012  
 Nº do Contrato: 025/2014  
 Empresa: Consórcio Via Engenharia/Conterc –  
 Construção, Terraplenagem e Consultoria Ltda.  
 Data da Assinatura do Contrato: 26/05/2014  
 Data prevista de conclusão: Reativado a partir de  
 09/05/2016 (10º Aditivo)  
 Valor inicial: R\$ 79.632.741,77+R\$ 14.837.279,45  
 (10º Aditivo)+ R\$ 2.101.997,67 (11º Aditivo) =  
 R\$ 96.572.018,08  
 Recurso: Fontes 135, 231 (1º Aditivo), 900, 100 e  
 335 (10º Aditivo)  
 Executores: Eng.º Geraldo Jacinto da Silva Filho ,  
 Eng.º Paulo Robert Santos Machado e Eng.ª Patrícia  
 Marc Cristiane de Menezes Milhomem (Instrução nº  
 117, 20/05/2016, DODF nº 99, 25/05/2016)  
 (Instrução nº 181, 16/08/2016, DODF nº 155,  
 17/08/2016)  
 População das RA's XVIII e I: 250.607

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Execução de obras para Implantação do Trevo de Triagem Norte (TTN), remodelação da Ponte do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego em 2,1 km da rodovia DF-007 (EPTT), no trecho compreendido entre a DF-002 e o entroncamento com a DF-003/BR-450 (Balão do Torto), e em 0,4 km da rodovia DF-002 (ERN), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-007 (ponte do Braghetto) até o acesso às vias W1/W3, execução de estrutura cicloviária, bem como a elaboração dos projetos executivos decorrentes das obras de artes especiais a serem implantadas e remodeladas. Cc nº 002/2013.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Executado 2,5% no Bimestre. Acumulado 11%. Execução da OAE 9W e OAE 9L, 50% executado OAE 10.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2017:**  
 Executado 3,21% no Bimestre. Acumulado 14,21%. Foi executada a OAE 9L 90% da OAE, iniciando OAE 9 W 90% e OAE 10 80%.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

**IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE, REMODELAÇÃO DA PONTE DO BRAGHETTO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DF-002 (ERN) E DF-007 (EPTT)**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

➤ 1º Bimestre de 2017:

- Execução da limpeza na área da saída norte, referentes as vias 1 L e 2 W, sondagem das OAE 01 e OAE 02;
- Continua o cronograma atualizado em 01/03/2012,
- Foram iniciados os serviços no trecho norte.

➤ 2º Bimestre de 2017:

- Execução de escavação mecânica, terraplenagem nas vias PL 1W e PL 2L;
- Início da Execução OAE 02;
- Execução OAE 12 em 60%.

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**

Conclusão da execução da OAE 12 e OAE 2;  
Execução da OAE 08 e OAE 04;  
Início dos serviços de drenagem.

**SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE, REMODELAÇÃO DA PONTE DO BRAGHETTO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DF-002 (ERN) E DF-007 (EPTT)**





Programa de Trabalho:  
 26.782.6216.3056.0004  
 Etapa 36 SAG 2017/Etapa 55 SAG 2016  
 Nº do Processo: 113.005.297/2013  
 Nº do Contrato: 010/2016  
 Empresa: STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A  
 Data da Assinatura do Contrato: 14/04/2016  
 Data do Recebimento da IS: 02/05/2016  
 Data prevista de conclusão: 20/11/2018  
 Valor inicial: R\$ 7.993.852,19  
 Recurso: Fonte 100  
 Executor: Eng.º Antônio Gomes da Silva Filho e Eng.º Kênio Márcio Avelar (suplente)  
 IS 05/05/2016)

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:** Supervisão das obras de implantação do Trevo de Triagem Norte (TTN), remodelação da ponte do Braghetto, reabilitação de pavimentos e adequação da capacidade de tráfego nas rodovias DF-002 (ERN) e DF-007 (EPTT). Cc nº 008/2013.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 1º BIM. 2017:**  
 Andamento normal.

**AVANÇO FÍSICO (%) E DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO REALIZADO NO 2º BIM. 2016:**  
 Continua o acompanhamento dos serviços topográficos, laboratório, projetos de remanejamento de rede e questões relativas ao meio ambiente. Andamento normal.



■ A Ser Iniciada   
 ■ Não Iniciada   
 ■ Cancelada   
 ■ Andamento Normal   
 ■ Atrasada   
 ■ Paralisada   
 ■ Concluída

**SUPERVISÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE, REMODELAÇÃO DA PONTE DO BRAGHETTO, REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DF-002 (ERN) E DF-007 (EPTT)**

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

**PLANO DE AÇÃO PARA O PRÓXIMO BIMESTRE:**
